
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 33

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN					
DIRECCIÓN TÉCNICA					
ACTA NÚMERO:					
FECHA:	01-02-2019	HORA DE INICIO:	2:00PM	HORA DE FINALIZACIÓN:	6:00 PM
LUGAR:	Secretaría de Planeación				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI X		NO	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Informes de seguimiento proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías SGR					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Cielo López Gutiérrez	Secretaría Jurídica y de Contratación	Secretaría Jurídica y de Contratación
2	José Joaquín Rincón Pastrana	Director Oficina Privada	Oficina Privada
3	José Ignacio Rojas Sepúlveda	Secretario de Planeación	Secretaría de Planeación
4	Jovanny Villegas Castaño	Director de Industria y Comercio	Secretaría de Turismo
5	Ana María Cardona Valdez	Directora Análisis Financiero y Administrativo	Secretaría Privada
6	Juliana Acosta	Directora Desarrollo Rural	Secretaría de Agricultura
7	Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica Secretaria de Planeación	Secretaría de Planeación
8	Edna L. Insuasty	Jefe de Control Interno	Secretaría de Educación
9	Marco A. Forero	Director Vial Social	Secretaría de Aguas e Infraestructura
10	Sandra Bibiana Díaz	Jefe de Oficina de Estudios Previos.	Secretaría Jurídica y de Contratación
11	Ángela María Alzate Manjarrés	Contratista	Secretaría de Educación

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación del Quórum y poder votante	Secretario de Planeación
2	Objeto de la reunión	Secretario de Planeación
3	Informe implementación aplicación artículo 19 de la Ley 1942 de 2018- Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías SGR	Directora Técnica Secretaria de Planeación

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 33

4	Estado ejecución presupuestal proyectos SGR	Directora Técnica Secretaría de Planeación Departamental
5	INFORMES EJECUCIÓN PROYECTOS 5.1 Secretaría de Educación 5.2 Secretaria de Aguas e Infraestructura 5.3 Secretaria de Turismo Industria y Comercio 5.4 Secretaria de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Ángela María Alzate Manjarrés Marco Antonio Forero Jovanny Villegas Castaño Juliana Acosta
6	Proposiciones y varios	

DESARROLLO TEMATICO

1. Verificación del Quorum y poder votante: Una vez verificado el quórum y poder votante por parte del Secretario de Planeación Departamental se constata la presencia de más de la mitad de los integrantes


2. Objeto de la reunión a cargo del doctor José Ignacio Rojas Sepúlveda:

Dar cumplimiento a los preceptuado en la Resolución No. 1450 de 2018 "POR MEDIO DE LA CUAL SE SUBROGA LA RESOLUCIÓN 2276 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2014 A TRAVÉS DE LA CUAL SE CONFORMÓ EL COMITÉ TÉCNICO DE REGALÍAS PARA EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES ", en cuanto a los procesos de seguimiento interno a la ejecución de los proyectos ajustados y financiados con recursos del Sistema General de Regalías del Departamento Quindío.

3. Informe implementación aplicación artículo 19 de la ley 1942 de 2018- sistema de presupuesto y giro de regalías SGR:

La Directora Técnica de la Secretaria de Planeación Departamental Economista Martha Elena Giraldo Ramírez, explica a los integrantes del Comité las nuevas disposiciones en materia de cargue de información en el Sistema Presupuestal de Giros de Recursos SPGR, con el propósito de que cada Unidad Ejecutora reporte a la Secretaría de Planeación la Programación de Giros de los proyectos de su competencia, para el posterior reporte de la información al Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD correspondiente según la competencia.

Lo anterior, con el propósito de realizar con posterioridad los trámites relativos al pago de los contratistas responsables de la ejecución de los proyectos del Sistema General de Regalías SGR.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
	Página 3 de 33	

Para el desarrollo de la actividad se presentaron las diapositivas que ilustran la intervención realizada:



4. Estado ejecución presupuestal proyectos SGR:

La Directora Técnica de la Secretaría de Planeación Departamental, informa sobre la ejecución presupuestal de los diferentes proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías SGR, de conformidad con el reporte entregado por la Secretaria de hacienda con corte al 31 de enero de 2019.

IMPUTACION	INVERSIÓN	DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	TPN CERTIFICAR (Por Compromiso)
06-5-31241516-70	Modernización y Equipamiento de Aedes (Inclusión) del Plan de Desarrollo del Estado Funcional de la ESD Hospital Departamental Simón Bolívar del Quindío	12.179.485.422,00	10.060.107.096,96	10.060.107.096,96	0,00	0,00	2.718.578.823,05
06-5-313723128-70	Implementación del Programa Integral de Atención y Compensación al Personal del Estado Funcional de la ESD Hospital Departamental Simón Bolívar del Quindío	10.411.329.372,00	1.680.162.727,00	1.680.162.727,00	33.136.528,00	33.136.528,00	13.729.486.645,20
06-6-1121-70	Mejoramiento y Mantenimiento del Estado Funcional de la ESD Hospital Departamental Simón Bolívar del Quindío	980.660.433,37	14.542.962,70	14.542.962,70	0,00	0,00	846.117.548,70
06-6-1123-70	Implementación del plan de acción para mantenimiento preventivo y atención de emergencias en la red	116.369.760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	116.369.760,75

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buitica



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 33



EJECUCIÓN PROYECTOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

IMPUTACIÓN	INVERSIÓN	ORIGENAL	CERTIFICADOS	COMPROBADOS	ORIGINALES	PAGOS	POR CERTIFICADO (Por Comprobados)
06-6-1125-70	Construcción e instalación del Centro de Atención al Proyectado en el Departamento del Quindío.	229.047.751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	229.047.751,79
06-6-1126-70	Fortalecimiento de la Cartera educativa en las instituciones educativas, mediante la implementación de	582.714.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.714.911,00
06-6-1127-70	Programa de Innovación Social para el Fomento de una Cultura Ciudadana y Empleo	1.437.422.970,00	578.328.349,00	636.526.149,00	0,00	0,00	894.854.498,00
06-6-1128-70	Apoyos de Incentivos Económicos en la Cartera de Suministro para el Industria de la Siembra en el Desarrollo Sostenible del Sector Cultivos a través de la Zona Ganadera Occidental Quindío SGR.	2.272.192.283,00	371.400.454,00	331.400.454,00	0,00	0,00	702.800.908,00
06-6-1129-70	Plan de Capacitación de líderes para el desarrollo de la Competitividad en Empresas	767.871.557,00	294.227.806,00	294.227.806,00	0,00	0,00	573.643.750,00
06-6-1130-70	Fortalecimiento de los Organismos Colegiados de Administración y Control Financiero	4.859.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859.547,00
06-6-1131-70	Fortalecimiento de los Decretos Técnicos de los Organismos Colegiados de Administración y Control Financiero	822.432.302,00	82.721.291,00	82.721.291,00	0,00	0,00	739.711.010,00
	Total Unidad	14.948.637.345,42	18.884.071.117,40	16.461.879.745,73	245.246.226,40	245.246.226,40	14.948.637.345,42


Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buitica


5. INFORMES EJECUCIÓN PROYECTOS

Se presentaron los diferentes informes por las Unidades Ejecutoras responsables de los proyectos del Sistema General de Regalías SGR, con el fin de determinar las acciones de mejora, que permitan el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en los proyectos del SGR:

5.1 Secretaría de Educación

La Doctora Ángela María Álzate Manjarrés Contratista de la Secretaria de Educación expone a los integrantes e invitados al Comité Técnico de Regalías sobre la ejecución del proyecto: Implementación Programa Integral de Bilingüismo "Quindío Bilingüe y competitivo" departamento del Quindío. A continuación presentan las diapositivas en power point de la presentación realizada:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
	Página 5 de 33	




PROGRAMAS DE REGALÍAS SED

A.- Bilingüismo

B.- Fortalecimiento de la Calidad Educativa

C.- Innovación Social

**Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá**




**Comité Interno de la Secretaría de Educación
Departamental, para la ejecución de proyectos delegados
por el sector central del Departamento del Quindío.-**

Creación: Resolución No 2310 de fecha 24 de octubre de 2017.

Objetivos Generales:

- 1.- Sede de concertación, evaluación, ajuste y ejecución de acciones, actuaciones y medidas administrativas (técnicas, operativas y legales), tendientes a la consecución de los proyectos delegados por el sector central.
- 2.- Ejercer acciones de autocontrol y mitigación de posible riesgo en la ejecución de proyectos.
- 3.- Articulación de los resultados de los proyectos con los procesos misionales y pedagógicos de las Instituciones Educativas Públicas y el plan de desarrollo.

**Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá**



COMPOSICIÓN DEL COMITÉ


Miembros:

- 1.- Secretario de Educación Departamental (Único con decisión)
- 2.- Director de Planeamiento Educativo
- 3.- Director de Calidad Educativa
- 4.- Asesor Jurídico
- 5.- Profesional de Control Interno
- 6.- Profesional de Proyectos del Área de Planeamiento Educativo
- 7.- Profesional designado para para el seguimiento del componente académico, educativo y misional del Área de Calidad Educativa

Invitados:

Contratista designados para el desarrollo de las funciones de dirección, ejecución, consecución y seguimiento de los productos, metas, tareas y actividades del programa y/o proyecto – (Gerencia, Interventoría, Etc.)

**Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá**



**A.- BILINGÜISMO
EN EJECUCIÓN**

"Implementación del programa integral de bilingüismo "Quindío Bilingüe y competitivo" en el Departamento del Quindío"

Formulación: Departamento del Quindío

Aprobación: Órgano Colegiado de Administración y Decisión Regional Eje Cafetero y Antioquia del Sistema General De Regalías, Fondo De Compensación Regional a través del Acuerdo No 038 del 28 de junio de 2017.


Objetivo:


Mejorar el nivel de inglés de los niños, niñas y jóvenes que asisten a las instituciones educativas oficiales del Departamento del Quindío.

Sector	Número Beneficiarios
EDUCACION - (Educación - Preescolar y Básica y Media)	36756

**Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá**

1. TECNICO – ADMINISTRATIVO

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
	Página 6 de 33	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BILINGÜISMO

Fecha de aprobación: junio de 2017

Inicio de ejecución: noviembre de 2017

Plazo inicial: 30 meses


Plazo reportado: 14 meses

Estado de avance físico: 17.39%

Estado de avance financiero: 18.03%


1. TECNICO - ADMINISTRATIVO

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica



A. BILINGÜISMO

PRODUCTOS



1. TECNICO - ADMINISTRATIVO

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica



A. BILINGÜISMO

PRODUCTOS

Dotación

de herramientas visuales, audiovisuales y tecnológicas, material didáctico, pedagógico y de juego



para **541 aulas** de **54 instituciones** educativas y sus sedes.

1. TECNICO - ADMINISTRATIVO

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica



A. BILINGÜISMO

Presupuesto SGR: \$15.411.339.372


Vigencia 2017: \$ 15.411.339.372

BALANCE DE RECURSOS DEL SGR




2. FINANCIERO - PRESUPUESTAL

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 33

3. JURIDICO - CONTRACTUAL



A.- BILINGÜISMO
Contratos en ejecución

Contrato No.	Tipo de Contrato	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto
002	Interadministrativa	80600043-UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	\$1.854.292.561
0112 DE 2018	Prestación de Servicios	2094890801 EDUAR LEONARDO BARRERA	\$41.822.380
006 DE 2018	Prestación de Servicios	9738754 RAMIREZ TABARES JUAN DAVID	\$48.246.000
No. 003 DE 2018	Prestación de Servicios	41328660 YEPES GOMEZ SANDRA KELLY	\$71.404.000
No. 002 DE 2018	Prestación de Servicios	41561324 SUSAN NADALIA SANCHEZ VELEZ	\$71.404.000
CESION			
No. 003 DE 2018	Prestación de Servicios	5094890803 ALEJANDRO RUISTREPO ANDRES FELIPE	\$71.404.000
No. 004 DE 2018	Prestación de Servicios	9738553 SIERRA CORDERAS ANDRES FELIPE	\$71.404.000
No. 005 DE 2018	Prestación de Servicios	24606338 RAMIREZ LONDOÑO BEATRIZ ELENA	\$71.404.000
No. 006 DE 2018	Prestación de Servicios	7557520 UCAMPO RAMIREZ JOSE ALDEMAR	\$338.136.951
No. 007 DE 2018	Prestación de Servicios	41946701 ALZATE ORTIZ PAOLA	\$71.404.000
No. 008 DE 2018	Prestación de Servicios	32229620 RIVERA BERNARDEZ WILSON JAMES	\$71.404.000
No. 005 DE 2017	Componente	80022177-A Y A RADIOCOMUNICACIONES S.A.S	\$82.936.520
No. 397 DE 2018	Prestación de Servicios	41956290 SANCHEZ HERNANDEZ CATHERINE	\$71.404.000




QUINDIO SÍ PARA TI

Componentes	ESTADO
Contratación Personal de apoyo (Dirección)	Contratista de apoyo por recursos propios
Red - land, zonas escolares Wifi-Compra de servidores y routers	Falta instalación
Contratación formación docente UQ	En ejecución - Se hizo primer pago en dic. 28 de 2018 (por \$ 500'000.000). Segundo pago en marzo.
Compra de 541 TV	Ejecutado Recurso Póliza
Impresión de textos, BS y M.	Elaboración de estudios previos
Licitación plataforma, material didáctico, textos BP	Estudios previos elaborados - solicitud de cotizaciones para estudio de mercado
Nativos e Inmersión	Análisis de propuesta convenio interadministrativo - Se requieren más recursos para financiar Nativos

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

1. TECNICO - ADMINISTRATIVO



B.- FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA:
PROCESO DE CIERRE


"Fortalecimiento de la calidad educativa en las instituciones educativas mediante la incorporación de TICS en el Departamento del Quindío, Occidente"

Formulación: Departamento del Quindío

Aprobación: Órgano Colegiado de Administración y Decisión Regional Eje Cafetero y Antioquia del Sistema General De Regalías. Fondo De Desarrollo Regional a través del Acuerdo No 004 del 12 de septiembre de 2013.

Objetivo:
Mejorar la calidad educativa de los estudiantes de las sedes educativas del Departamento del Quindío, mediante el uso de herramientas tecnológicas dentro y fuera del aula.

Sector	Número Beneficiarios
EDUCACION - (Educación - Preescolar y Básica y Media)	12479



QUINDIO SÍ PARA TI

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA:

Fecha de aprobación: Septiembre de 2013

Inicio de ejecución: abril de 2015

Plazo inicial: 12 meses

Plazo reportado: 25 meses - mayo de 2017

Estado de avance físico: 100%


Estado de avance financiero: 99,97%

Borrador del acto administrativo listo para tramitar firmas y CIERRE del proyecto

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

1. TECNICO - ADMINISTRATIVO



B.- FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA:

Productos al 100%

Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto
Capacitación en ejercicio virtual y presencial para los actores educativos en el uso de prácticas didácticas basadas en el uso de Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en procesos pedagógicos de sedes educativas	Número	218
Dotación de herramientas tecnológicas - tabletas y contenidos digitales - para mejorar la calidad educativa en las instituciones educativas del Departamento.	Número	17950

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

2. FINANCIERO - PRESUPUESTAL

2. FINANCIERO - PRESUPUESTAL



B.- FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA:

Presupuesto SGR: \$9 005 500 000
Vigencia 2013- 2014: \$ 6 000 000 000
Vigencia 2015- 2016: \$ 3 000 000 000
Aporte especie Departamento - SED: 5 500 000
Aporte especie NO SUIFF:

Parque Soft Quindío: 180 000 000
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA: 150 000 000
122 640 000

Distribución de los recursos vinculados al proyecto

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

2. FINANCIERO - PRESUPUESTAL



B.- FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA:

BALANCE FINANCIERO PROYECTO

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

3. JURIDICO - CONTRACTUAL



B.- FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA:

Contrato No	Identificación del Contratista	Valor especie	Valor SGR	Valor Contrato Para Proyecto
13	Compraventa 900148177-PEAR SOLUTIONS S.A.S.		\$7,697,835,889	7,697,835,889
102	Contratos o convenios con entidades sin ánimo de lucro 801005122-FUNDACION PARQUE TECNOLOGICO DE SOFTWARE DEL QUINDIO	\$150 000 000	\$599 450 000	749 450 000
131	Contratos o convenios con entidades sin ánimo de lucro 890002590-ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y MERCADOTECNIA DEL QUINDIO	\$180 000 000	\$200 000 000	380 000 000
135	Contratos o convenios con entidades sin ánimo de lucro 860015685-UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA SEDE ARMENIA	\$122 640 000	\$500 000 000	622 640 000

Todos los contratos están liquidados. (013 por sentencia judicial No 69 de 15 marzo de 2018)

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

1. TECNICO - ADMINISTRATIVO



C.- INNOVACIÓN SOCIAL:

EN EJECUCION

"Implementación de un programa de innovación social para el fomento de una cultura ciudadana y emprendedora en la comunidad educativa y productiva Del Departamento Del Quindío - Occidente"

Formulación: Departamento - Universidad del Quindío - CUN - CRQ


Aprobación: Órgano Colegiado de Administración Y Decisión (OCAD) Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación (CTeI) del Sistema General de Regalías de Colombia, a través del Acuerdo No 008 del 22 de agosto de 2013.

Objetivo:
Fomentar una cultura ciudadana y emprendedora en la comunidad educativa del Departamento del Quindío a través de la apropiación social del conocimiento en CTEI, la identidad del paisaje cultural cafetero y la articulación entre el aparato productivo.

Sector	Número Beneficiarios
CIENCIA Y TECNOLOGÍA - (Ciencia y Tecnología - Innovación)	555836

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

1. TECNICO - ADMINISTRATIVO



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN SOCIAL :

Fecha de aprobación: agosto de 2013

Fecha primer contrato: noviembre de 2013 - Convenio 199 de 2013

Inicio de ejecución: junio de 2014 - Convenio 199 de 2013

Fecha vigente último contrato: mayo de 2018

Plazo inicial: 12 meses


Plazo reportado: 45 meses - marzo de 2018

Estado de avance físico: 95,26%

Estado de avance financiero: 89,55%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

2. FINANCIERO - PRESUPUESTAL

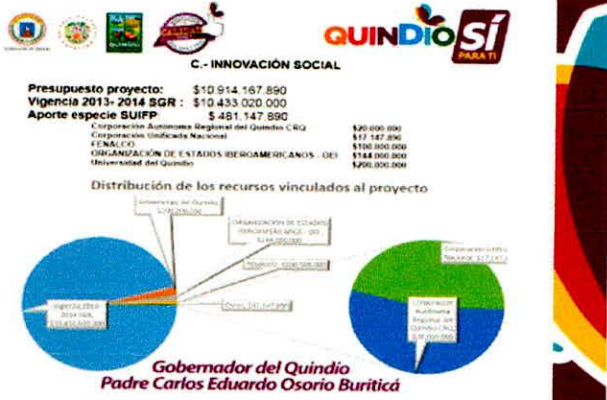

2. FINANCIERO - PRESUPUESTAL



3. JURIDICO - CONTRACTUAL

C.- INNOVACIÓN SOCIAL:

El proyecto tiene 19 contratos suscritos.
 Su estado actual es: **Contratos Liquidados**

Contrato No.	TIPO DE CONTRATO	ALIADOS	VALOR
907/2014	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	OLGA PATRICIA MORITZ ALZATE	\$144.000.000
928/2014	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JUAN CARLOS RENGIFO FLOREZ	\$86.400.000
941/2014	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JAHIR ANIBAL PEREZ GARCIA	\$57.600.000
047/2014	CONTRATO DE COMPRAVENTA	JOSE LUIS BALLESTEROS	\$180.000.000
103/2015	CONVENIO INSTITUCIONAL	FENALCO	\$406.500.000
902/2017	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JUAN CARLOS RENGIFO FLOREZ	\$27.500.000
1114/2015	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JUAN CARLOS RENGIFO FLOREZ	\$10.000.000
018/2013	CONTRATO DE COMPRAVENTA	PEAR SOLUTIONS	\$3.224.822.947

**Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá**

3. JURIDICO - CONTRACTUAL

C.- INNOVACIÓN SOCIAL

Contratos por Liquidar

Contrato No.	TIPO DE CONTRATO	ALIADOS	VALOR
M031-EDU032-2016	CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA	VICKY BURTRAGO VIALES Y TURISMO	\$9.355.452
M044-EDU006-COMPRAVENTA-2016	CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA	VALMO TOTAL SERVICES S.A.S.	\$20.450.000
933/2014	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	IHON VICTOR VIDAL DURANGO	\$37.800.000
199/2013	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO - CUN - CRO	\$2.891.947.890

Contrato No.	TIPO DE CONTRATO	ALIADOS	VALOR
EDUCION-CONVENIO COOPERACION-2017	Otro Tipo de Contrato	OEI	\$266.000.000
916/2014	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NICOLAS GONZALEZ BOFERO	\$96.300.000
904/2014	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LUIS CARLOS SERNA GIRALDO	\$96.000.000
EDUCION-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO-2017	Otro Tipo de Contrato	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	\$56.827.842

**Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá**

3. JURIDICO - CONTRACTUAL

C.- INNOVACIÓN SOCIAL

Contratos en Acciones Administrativas

Contrato No.	TIPO DE CONTRATO	ALIADOS	VALOR
007/2014	CONTRATO DE CONSULTORIA	COOPERATIVA "CIBER EN LO NUESTRO"	\$349.976.640
009/2014	CONTRATO DE CONSULTORIA	ASESORIAS Y CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS S.A.S.	\$219.991.680

Contratos en Ejecución

Contrato No.	TIPO DE CONTRATO	ALIADOS	VALOR
018/2013	CONTRATO DE COMPRAVENTA	FUNDECOL	\$1.945.000.000
900/2014	CONTRATO DE CONSULTORIA	ASESORIAS Y CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS S.A.S.	\$219.991.680

**Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá**

Proyectos en formulación

Infraestructura educativa en el marco de la jornada única metas Plan de desarrollo

\$ 12.000 millones


CONSULTORIA EN ETAPA PRE CONTRACTUAL

- Sede Luis Arango(Baulas y WC)
- Sede La Papa(2 aulas, restaurante)
- Sede Boquia(3 aulas, restaurante y área administrativa)

PREPROYECTO CON MIN EDUCACIÓN

- Sede Francisco Londoño(Baulas- restaurante-área deportiva)
- Sede Los Fundadores(4 aulas y WC)
- 8 cubiertas en áreas deportivas(hojas anchas, John Kennedy, tecnológico, laurel, fco Londoño, la papa, ...)

**Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 33



Proyectos en formulación
\$ 5.000 millones

Acceso y permanencia en la educación superior


- Articulación EM/ ET/ES
- Becas bachilleres ES
- Semilleros de investigación

Gobernador del Quindío

5.2 Secretaria de Aguas e Infraestructura

El Director vial de la Secretaria de Aguas e Infraestructura Ingeniero Marco Antonio Forero, Director Vial de la Secretaria de Aguas e Infraestructura, presenta informes sobre los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías de competencia de la Secretaria a través de la presentaciones en power point que se detalla a continuación:


a) Mejoramiento de vías Terciarias mediante el uso de Placa Huella en el departamento del Quindío.

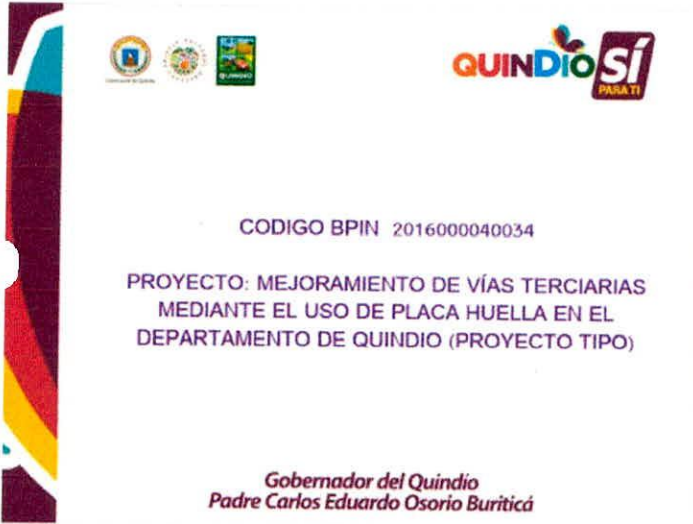

CODIGO BPIN 2016000040034

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO (PROYECTO TIPO)

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

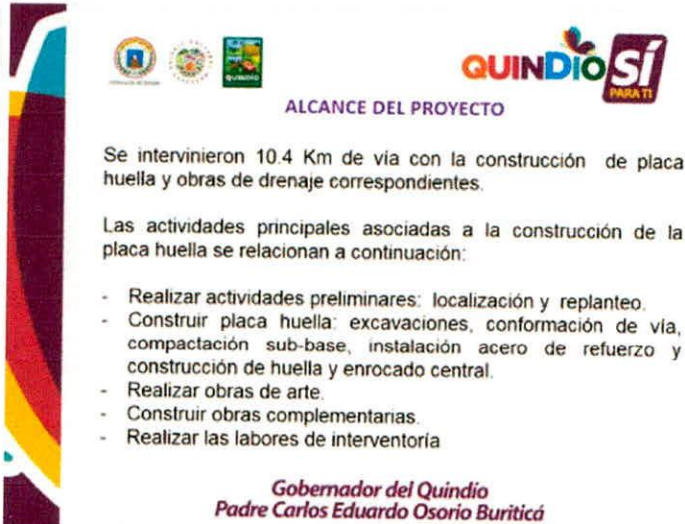


ALCANCE DEL PROYECTO

Se intervinieron 10.4 Km de vía con la construcción de placa huella y obras de drenaje correspondientes.

Las actividades principales asociadas a la construcción de la placa huella se relacionan a continuación:

- Realizar actividades preliminares: localización y replanteo.
- Construir placa huella: excavaciones, conformación de vía, compactación sub-base, instalación acero de refuerzo y construcción de huella y enrocado central.
- Realizar obras de arte.
- Construir obras complementarias.
- Realizar las labores de interventoría

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 33



LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO: Quindío

MUNICIPIOS: Salento, La Tebaida, Filandia, Quimbaya, Pijao, Génova, Córdoba, Montenegro, Circasia, Buenavista y Calarcá

Población beneficiada de forma directa: 15.456 Habitantes.

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

VALOR APROBADO: \$ 11.463.057.890,00

FONDO: Fondo de Desarrollo Regional

SECTOR: Transporte

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



INFORMACION GENERAL CONTRATOS DE OBRA

CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA 014 DE 2018
OBJETO:	MODULO 1 CALARCÁ, FILANDIA, SALENTO "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO (PROYECTO TIPO), POR SISTEMA DE MÓDULOS"
CONTRATISTA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
VALOR INICIAL	\$ 214.309.778.00
VALOR FINAL	\$ 214.309.778.00
PLAZO FINAL	Ciento noventa y cinco (195) días calendario
FECHA DE INICIO	21 de Mayo de 2018
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	01 de Diciembre de 2018
CDP	2647 del 29 de agosto de 2017
RP	2264 del 03 de mayo de 2018

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 33



INFORMACION GENERAL CONTRATOS DE OBRA

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA 025 DE 2018
OBJETO:	"MODULO 10 CALARCA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO (PROYECTO TIPO)"
CONTRATISTA	ALVARO HERNANDO NARANJO OLAYA
VALOR INICIAL	\$ 863'610.315.00
VALOR FINAL	\$ 863'610.315.00
PLAZO FINAL	Ciento noventa y un (191) días calendario
FECHA DE INICIO	23 de Mayo 23 de 2018
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	29 de Noviembre de 2018
CDP	2729 del 06 de septiembre de 2017
RP	2011 del 18 de abril de 2018

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica*



REGISTRO FOTOGRAFICO



Calarcá

Calarcá



Inicio de obra

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica*



INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA 027 DE 2018
OBJETO:	"MODULO 4 FILANDIA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO (PROYECTO TIPO)"
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS
REPRESENTANTE LEGAL	JENNIFER LLANO MORALES
VALOR INICIAL	\$ 855'127.852.00
VALOR FINAL	\$ 855'127.852.00
PLAZO FINAL	Ciento setenta y tres (173) días calendario
FECHA DE INICIO	23 de Mayo de 2018
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	11 de Noviembre de 2018
CDP	2729 del 06 de septiembre de 2017
RP	2010 del 16 de abril de 2018

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica*



REGISTRO FOTOGRAFICO



Filandia Tramo 5

Filandia Tramo 5



Inicio de obra

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica*



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 33



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Filandia Tramo 5



Filandia Tramo 5



Final de obra

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica



INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA 028 DE 2018
OBJETO:	"MODULO 2 SALENTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO (PROYECTO TIPO)"
CONTRATISTA	CONSORCIO TERCARIAS 01
REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL OSWALDO ZAPATA CÁRDENAS
VALOR INICIAL	\$ 1.034.264.406,00
VALOR FINAL	\$ 1.034.264.406,00
PLAZO FINAL	Ciento ochenta y tres (183) días calendario
FECHA DE INICIO	23 de Mayo de 2018
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	21 de Noviembre de 2018
CDP	2728 del 06 de septiembre de 2017
RP	2088 del 23 de abril de 2018

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Salento



Salento



Inicio de obra

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica



INFORMACION GENERAL CONTRATOS DE OBRA

CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA 013 DE 2018
OBJETO:	MODULO 2 CIRCASIA, LA TEBADA, MONTENEGRO Y QUIMBAYA "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO (PROYECTO TIPO), POR SISTEMA DE MÓDULOS"
CONTRATISTA	WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ
VALOR INICIAL	\$ 291.789.270,00
VALOR FINAL	\$ 379.643.382,00
PLAZO FINAL	
FECHA DE INICIO	21 de Mayo de 2018
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	04 de Febrero de 2019
CDP	2647 del 29 de agosto de 2017
RP	2265 del 03 de mayo de 2018

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 33



INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA 020 DE 2018
OBJETO:	"MODULO 1 CIRCASIA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO (PROYECTO TIPO)"
CONTRATISTA	CONSORCIO INTI LOAIZA
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ASDRUBAL LOAIZA GALLEGO
VALOR INICIAL	\$ 948'992.496.00
VALOR FINAL	
PLAZO FINAL	Doscientos cuarenta y cuatro (244) días calendario
FECHA DE INICIO	23 de Mayo de 2018
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	14 de Febrero de 2019
CDP	2729 del 06 de septiembre de 2017
RP	2038 del 19 de abril de 2018

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Inicio de obra
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Estado actual de obra
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA 019 DE 2018
OBJETO:	"MODULO 3 LA TEBAIDA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO (PROYECTO TIPO)"
CONTRATISTA	CONSORCIO AARCON
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ESTEBAN AGUDELO ARBELAEZ
VALOR INICIAL	\$ 891'703.183.00
VALOR FINAL	\$ 902'685.173.00
PLAZO FINAL	Ciento sesenta y dos (162) días calendario
FECHA DE INICIO	23 de Mayo de 2018
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	11 de Febrero de 2019
SUSPENSIÓN	Mayo 31 de 2018
CDP	2729 del 06 de septiembre de 2017
RP	2051 del 20 de abril de 2018

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 33



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Montenegro Montenegro

Inicio de obra
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO	CONTRATO DE OBRA 024 DE 2018
OBJETO:	MODULO 9 MONTENEGRO 'MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO (PROYECTO TIPO)'
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS DEL QUINDIO 2017
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA LILIANA MOLANO ROMERO
VALOR INICIAL	\$ 994.772.097.00
VALOR FINAL	\$ 994.772.097.00
PLAZO INICIAL	Ciento setenta (170) días calendario
FECHA DE INICIO	23 de Mayo de 2018
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	8 de Noviembre de 2018
GDP	2729 del 06 de septiembre de 2017
RP	2089 del 23 de abril de 2018

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 16 de 33



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Montenegro



Montenegro



Final de obra

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



QUINDIO SI
PARA TI

INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA 018 DE 2018
OBJETO:	MODULO 5 QUIMBAYA 'MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO (PROYECTO TIPO)'
CONTRATISTA	CONSORCIO R&B
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL
VALOR INICIAL	\$ 966 001 764.00
VALOR FINAL	\$ 1 008 001 764.00
PLAZO FINAL	Doscientos cuarenta y cinco (245) días calendario
FECHA DE INICIO	23 de Mayo de 2018
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	15 de Marzo de 2019
CDP	2729 del 06 de septiembre de 2017
RP	2035 del 19 de abril de 2018

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Quimbaya



Quimbaya



Inicio de obra

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Quimbaya



Quimbaya



Final de obra

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 17 de 33



QUINDIO SÍ PARA TI

INFORMACION GENERAL CONTRATOS DE OBRA

CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA 015 DE 2018
OBJETO:	MODULO 3 BUENAVISTA, CORDOBA, GENOVA Y PIJAO "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO (PROYECTO TIPO) POR SISTEMA DE MODULOS"
CONTRATISTA	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
VALOR INICIAL	\$ 309'904.560.00
VALOR FINAL	\$ 309'904.560.00
PLAZO INICIAL	Cto o () dias calendario
FECHA DE INICIO	21 de Mayo de 2018
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	28 de Febrero de 2019
CDP	2647 del 29 de agosto de 2017
RP	2263 del 03 de mayo de 2018

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica*



QUINDIO SÍ PARA TI

INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA 022 DE 2018
OBJETO:	MODULO 6 BUENAVISTA "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO (PROYECTO TIPO)"
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS J Y S
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO
VALOR INICIAL	\$ 981'189.689.00
VALOR FINAL	\$ 981'189.689.00
PLAZO FINAL	Ciento cuarenta (140) dias calendario
FECHA DE INICIO	12 de Junio de 2018
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	4 de Diciembre de 2018
CDP	2729 del 06 de septiembre de 2017
RP	2009 del 16 de abril de 2018

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica*



QUINDIO SÍ PARA TI

REGISTRO FOTOGRAFICO



Buenavista



Buenavista



Inicio de obra

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica*



QUINDIO SÍ PARA TI

REGISTRO FOTOGRAFICO



Buenavista



Buenavista



Final de obra

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica*



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 18 de 33



QUINDIO SÍ PARA TI

INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA 023 DE 2018
OBJETO:	MODULO 8 CORDOBA 'MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO (PROYECTO TIPO)'
CONTRATISTA	CONSORCIO PH QUINDIO 2018
REPRESENTANTE LEGAL	YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS
VALOR INICIAL	\$ 1.043.140.255 00
VALOR FINAL	\$ 1.043.140.255 00
PLAZO INICIAL	Ciento treinta y cinco (135) días calendario
FECHA DE INICIO	12 de Junio de 2018
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	29 de Noviembre de 2018
CDP	2729 del 06 de septiembre de 2017
RP	2053 del 20 de abril de 2018

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



QUINDIO SÍ PARA TI

REGISTRO FOTOGRAFICO



Córdoba

Córdoba



Inicio de obra

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



QUINDIO SÍ PARA TI

REGISTRO FOTOGRAFICO



Córdoba

Córdoba



Final de obra

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



QUINDIO SÍ PARA TI

INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA 021 DE 2018
OBJETO:	MODULO 7 GENOVA 'MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO (PROYECTO TIPO)'
CONTRATISTA	ELVER ZAPATA MAYA
VALOR INICIAL	\$ 939.475.633 00
VALOR FINAL	\$ 939.475.633 00
PLAZO FINAL	Ciento treinta y cinco (135) días calendario
FECHA DE INICIO	12 de Junio de 2018
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	29 de Noviembre de 2018
CDP	2729 del 06 de septiembre de 2017
RP	2008 del 16 de abril de 2018

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 19 de 33



REGISTRO FOTOGRÁFICO

QUINDIO SÍ
PARATI



Génova



Génova



Inicio de obra

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



REGISTRO FOTOGRÁFICO

QUINDIO SÍ
PARATI



Génova



Génova



Final de obra

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA

QUINDIO SÍ
PARATI

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA 026 DE 2018
OBJETO:	MODULO 11 PIJAO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO (PROYECTO TIPO)"
CONTRATISTA	JAIRO ACOSTA RAMIREZ
VALOR INICIAL	\$ 982.942.693,00
VALOR FINAL	\$ 1.067.320.491,00
PLAZO FINAL	Ciento (1) días calendario
FECHA DE INICIO	12 de Junio de 2018
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	28 de Febrero de 2019
CDP	2729 del 06 de septiembre de 2017
RP	2008 del 13 de abril de 2018

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



REGISTRO FOTOGRÁFICO

QUINDIO SÍ
PARATI



Pijao



Pijao



Inicio de obra

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 20 de 33



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Piñao

Piñao



Final de obra

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica



INFORMACION FINANCIERA

VALOR APROBADO	\$ 11.463.057.890,00
VALOR DISPONIBLE POR CONCEPTO DE ANTICIPO	\$ 0,00
VALOR DISPONIBLE EN CAJA	\$ 0,00
RECURSOS UTILIZADOS A LA FECHA	\$ 9.637'362.300,40
RECURSOS FALTANTES POR UTILIZAR	\$ 1.825'695.589,60

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica



OBSERVACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

De los cuadros anteriores podemos concluir:

Los módulos de placa huella de los municipios de

- **Buenavista, Calarcá, Córdoba, Filandia, Génova, Montenegro y Salento.**
Se encuentran al 100% de su ejecución, faltando solo el trámite y pago de las actas finales de obra.

- **La Tebaida**

El módulo de placa huella del municipio de La Tebaida, está a la espera de una adición de recursos por Diez millones novecientos ochenta y un mil novecientos noventa pesos (\$10.981.990) m.cte. de acuerdo al informe entregado por la interventoría, con el fin de ejecutar el 100% de las actividades, debido a un incremento en el costo de las mismas. Estos recursos están disponibles, dado que existen recursos aprobados no comprometidos en el proyecto, por valor de ciento cuarenta y siete millones ochocientos treinta y cuatro mil ciento diecinueve pesos (\$147.834.119) m. cte.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica




OBSERVACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- **Quimbaya**

El segundo contrato que requiere de adición es el módulo de placa huellas correspondiente al Municipio de Quimbaya, en donde se presentó una diferencia con la escrituración de un predio, correspondiente al tramo 2, con una longitud de 207,87 metros lineales, ya que la comunidad y la interventoría insistían en que era un predio privado, pero se logró demostrar que el predio era baldío o del Estado, en concepto emitido por la alcaldía del municipio. Sin embargo el contratista de obra, envió un oficio, solicitando adición de recursos para la terminación de este tramo, (se anexa copia del mismo), donde, entre otros argumentos, expresa el incremento en el costo administrativo por mayor permanencia en obra, así como una mayor cantidad de obra de algunas actividades por diferencias entre los presupuestos y los diseños, y la ejecución de obras no contempladas por lo que se pretende adicionar el contrato en Cuarenta y dos millones de pesos (\$42.000.000) m. cte. Estos recursos, al igual que para el contrato anterior, se adicionarán del saldo del valor aprobado no comprometido del proyecto, para lo cual, ya se están adelantando las gestiones necesarias.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 21 de 33



OBSERVACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- Pijao:

El contrato de placa huellas del municipio de Pijao, requiere de una adición del orden de \$84.377.798 pesos m. cte., de acuerdo al oficio presentado por la Interventoría, según se describe a continuación: el día Trece (13) de noviembre de 2018, fue radicado en la ventanilla única de la gobernación del Quindío con el N° R-27890, el oficio PHQ- C-053-2018 por parte del director de interventoría Ing. Fabián Grijalba Jaramillo; en el cual solicita adición al contrato de obra N°026 DE 2018.

En consecuencia, las disposiciones de orden técnico descritas en el documento citado, hacen necesario el acopio de recursos adicionales a fin de llevar a buen término el proyecto de placa huellas necesario en el Municipio de Pijao, que dicho recurso asciende costo directo e indirecto a la suma de Ochenta y Cuatro Millones Trescientos Setenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Ocho Pesos M/CTE \$84.377.798.00.

El total de los recursos necesarios para las tres adiciones anteriores son: Ciento treinta y siete millones trescientos cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y ocho pesos (\$137.359.788) m. cte., con lo que con los recursos disponibles del CDR, alcanza para cubrir dichas adiciones y culminar al 100% estos tres contratos de obra.

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



OBSERVACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- Circasia:

En cuanto al contrato de obra de Circasia, en la actualidad el contratista no ha culminado las actividades y se encuentra en un porcentaje de ejecución del 65%. Además, la interventoría ha indicado que se requieren del orden de Cuarenta y tres millones setenta y nueve mil trescientos setenta y cinco pesos (\$43.079.375) m. cte., para culminar las actividades concernientes a dicho módulo, debido a que se requirió sobre-acarreo de material, ítem que fue necesario y no estuvo contemplado en el presupuesto inicial.

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



OBSERVACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- Interventorías:

El contrato de consultoría (Interventoría) No 014-2018, ya culminó todas las actividades y está pendiente solo del pago del acta final, que a su vez depende del trámite y pago del acta final de los contratos de obra bajo su supervisión.

El contratos de consultoría (Interventoría) No 015-2018, está pendiente solo de la adición del contrato de obra No 026 de 2018, al cual, como se explica anteriormente está pendiente de una adición y treinta días más de ejecución, para culminación de actividades. Los demás contratos de obra, como se indica anteriormente, ya están al 100% de su ejecución y pendiente del trámite y pago del acta final.

Por el contrario el contrato de consultoría (Interventoría) No 013-2018, ha solicitado una adición en recursos, por un valor de ochenta y siete millones ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento doce pesos (\$87.854.112) m. cte.

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



OBSERVACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

INCONVENIENTES:

- Bancas inestables, se requiere obras estabilizadoras y obras de disipación energía.
- Sobre acarreo en todos los tramos.
- Adecuación de vías para acceso de materiales.
- Reubicación de transversales.
- Localización con respecto de referencia fijo y un abcisado erróneo porque no es continuo. Cada tramo parte desde un cero.
- No se tuvo en cuenta la dificultad para acceder a algunos de los tramos a intervenir.
- Sectores en muy mal estado que fueron priorizados, condición que puede afectar la estabilidad de las obras.

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 22 de 33



QUINDIO SI PARA TI

OBSERVACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

INCONVENIENTES:

- Cierre de la cantera priorizada en el proyecto y la misma no suministra materiales como arena, triturado y subbase. Esto genero sobrecostos por escasez del material.
- No se previó la adecuación de vías de salida alternas a los proyectos lo cual ha generado algunas incomodidades en la comunidad beneficiada.

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



QUINDIO SI PARA TI

OBSERVACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

RETRASOS:

- El cierre de la cantera priorizada en el proyecto y las grandes distancias de otras canteras a los proyectos ha generado retrasos en la ejecución de las obras.
- Fue necesario adecuar partes de las vías debido al mal estado, para poder acceder a los sitios contratados.

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



QUINDIO SI PARA TI

OBSERVACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

ASPECTOS POSITIVOS:

- La relación obtenida entre la comunidad rural beneficiada con la ejecución de los trabajos, lo cual ha generado una mejor confianza entre estos y la entidad ejecutora.
- Se ha recepcionado muy bien por parte de la comunidad los diseños elaborados

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



QUINDIO SI PARA TI

OBSERVACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS:

- Es importante socializar y gestionar de manera oportuna los desembolsos, para no incidir negativamente en la ejecución de las obras, por falta del recurso económico, teniendo presente el nuevo sistema para el giro de los dineros.
- El hecho de haber realizado la contratación, beneficio bastante el proyecto, no solo por tener once frentes de obra, mínimo a la vez en cada uno de los municipios, sino además por una mayor generación de empleo y menos traumatismos para la ejecución de actividades al no depender de un solo contratista, todo el proyecto, así como la interventoría

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



QUINDIO SI PARA TI

OBSERVACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FORTALEZAS:

- Proyecto muy bien estructurado en cuanto a parámetros de diseño.
- La participación popular en el proyecto, logrando una integración entre los profesionales ejecutantes del proyecto y la comunidad beneficiada.
- Se ha conseguido que la comunidad se involucre en los proyectos, logrando con ello que se deje de ser una participación pasiva a una participación activa en todos los sentidos.

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*




QUINDIO SI PARA TI

CONCEPTO DE LOS INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES

- Muchas curvas se interpolan generando, de acuerdo con los parámetros de diseño, longitudes grandes de pavimento en concreto.
- Se han encontrado obras de arte colapsadas en sitios donde no se proyectó placa huella.
- Sobrecostos en los materiales debidos a las distancias, factor que no fue tenido en cuenta en la elaboración del proyecto.

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
	Página 23 de 33	



Cuadro de Programación de Giros

Descripción	feb.-18	mar.-18	abr.-18
Obras - Módulo 1 - Caucaza	\$ 105,675,555.00	\$ 555,974,426.00	
Obras - Módulo 2 - Salento	\$ 75,280,254.00		
Obras - Módulo 3 - La Tablada	\$ 232,305,689.00	\$ 55,589,324.00	
Obras - Módulo 4 - Filandia	\$ 149,224,985.00		
Obras - Módulo 5 - Quimbaya	\$ 62,840,609.00	\$ 230,706,916.00	
Obras - Módulo 6 - Supacá	\$ 67,419,794.00		
Obras - Módulo 7 - Génova	\$ 60,726,506.00		
Obras - Módulo 8 - Córdoba	\$ 51,947,972.00		
Obras - Módulo 9 - Montenegro	\$ 98,047,302.00		
Obras - Módulo 10 - Calanda	\$ 66,547,554.00		
Obras - Módulo 11 - Pijao	\$ 69,544,485.00	\$ 26,277,798.00	
Implementación - Módulo 1 - Caucaza - Filandia - Salento	\$ 26,470,654.00		
Implementación - Módulo 2 - Córdoba - La Tablada - Montenegro - Quimbaya	\$ 96,424,682.00		\$ 16,292,000.00
Implementación - Módulo 3 - Buenavista - Córdoba - Génova - Pijao	\$ 30,990,654.00		
Total	\$ 1,126,754,105.00	\$ 486,494,742.00	\$ 16,292,000.00

Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

5.3 Secretaria de Turismo Industria y Comercio:

El Director de Industria y Comercio Doctor Jovanny Villegas Castaño realiza la exposición de estado de ejecución del proyecto Desarrollo de las Capacidades I+D+i para incrementar la competitividad en el Departamento del Quindío, con la presentación en power point que se detalla a continuación:



Informe de Ejecución Proyecto Sistema General de Regalías – SGR

«Desarrollo de Capacidades de I+D+i para incrementar la competitividad en empresas y emprendimiento del Departamento del Quindío, Occidente»

BPIN2013000100258

**Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica**




Objetivo General:


- Desarrollar capacidades de I+D+i, tanto en empresas existentes, como para la generación de emprendimientos con potencial de alto impacto.

Objetivos Específicos:

- Desarrollar capacidades de I+D+i en las empresas del Departamento del Quindío.
- Incorporar tecnologías blandas que sirvan de apoyo para procesos de I+D+i.
- Generar escenarios que faciliten el desarrollo y la aceleración de negocios innovadores.


**Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 24 de 33



Estado Financiero

VALOR TOTAL DEL PROYECTO CON CONTRAPARTIDAS		\$ 2.317.126.812
CONTRAPARTIDAS	CAMARA DE COMERCIO	\$ 58.580.000
	PARQUESOFT	\$ 10.000.000
	TECNALIA	\$ 15.000.000
	U VON HUMBOLDT	\$ 23.698.080
	U GRAN COLOMBIA	\$ 15.000.000
TOTAL CONTRAPARTIDAS		\$ 122.278.080
GOBERNACIÓN		\$ 741.634.518
CAMARA DE COMERCIO		\$ 992.401.214
PARQUESOFT		\$ 460.813.000
TOTAL VALOR DEL PROYECTO SIN CONTRAPARTIDAS		\$ 2.194.848.732



Estado Financiero


TOTAL PAGOS CONTRATOS PROYECTO	\$ 1.968.450.841
TOTAL CONTRAPARTIDAS EJECUTADAS	\$ 122.278.080
TOTAL EJECUTADO	\$ 2.090.728.921

Avance financiero: 90,2%

Pendientes:

- Pago a la Cámara de Comercio: \$ 142.001.187
- Pago a Parquesoft: \$ 61.621.950
- Saldo a devolver: \$ 22.474.754

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



Estado Metas Físicas


Avance de metas físicas: 97,75% (Gesproy)

- Actividades programadas: 31
- Actividades ejecutadas: 30

Pendiente:

- Implementación y puesta en marcha de las salas de ideación.
 - Contratos de compra-venta 016 y 017 de 2018.

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*




Indicadores del Proyecto


INDICADOR	PROYECTO	CONTRAPARTIDA	INDICADOR	UNIDAD	VALOR	AVANCE	COMENTARIOS
Indicador 1	Actividad 1	Contrapartida 1	Indicador 1	Unidad 1	Valor 1	100%	Completado en ejecución de recursos
Indicador 2	Actividad 2	Contrapartida 2	Indicador 2	Unidad 2	Valor 2	100%	Completado en ejecución de recursos
Indicador 3	Actividad 3	Contrapartida 3	Indicador 3	Unidad 3	Valor 3	100%	Completado en ejecución de recursos
Indicador 4	Actividad 4	Contrapartida 4	Indicador 4	Unidad 4	Valor 4	100%	Completado en ejecución de recursos
Indicador 5	Actividad 5	Contrapartida 5	Indicador 5	Unidad 5	Valor 5	100%	Completado en ejecución de recursos
Indicador 6	Actividad 6	Contrapartida 6	Indicador 6	Unidad 6	Valor 6	100%	Completado en ejecución de recursos
Indicador 7	Actividad 7	Contrapartida 7	Indicador 7	Unidad 7	Valor 7	100%	Completado en ejecución de recursos
Indicador 8	Actividad 8	Contrapartida 8	Indicador 8	Unidad 8	Valor 8	100%	Completado en ejecución de recursos
Indicador 9	Actividad 9	Contrapartida 9	Indicador 9	Unidad 9	Valor 9	100%	Completado en ejecución de recursos
Indicador 10	Actividad 10	Contrapartida 10	Indicador 10	Unidad 10	Valor 10	100%	Completado en ejecución de recursos

5.4 Secretaria de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente:





La Directora de Desarrollo Rural y Medio Ambiente presenta el informe de ejecución de los proyectos que se relacionan a continuación, soportadas en las siguientes presentaciones en power point:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 25 de 33

a) PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR CURTIEMBRE A TRAVÉS DE LA I+D+I, QUINDÍO, OCCIDENTE:




NOV 2018
 PROYECTO "DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR CURTIEMBRE A TRAVÉS DE LA I+D+I, QUINDIO, OCCIDENTE".
 Código BPIN 2013000100263

Avance Físico 91,83 %   Avance Financiero 87,39 %  

Avance interventoria 89,25% 75,22%

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - (Ciencia y Tecnología - Innovación)

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



OBJETIVO DEL PROYECTO

DESARROLLAR CAPACIDADES TÉCNICO CIENTÍFICAS Y DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR DE CURTIEMBRES DE LA MARÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Diseñar un modelo socioempresarial sostenible para el sector curtiembres del Departamento
- Desarrollar e incorporar tecnologías para la disminución del impacto ambiental del sector curtiembres en el Departamento

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*




ENERO 2019
 PROYECTO "DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR CURTIEMBRE A TRAVÉS DE LA I+D+I, QUINDIO, OCCIDENTE".
 Código BPIN 2013000100263



Avance Físico 92,49 %   Avance Financiero 88,49 %  

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - (Ciencia y Tecnología - Innovación)

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



GIROS Y PAGOS EN GESPROY

VALOR RECURSOS SGR	\$2.591.700.823,00
VALOR CONTRAPARTIDA ENTIDADES	\$3.000.000.000,00
VALOR DEL PROYECTO	\$5.591.700.823,00
PAGOS SGR	\$2.530.480.302
SALDO	\$3.361.842  \$61.220.521 

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 26 de 33

Avances del proyecto a Enero de 2019.



- Se realizó prórroga del convenio hasta Nov 30 de 2018
- Se terminó la entrega de los equipos de laboratorio y sus capacitaciones.
- Se realizaron los comodatos de los equipos con las universidades.
- Se levantó medida de suspensión de giros.
- Se reanuda la interventoría en el mes de 19 de Octubre.
- Se realizó por parte de la universidad la estrategia de comunicación de los Sentidos de la Maria.
- Por parte de la Asociación de Curtidores se realizó la adecuación del lugar donde se instará el deshidratador de lodos.
- Se comenzó con el ensamble del deshidratador de lodos en las curtiembres.
- Se atendió la Auditoría de la Contraloría general de la nación, donde no se generaron observaciones negativas al estado actual del proyecto; si se generaron observaciones en el proceso precontractual del convenio del 2016.
- Se realizó la contratación del personal por funcionamiento para apoyar la administración del Gesproy del proyecto de Curtiembres.
- Se logró la publicación de la contratación directa del Software para la Universidad Alexander Von Humboldt.
- Se realizó el check list de procedimiento de entrega de productos.
- Las universidades han avanzado en la utilización de los equipos en pruebas de sus componentes.
- Liberación del CDP de Biosolutions
- Respuesta y atención requerimiento Procuraduría sobre visita del DNP del 2016.
- SE realizó prórroga de convenio e interventoría. Solicitud de Prórroga y adición del convenio, se encuentra radicado en jurídica desde Octubre de 2018, el convenio se vence el 30 de Noviembre. Prórroga
- Se suspendió la interventoría.
- Se eliminó Alerta Gesproy, en actualización de avances
- Se generó el informe de interventoría a Octubre de 2018.

Otros pendientes del proyecto a enero de 2019

Financiero:

- Liberación bancos biosolutions – Planeación.
- Solicitud redistribución de recursos a Colciencias.
- Redistribución y asignación del presupuesto.
- Verificar los valores que se encuentran en caja y los giros que quedan pendientes.
- Aprobación de pagos U Quindío y U gran Colombia.

Legal:

- Compra de equipos de computo.
- Aclaratorio modificatorio 005.
- Reactivar interventoría y hacer la adición.
- Hacer adicional convenio para que la U Quindío pueda terminar el deshidratador de lodos.

Técnico:

- Formalizar por parte de la interventoría el proceso de entrega de los componentes propuesto por la U Quindío y Gobernación
- Verificación de fin de año de comodatos, plaquetiada y equipos en campo.
- Preparar el cronograma de cierre.
- Verificar el cierre de Planes de mejora en el gesproy con el DNP. Enero 15 de 2018.
- Auditoría visible de Cierre se debe programar para Abril.
- Archivo al día del proyecto
- Responsabilidad fiscal con soportes la ejecución de todo el proyecto.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 27 de 33

Otros pendientes del proyecto a nov de 2018.

- Resolver el caso de Biosolutions y consultar sobre la viabilidad de liberación de recursos para uso del proyecto: pendiente respuesta a representación judicial.
- Respuesta requerimiento Procuraduría sobre visita del DNP del 2016.
- Solicitud de Prorroga y adición del convenio, se encuentra radicado en jurídica desde Octubre de 2018, el convenio se vence el 30 de Noviembre. Prorroga solicitada al mes de Abril. Compromiso de la sec Jurídica de entrega del lunes 26 de Nov: Certificado de Recursos del proyecto.
- Formalizar por parte de la interventoría el proceso de entrega de los componentes propuesto por la U Quindío y Gobernación
- Alerta Gesproy, en actualización de avances.
- Verificación de fin de año de comodatos, plaquetiada y equipos en campo.
- Verificar los valores que se encuentran en caja y los giros que quedan pendientes.
- Preparar el cronograma de
- Planes de mejora
- Enero 15 de 2018.
- Auditoria visible de Cierre se debe programar para Abril.
- Informe interventoría a Octubre de 2018.
- Archivo al día
- Responsabilidad fiscal con soportes la ejecución de todo el proyecto.
- Interventoría es inversión, así que se puede

GIROS Y PAGOS: Desembolsos pendientes a Enero de 2019

Persona /Institucion	Valor QUINTO Pago	Valor Pago Final	Tipo de desembolso
Universidad la Gran Colombia	\$12.014.066	\$8.780.000	Quinto Desembolso
Universidad Alexander Von Humboldt	\$27.493.274	\$12.940.000	\$164.852.235 Desembolso Final \$79.614.620
Universidad del Quindío	\$125.344.995	\$57.894.620	Pendiente redistribución para UQ \$57M
UNIVERSIDADES			\$244.456.855
Pago a Software Shop	0	RP	Compra directa con único oferente.
Pago Computadores	9.100.000	RP	Mínima
Interventoría Sembransa	0	0	Pendiente redistribución \$17M
TOTAL			\$244.190.335

Pendiente desembolso de Giros de la Nación por el Ministerio de Hacienda por valor de \$242.200.500 (Solicitados desde Septiembre, fue devuelta en 3 ocasiones) al momento se encuentra aprobado por DNP.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 28 de 33

GIROS Y PAGOS: Desembolsos pendientes a NOV


Persona /Institucion	Valor Pago	Valor Pago Final	Tipo de desembolso
Universidad la Gran Colombia	\$12.014.066	\$8.780.000	Quinto Desembolso
Universidad Alexander Von Humboldt	\$27.493.274	\$12.940.000	\$164.852.235
Universidad del Quindío	\$125.344.995	\$57.894.620	Desembolso Final \$79.614.620
UNIVERSIDADES			\$244.464.835
Pago a Software Shop	76.933.500	RP	Compra directa con único oferente.
Pago Computadores	9.100.000	RP	Mínima
Interventoría Sembransa	\$37.000.000	\$20.690.000	\$57.690.000 valor total de la adición al contrato
TOTAL			\$384.190.335

Pendiente desembolso de Giros de la Nación por el Ministerio de Hacienda por valor de \$242.200.500 (Solicitados desde Septiembre, fue devuelta en 3 ocasiones) al momento se encuentra aprobado por DNP.



Beneficiarios Indirectos de las Estrategias Masivas de Comunicación	1.140.378,00	0
Documentos sectoriales actualizados	1	1%
Planes estratégicos formulados	1	100%
Documentos de evaluación realizados	1	0
Sistemas y/o Redes de Monitoreo de Calidad del Aire Para Los Centros Urbanos y/o Corredores Industriales definidos Como Prioritarios Implementados y Fortalecidos	1	0
Asesorias o Talleres Realizados	3	26,66%
Asesorias o Talleres Realizados	4	0
Pruebas Acreditadas	5	0
Transferencias de Tecnologías Realizadas Para el Fortalecimiento de las Actividades Productivas	3	0

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 29 de 33



Transferencias de Tecnologías Realizadas Para el Fortalecimiento de las Actividades Productivas	4	0
Transferencias de Tecnologías Realizadas Para el Fortalecimiento de las Actividades Productivas	3	0

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

b) PROYECTO “APLICACIÓN DE PROCESOS INNOVADORES EN LA CADENA DE SUMINISTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA GUADUA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, OCCIDENTE”.



Proyecto de Ciencia y Tecnología para el Sistema Nacional de Regalías en el Departamento del Quindío

“APLICACIÓN DE PROCESOS INNOVADORES EN LA CADENA DE SUMINISTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA GUADUA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, OCCIDENTE”.


SGR CONVENIO 211 DE 2013

Fecha de inicio: diciembre 11 de 2014

Plazo de ejecución: 52 meses

Finalización: Abril 27 de 2019

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 30 de 33

Entidades aliadas



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

OBJETIVOS


- ✓ Aumentar la transferencia de tecnología para la apropiación de protocolos de suministro de materia prima desde la finca para la industria de la guadua.
- ✓ Implantar tecnologías de valor agregado pre industrial en el sistema de aprovechamiento sostenible de la guadua en finca.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Avance de ejecución del proyecto en Gesproy

Avance Físico **96,48 %** 

Avance Financiero **94,07 %** 

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Metas de productos

Objetivo Específico	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto
Implantar tecnologías de valor agregado pre industrial en el sistema de aprovechamiento sostenible de la guadua en finca	Sistema móvil de procesamiento primaria preindustrial en campo	Numero	1
Aumentar la transferencia de tecnología para la apropiación de protocolos de suministro de materia prima desde la finca para la industria de la guadua	Acuerdo formal con productores para la participación en el modelo tecnológico de manejo y aprovechamiento sostenible	Numero	3

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Indicadores

Nombre de indicador	Cantidad de proyectos	% Cumplimiento
Artículos de Ciencia Científica Publicados	6	67%
Cadenas de Valor Implementadas	3	En proceso
Estudios Realizados	6	100%
Investigaciones Apoyadas para Movilización	3	100%
Medios de Difusión en Ciencia, Tecnología e Innovación Financiados	6	100%
Proyectos de Investigación Nuevos Generados	6	En proceso


Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá




Indicadores

Nombre de indicador	Cantidad de proyectos	% Cumplimiento
Sistemas de información implementados	1	En proceso
Emprendimientos productivos apoyados	1	En proceso
Soluciones de conversión de modelos de utilidad atendidas	2	

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 31 de 33



Presupuesto general del proyecto (en pesos M.C)

Rubro	Fuente			Ejecutado
	SGR	Contrapartida Externas Partícipes	Total	
Talento humano	\$ 779.640.000		\$ 779.640.000	\$ 769.854.602
Equipos e software	\$ 27.806.300	\$ 25.920.000	\$ 53.726.300	\$ 51.219.000
Capacitación y participación en eventos	\$ 2.400.000	\$ 3.360.000	\$ 5.760.000	\$ 5.100.000
Servicios tecnológicos y correo	\$ 124.026.934	\$ 800.000.000	\$ 4.024.026.934	\$ 1.024.026.934
Materiales, insumos y documentación	\$ 41.820.000	\$ 4.190.000.00	\$ 45.810.000	\$ 23.640.000
Protección de patrimonio y divulgación	\$ 10.500.000		\$ 10.500.000	\$ 4.000.000
Administrativos	\$ 119.383.066		\$ 119.383.066	\$ 119.383.066
Suscripción (papel impreso)	\$ 124.000.000		\$ 124.000.000	\$ 100.000.000
Otros	\$ 20.000.000		\$ 20.000.000	\$ 20.000.000
Total	\$ 1.850.000.000	\$ 344.000.000	\$ 2.194.000.000	\$ 2.119.351.602




INFORME PRESUPUESTAL CONVENIO 211 DE 2013

Entidad	Valor Asignado	Aportes	Total presupuesto Con Aportes	Valor Desembolsado	Valor Ejecutado Por Entidad	Saldo Por Ejecutar	% Ejecución
ECOLOGÍA	\$ 336.228.000	\$ 15.340.000	\$ 351.568.000	\$ 336.228.000	\$ 371.750.000	\$	100,00%
EDUCACIÓN	\$ 809.100.000	\$ 7.050.000	\$ 816.150.000	\$ 728.150.000	\$ 795.240.000	\$ 80.910.000	93,00%
GOBERNACION LOCAL	\$ 132.352.000		\$ 132.352.000	\$ 174.036.912	\$ 174.036.912	\$	131,55%
GOBERNACION LOCAL	\$ 201.500.000		\$ 201.500.000	\$ 100.500.000	\$ 100.500.000	\$	50,00%
SAZ	\$ 411.200.000	\$ 231.500.000	\$ 642.700.000	\$ 411.200.000	\$ 382.750.000	\$	93,00%
Total	\$ 1.850.000.000	\$ 344.000.000	\$ 2.194.000.000	\$ 1.750.214.912	\$ 1.694.374.912	\$ 99.765.087	96,38%

**Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá**

6. Proposiciones y varios:

- a) El Secretario de Planeación se compromete ilustrar a través de la Secretaria de Aguas e Infraestructura sobre los requisitos establecidos en el Acuerdo No. 045 de 2017, para la adición de proyectos financiado con recursos del Sistema General de Regalías.
- b) El Secretario de Planeación solicita a los asistentes la importancia de agilizar los procesos de ejecución de los proyectos de conformidad con los proyectos aprobados en el OCAD correspondiente según su competencia, con el propósito de finiquitar los procesos realizando la liquidación y cierre de los mismos.
- c) La Doctora Angela María Alzate Manjarres, Contratista del proyecto Implementación Programa Integral de Bilingüismo “Quindío Bilingüe y competitivo “departamento del Quindío, solicita efectuar reunión conjunta Secretaria Jurídica y de Contratación, Secretaria de Planeación y Secretaria de Educación, con el propósito de revisar la correspondencia entre el estudio previo elaborado y el proyecto aprobado por el OCAD REGIONAL EJE CAFETERO.


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
	Página 32 de 33	


CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

1. La Secretaria de Aguas e Infraestructura a través del Director Vial Doctor Marco Antonio Forero se compromete a proyectar la documentación que soporta los trámites ante el OCAD REGIONAL EJE CAFETERO, relacionado con la adición del proyecto Mejoramiento de vías Terciarias mediante el uso de Placa Huella en el departamento del Quindío.
2. La Doctora Angela María Alzate Manjarres, Contratista del proyecto Implementación programa Integral de Bilingüismo "Quindío Bilingüe y competitivo "Departamento del Quindío, se compromete agilizar el reporte de la información correspondiente a la programación de giros con el fin de ser revisada y posteriormente entregada a la Secretaria Técnica OCAD Eje Cafetero para el cargue en la plataforma del Sistema Presupuestal de Giro de Recursos SPGR.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
	Anexo CD con presentaciones realizadas
	Listado de asistencia

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Reporte de requisitos adición de recursos a la Secretaria de Aguas e Infraestructura según el Acuerdo No. 045 de 2017	Enero 12 de 2019	Martha Elena Giraldo Ramírez Directora Técnica	
Programación reunión conjunta Secretarías Jurídica y Contratación, Planeación y Educación	Enero 11 de 2012	Ángela María Alzate Manjarres Contratista Proyecto Bilingüismo	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 33 de 33

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN		
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
JOSE IGNACIO SEPULVEDA	ROJAS Secretario de Planeación Departamental	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duval Lizarazo Cubillos	José Duval Lizarazo Cubillos	José Duval Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG

