

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 29

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN- OFICINA PRIVADA					
DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN					
ACTA NÚMERO:					
FECHA:	Noviembre 18 de 2022	HORA DE INICIO:	9:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:30 am
LUGAR:	Despacho secretario de Planeación – piso 8				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI X			NO	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Socializar el seguimiento al III trimestre de 2022 del Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” y revisar las metas críticas y/o de bajo cumplimiento.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Luis Felipe Zuluaga	Director Vial y Social	Secretaría de Aguas e Infraestructura
2	José Álvaro Arce P.	Jurídica	Secretaría de Aguas e Infraestructura
3	Milton César Torres	Director PDA	Secretaría de Aguas e Infraestructura
4	Katerine Rincón Gaviria	Jefe Social	Secretaría de Aguas e Infraestructura
5	Joan Sebastián Arboleda	Contratista	Secretaría de Aguas e Infraestructura
6	Freddy Escobar	Contratista	Secretaría de Aguas e Infraestructura
7	Yerli Andrés Molina	Contratista	Secretaría de Aguas e Infraestructura
8	Carlos Enrique Penagos	Contratista	Secretaría de Aguas e Infraestructura
9	Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica	Secretaría de Planeación
10	Adriana Gómez Orrego	Contratista	Secretaría de Planeación

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Generalidades del Seguimiento al Plan de Desarrollo	Martha Elena Giraldo Ramírez
2	Estado de ejecución POAI Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” con corte a III trimestre de 2022	Martha Elena Giraldo Ramírez
3	Seguimiento y evaluación ejecución Metas Producto Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” III-trimestre del 2022	Martha Elena Giraldo Ramírez
4	Estado de ejecución de ingresos por fuentes de financiación con corte a III trimestre de 2022	Martha Elena Giraldo Ramírez
5	Estado de ejecución Plan operativo anual de inversiones POAI secretaría de Aguas e Infraestructura con corte al 30 de septiembre de 2022	Martha Elena Giraldo Ramírez

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 29

6	Estado de ejecución Sistema General de Regalías SGR secretaría de Aguas e Infraestructura corte al 30 de septiembre de 2022	Martha Elena Giraldo Ramírez
7	Conclusiones	Martha Elena Giraldo Ramírez

DESARROLLO TEMATICO

La doctora Martha Elena Giraldo Ramírez, Directora Técnica de la secretaría de Planeación, agradece a los asistentes la presencia a la reunión y el aporte de la información brindada por las dependencias a través del enlace asignado, además informa que de manera trimestral en coordinación con las diferentes Secretarías Sectoriales se realiza el Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo 2020-2023 "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO", con el propósito de determinar el estado de avance de las metas físicas y financieras del Plan de Desarrollo, determinar las falencias y/o fortalezas en la ejecución de las dependencias, conducentes a generar acciones de mejora al interior de cada Secretaría Sectorial y Entes Descentralizados además.

También recuerda los lineamientos del Departamento de Planeación Nacional, para la valoración del cumplimiento de metas a través del aplicativo del Kit de Planeación Territorial KPT- Seguimiento al Plan de Desarrollo, el cual se realiza a través de la ejecución de los proyectos de inversión que contienen las metas producto debidamente financiados con recursos de inversión. Aclarando, que en este proceso la instancia nacional, no considera la materialización de metas a través de bienes y servicios gestionados, salvo que se haya producido un aporte de recursos del Ente Territorial que genere el movimiento presupuestal del proyecto de inversión. Concluyendo con ello que el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo se miden a través de la ejecución de los proyectos de inversión, debiendo guardar correspondencia el avance físico con el financiero (Obligaciones)

Además, informa, que la presentación será enviada a cada dependencia, con el propósito de que realice reunión interna con los equipos de trabajo, para la generación de acciones de mejora, en caso de aplicar.

A continuación, se inicia la presentación, a través de diapositivas en power point.

1. Generalidades del Seguimiento al Plan de Desarrollo:

- Trazabilidad entre todos los instrumentos de planificación, con el propósito de que todos los informes que se presenten, tengan coherencia en la información.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 29




- Estructura del Plan de Desarrollo, con el propósito de que las secretarías sean conscientes de la trazabilidad el mismo.




	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 29

- Semaforización de las metas producto y financieras.

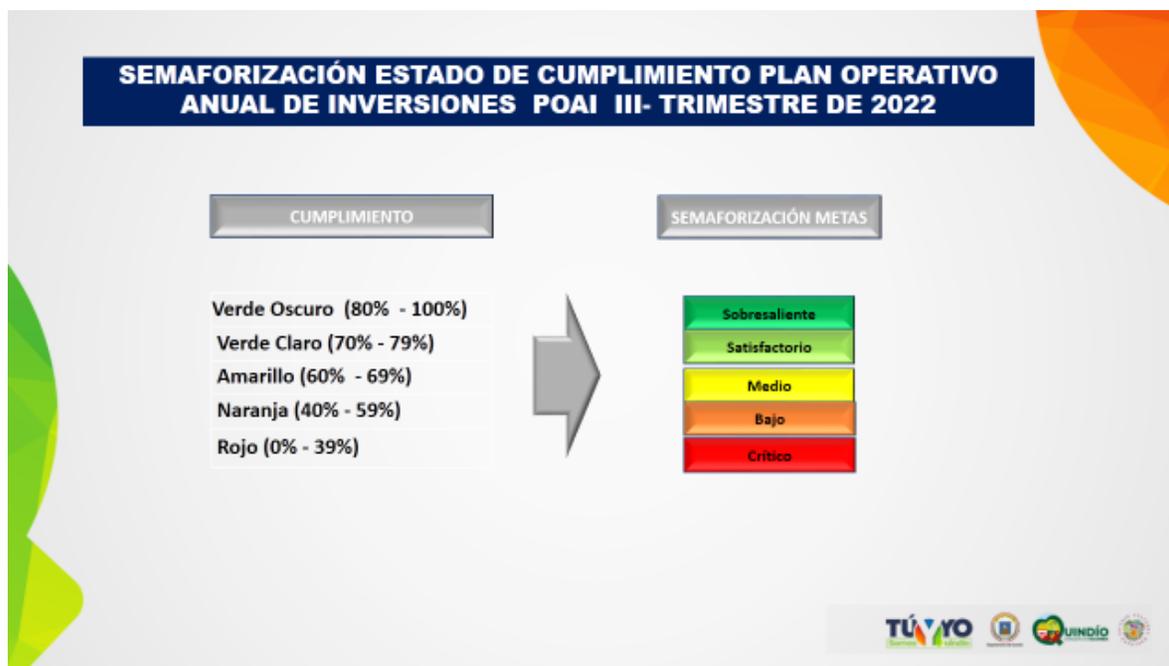

- Lineamientos del gobierno nacional en cuanto al cambio en del nombre del tipo de metas producto: **Mantenimiento** ahora denominadas Acumuladas y de **Incremento** denominadas actualmente No Acumuladas.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 29

- Parámetros de seguimiento del Plan de Desarrollo son:




	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 29




2. Estado de ejecución POAI Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” con corte a III trimestre de 2022:

- El departamento cuenta con un presupuesto definitivo de \$ 348.347.514.6765 tiene compromisos por \$ 237.707.568.371 que representa un 68.24% de ejecución al mes de septiembre de 2022, se realizó análisis al mes de octubre dando una ejecución del 73%.

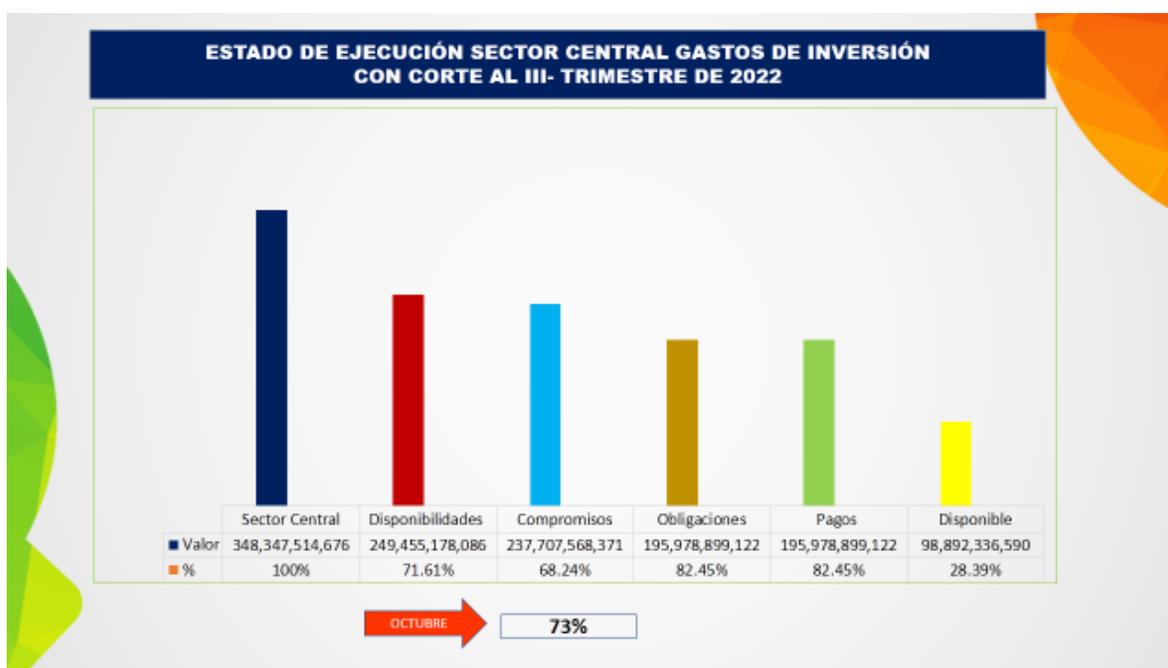

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 29

- Ejecución del sector central y los descentralizados, del 67.93% en compromisos.

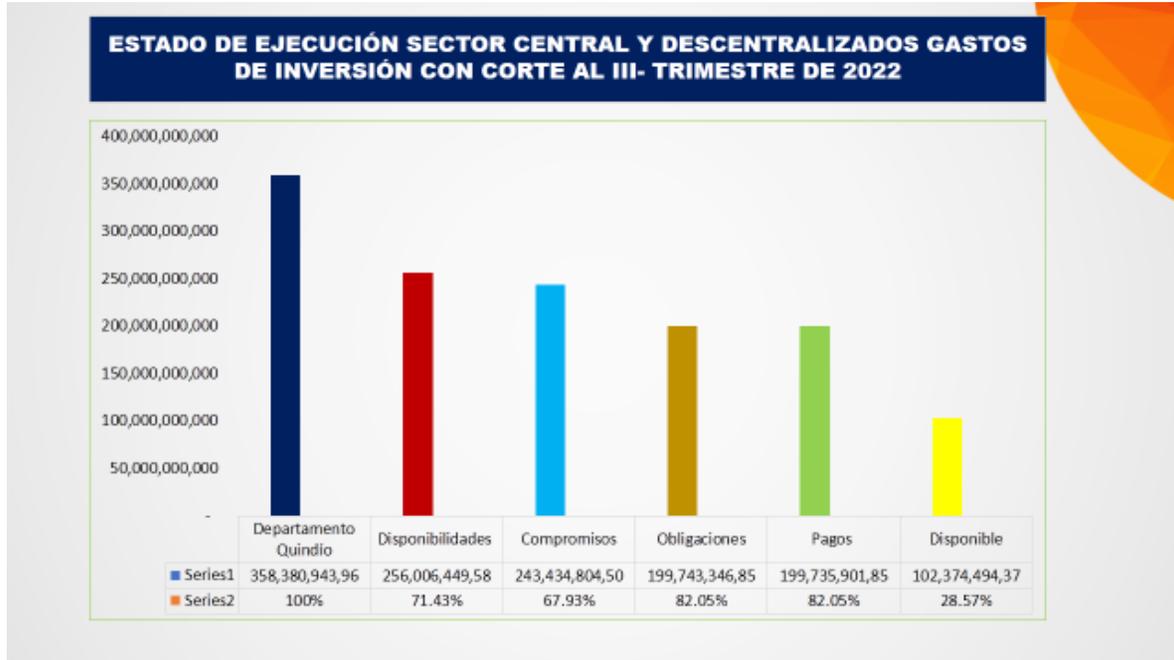

- Estado de ejecución por unidades ejecutoras con corte a septiembre y a octubre 2022

ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI CON CORTE AL III-TRIMESTRE DE 2022 POR UNIDADES EJECUTORAS SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADOS

UNIDAD EJECUTORA	APROPIACION DEFINITIVA	% PD	DISPONIBILIDADES	% CD	COMPROMISOS	% RP
304 Administrativa	374,828,802.00	100%	261,148,331.00	70%	252,026,664.00	67%
305 Planeación	1,234,282,859.00	100%	1,028,789,591.00	83%	989,023,739.00	80%
307 Hacienda	3,838,356,174.16	100%	3,474,011,843.00	91%	3,353,173,510.00	87%
308 Aguas e Infraestructura	36,766,634,437.40	100%	21,801,322,961.19	61%	17,188,762,698.56	48%
309 Interior	6,500,727,034.24	100%	3,928,971,600.75	60%	3,295,154,559.87	51%
310 Cultura	3,469,324,679.88	100%	3,246,530,814.99	94%	2,770,998,627.04	80%
311 Turismo Industria y Comercio	2,822,271,735.11	100%	2,251,625,906.00	80%	1,931,766,138.00	68%
312 Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	4,664,234,480.84	100%	2,964,795,616.00	64%	2,692,714,330.00	58%
313 Privada	2,272,052,800.00	100%	2,149,064,953.00	95%	1,635,737,537.00	72%
314 Educación	209,016,995,039.21	100%	145,977,467,547.91	70%	143,507,674,122.94	69%
316 Familia	8,435,877,609.18	100%	5,081,990,160.68	60%	4,557,572,989.25	54%
318 Salud	68,331,963,024.72	100%	55,845,128,231.64	82%	54,128,632,817.66	79%
324 Tecnología de la Información y las Comunicaciones	1,631,066,000.00	100%	1,444,330,638.75	89%	1,404,330,638.00	86%
TOTAL SECTOR CENTRAL	348,347,514,675.74	100%	249,455,178,085.91	72%	237,707,568,371.31	68%
319 Indesportes	6,744,858,478.13	100%	5,334,673,289.63	79%	4,539,711,210.13	67%
320 Proyecta	3,175,054,512.00	100%	1,138,298,212.33	36%	1,108,224,927.79	35%
321 Instituto Departamental de Tránsito	113,516,300.00	100%	78,300,000.00	69%	79,300,000.00	70%
TOTAL DESCENTRALIZADOS	10,833,429,290.13	100%	6,551,271,501.96	65%	5,727,236,137.92	57%
TOTAL DEPARTAMENTO	358,380,943,965.87	100%	256,006,449,587.87	71%	243,434,804,509.23	68%

- Socialización comportamiento de la ejecución de compromisos de cada unidad ejecutora en los tres últimos meses y al mes de septiembre, además ubicación de cada dependencia de acuerdo al % comprometido:



FORMATO



Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04


Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 29

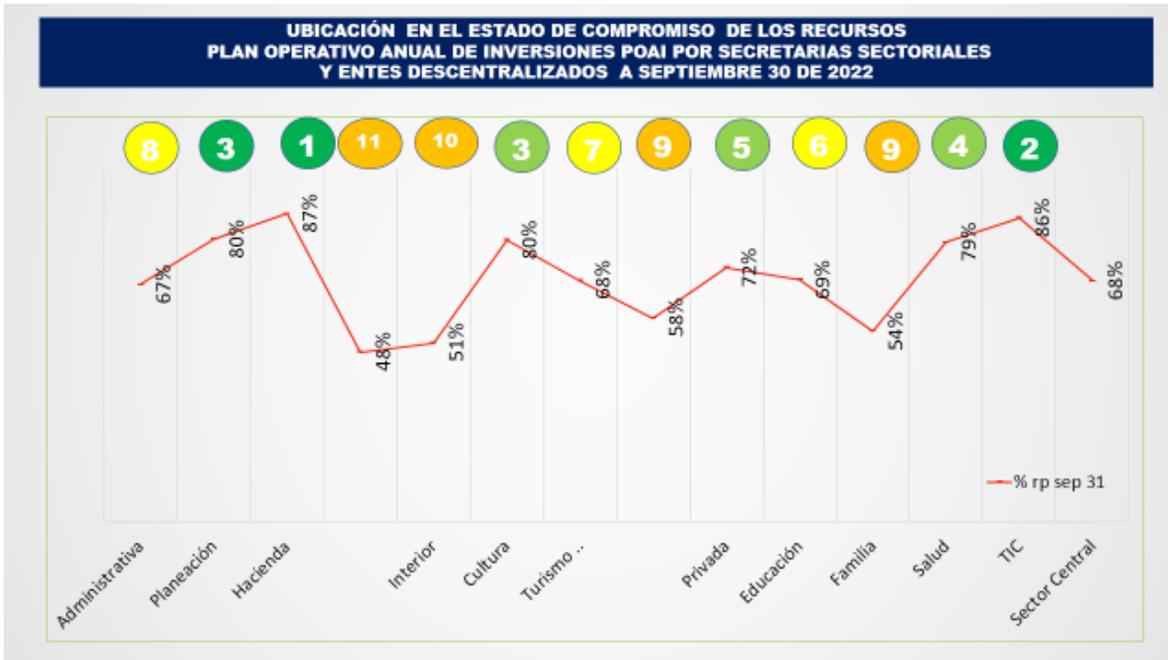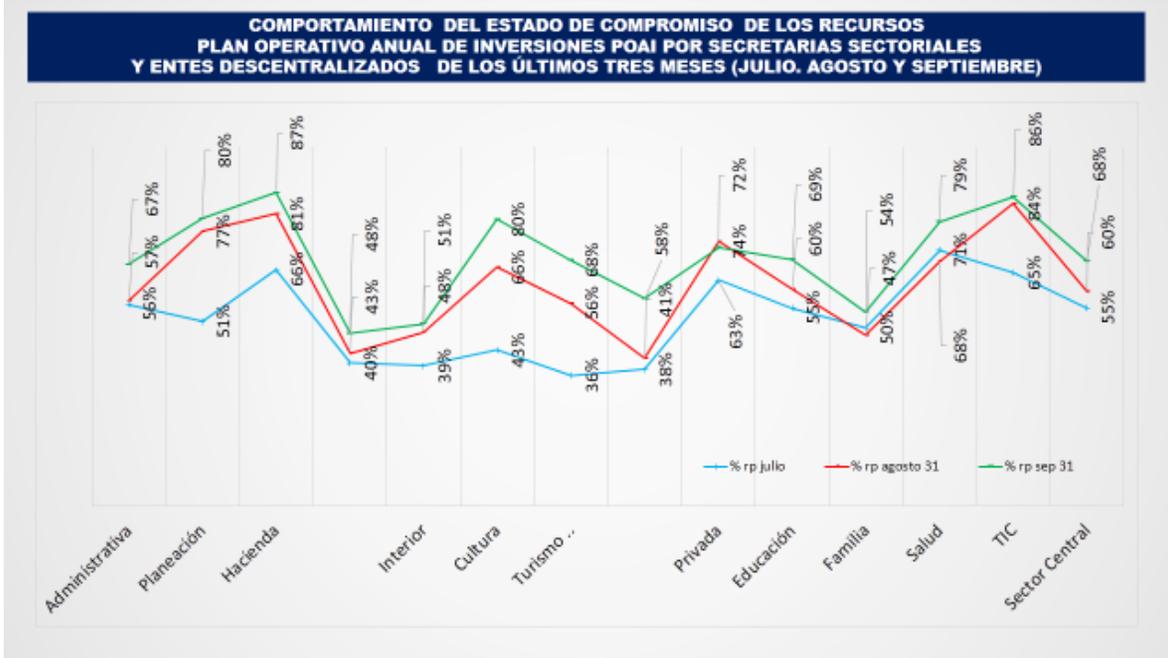


Comparativo entre certificados de disponibilidad y compromisos presupuestales, de cada unidad ejecutora, recordando la importancia de que estén equiparados estos dos valores.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 29

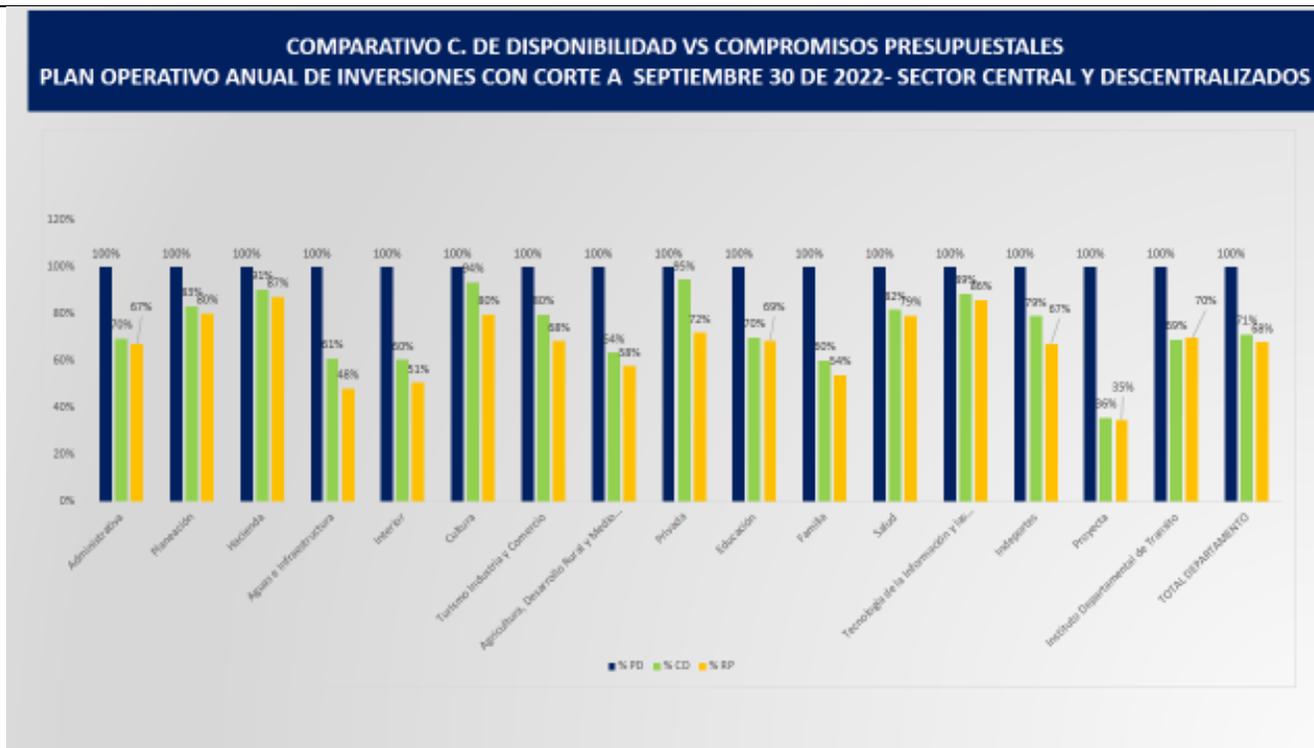

3. Seguimiento y evaluación ejecución Metas Producto Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” III- trimestre del 2022:

- Estado de ejecución de las metas físicas. Del total de metas producto 284, que tiene la Administración Departamental, 72 se encuentran en Sobresaliente (verde), 62 en Satisfactorio (verde claro), 36 en Medio (amarillo), 42 en Bajo (naranja) y 72 en crítico (rojo).

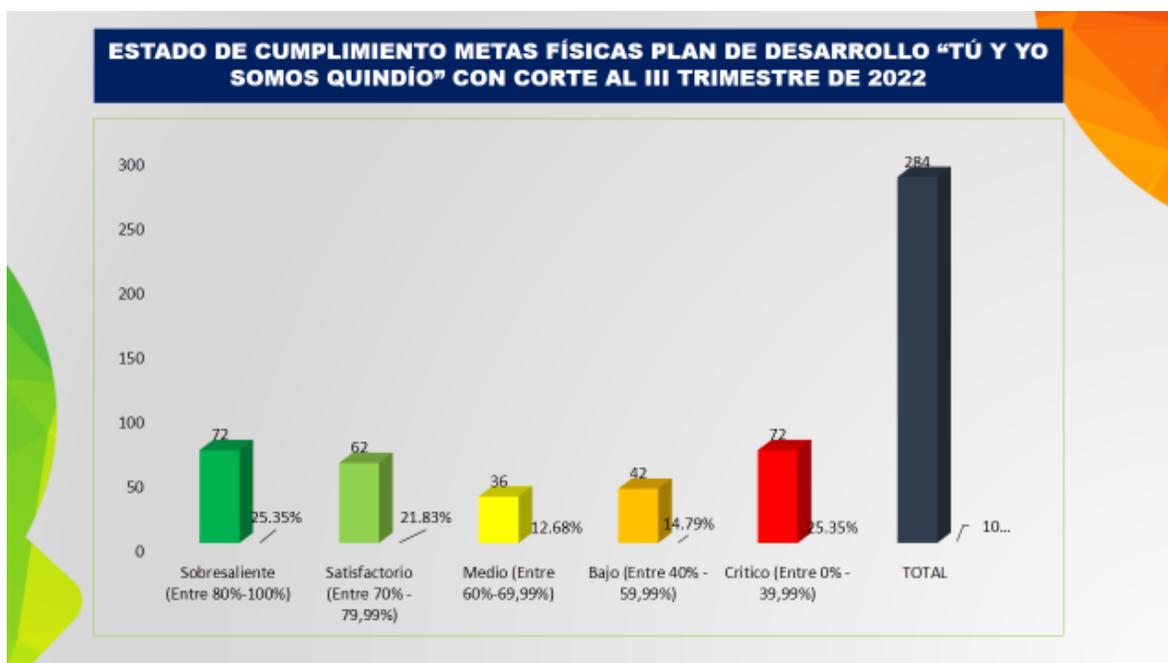

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 29

▪ Ejecución de las metas físicas por dependencia

ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" CON CORTE AL III TRIMESTRE DE 2022													
No	SECRETARÍAS	METAS PRODUCTO PROGRAMADA	% DE METAS	SEMAFORO									
				VERDE OSCURO 80% Y 100%	%	VERDE CLARO 70% Y 79%	%	AMARILLO A 60% Y 69%	%	NARANJA A 40% Y 59%	%	ROJO 0% Y 39%	%
1	Administrativa	4	1.41%	0	0%	2	50%	0	0%	2	50%	0	0%
2	Planeación	12	4.23%	2	17%	6	50%	2	17%	2	17%	0	0%
3	Hacienda	2	0.70%	0	0%	0	0%	2	100%	0	0%	0	0%
4	Agua e Infraestructura	22	7.75%	3	14%	0	0%	1	5%	2	9%	16	73%
5	Interior	21	7.39%	7	33%	4	19%	2	10%	7	33%	1	5%
6	Cultura	10	3.52%	0	0%	2	20%	1	10%	4	40%	3	30%
7	Turismo, Industria y Comercio	10	3.52%	0	0%	7	70%	0	0%	1	10%	2	20%
8	Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	37	13.03%	3	8%	4	11%	7	19%	8	22%	15	41%
9	Privada	3	1.06%	0	0%	2	67%	0	0%	1	33%	0	0%
10	Educación	36	12.68%	15	42%	6	17%	2	6%	5	14%	8	22%
11	Familia	31	10.92%	6	19%	17	55%	1	3%	4	13%	3	10%
13	Salud	51	17.96%	17	33%	11	22%	12	24%	4	8%	7	14%
14	Tecnología de la Información y las Comunicaciones	24	8.45%	18	75%	0	0%	0	0%	0	0%	6	25%
15	Indeportes	6	2.11%	0	0%	0	0%	5	83%	0	0%	1	17%
16	Proyecto Empresa para el Desarrollo Territorial	11	3.87%	1	9%	0	0%	0	0%	0	0%	10	91%
17	Instituto Tránsito Departamental	4	1.41%	0	0%	1	25%	1	25%	2	50%	0	0%
	Total Metas Programadas 2021	284	100%	72		62		36		42		72	


4. Estado de ejecución de ingresos por fuentes de financiación con corte a III trimestre de 2022:

- Análisis de todas las fuentes de financiación (presupuesto definitivo, ingreso efectivo, compromisos, obligaciones, y la diferencia entre los ingresos efectivos contra los compromisos), con el objetivo de conocer la situación de cada fuente de financiación.

Las fuentes analizadas son:


Recurso ordinario, estampilla Procultura, estampilla Prodesarrollo, recursos ACPM, impuesto al registro, estampilla Proadulto mayor, Sistema General de Participaciones SGP Educación, PAE, monopolio, rentas cedidas salud, recursos Adres, impuesto al consumo, SGP salud, cofinanciación nacional salud, fondo de estupefacientes, cofinanciación convenios interadministrativos, SGP agua potable y saneamiento básico, fondo de seguridad, IVA telefonía móvil, recursos del crédito, convenio INVIAS, Colciencias, ley de punto final, convenio 1609 y convenio 1645.

El formato usado para el análisis de cada una de estas fuentes de financiación fue el siguiente:

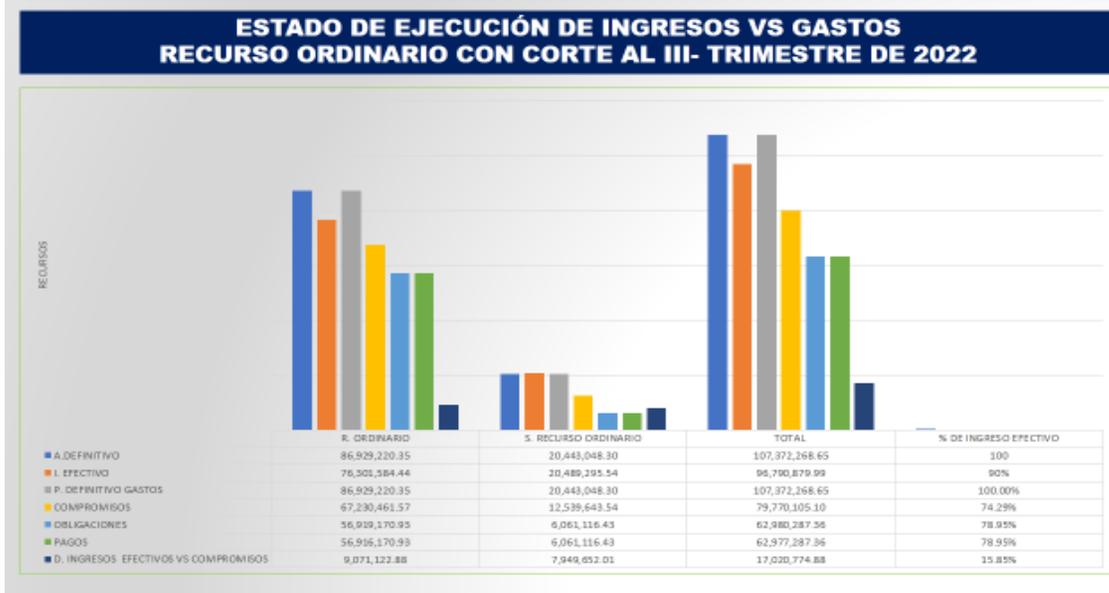

5. Estado de ejecución Plan operativo anual de inversiones POAI secretaría de Aguas e Infraestructura con corte al 30 de septiembre de 2022:

- De una apropiación definitiva de \$ 35.755.534.437, tienen compromisos por \$ 17.188.762.699 que corresponde a un 48% con corte a septiembre de 2022, y con corte al 31 de octubre tiene una ejecución del 48%, no tuvo avance.

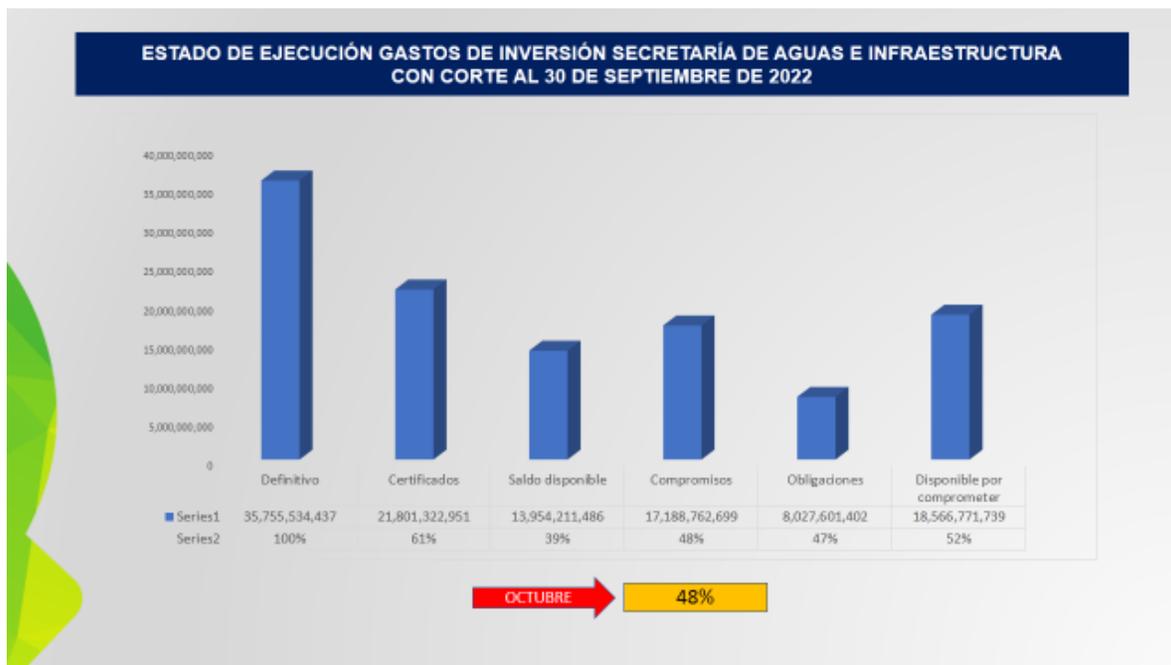



FORMATO

Código: F-CIG-03



Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 29

Estado de Ejecución por fuente de financiación de la secretaría de Aguas e Infraestructura

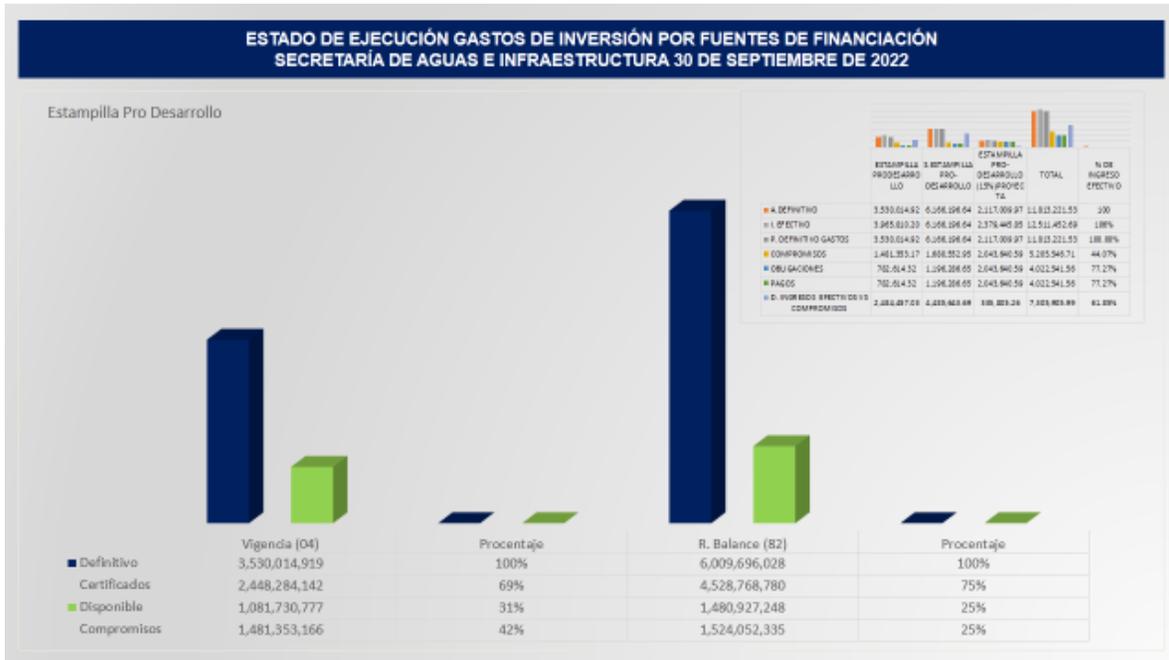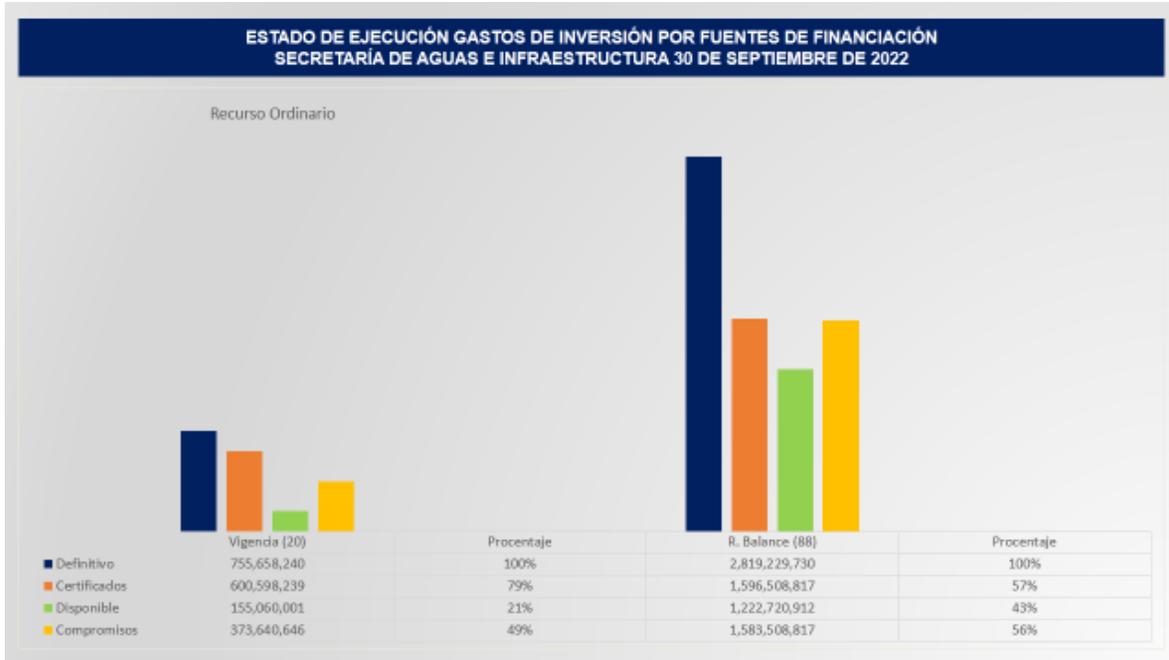



ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022


SGP Agua Potable Saneamiento Básico



RECLAMADO	SUPLENTE ORIGINAL DE PARTES INADecuadas A LA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	SUPERAVIT SGP AGUA POTABLE	TOTAL
A. DEFINITIVO	2,866,923.61	694.79	2,867,618.40
B. CERTIFICADO	2,156,815.59	694.79	2,163,510.38
C. COMPROMISOS	2,866,923.61	694.79	2,867,618.40
D. DISPONIBLES	2,866,923.61	0.00	2,866,923.61
E. PAGOS	1,807,889.81	0.00	1,807,889.81
F. INGRESOS EFECTIVOS DE COMPROMISOS	-107,837.82	694.79	-107,143.03

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Convenio INVIAS

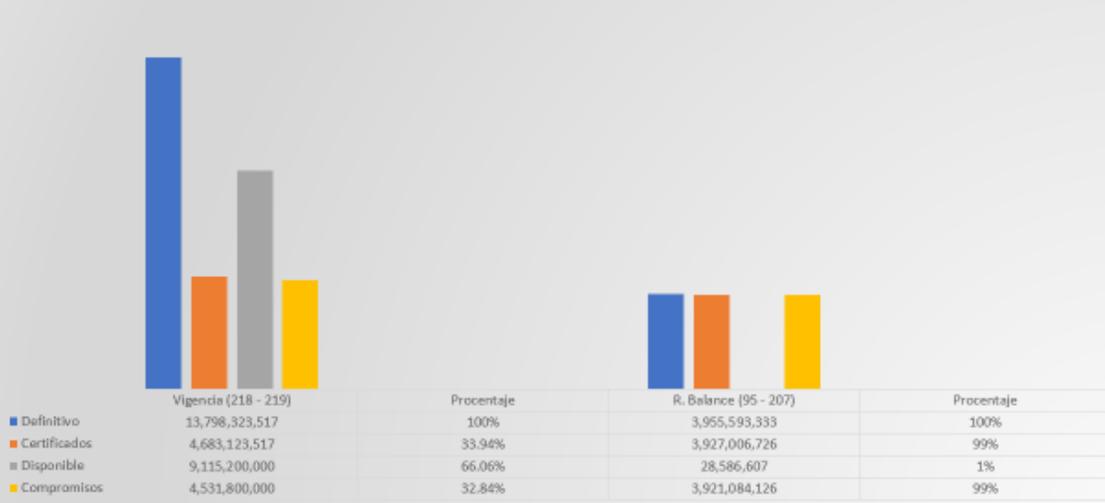



FORMATO


Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 29

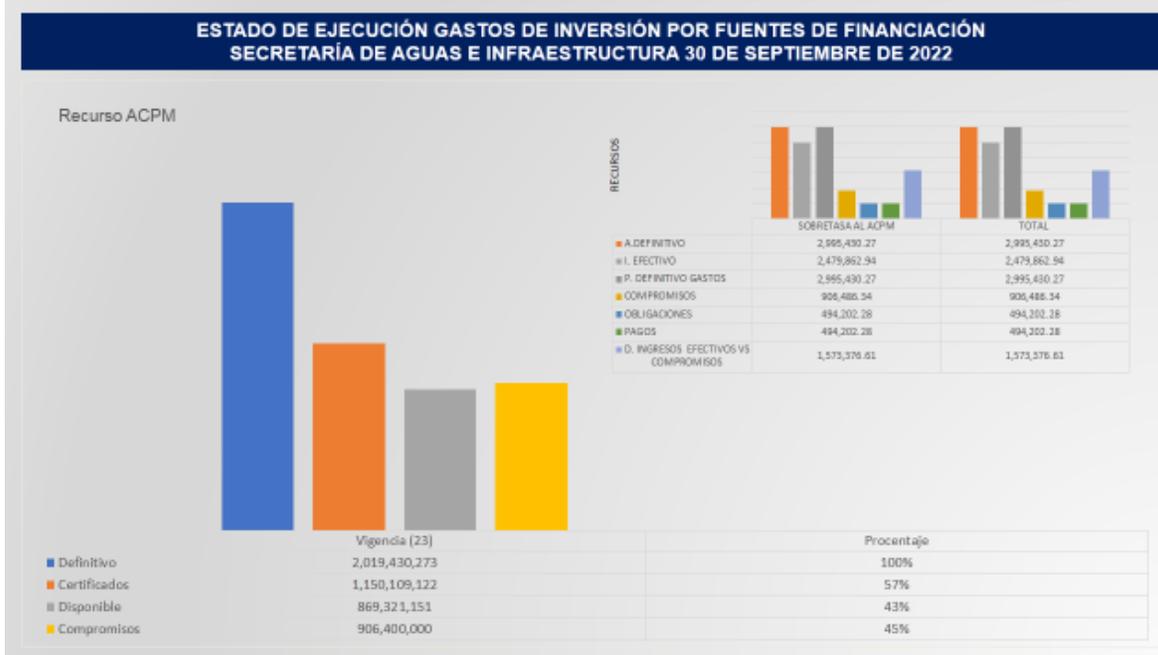

- El estado de ejecución por proyectos de inversión:

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Proyecto			Imputación Presupuestal		Presupuesto					Semanario (Compromiso): Sobresaliente (80% - 100%) Satisfactorio (70% - 79%) Medio (60% - 69%) Bajo (40% - 59%) Crítico (0% - 39%) (Compromiso/Pago Definitivo)	
RPN	Nombre	Valor	Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo - Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Obligaciones		Saldo disponible por Comprometer (Definitivo - compromisos)
2020003630017	Mantenimiento de las instituciones públicas y/o de seguridad y justicia del Estado en el Departamento Quindío	64,250,000.00	Recurso Ordinario	20	64,250,000	50,250,000	14,000,000	47,250,000	2,100,000	17,000,000	74%
2020003630018	Mejoramiento de la infraestructura física de las instituciones de salud pública y bienestar social en el departamento del Quindío	516,811,948.00	Superávit Recurso Ordinario	88	516,811,948	516,811,948	-	516,811,948	147,543,584	-	100%
2020003630050	Mantenimiento de la infraestructura Educativa en el Departamento del Quindío.	3,902,276,899.88	Estampilla Pro-Desarrollo	04	1,500,000,000	1,467,056,538	32,944,460	769,149,000	631,389,233	740,861,000	29%
			Superávit Estampilla Prodesarrollo	82	2,402,276,899	2,320,367,756	81,909,143	366,000,000	306,450,000	2,046,276,899	
2021003630001	Mantenimiento de la infraestructura cultural en el departamento del Quindío	67,500,000.00	Recurso Ordinario	20	67,500,000	65,334,589	2,165,411	26,600,000	11,500,000	40,900,000	39%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 29

**ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

2021003630017	Construcción y dotación centro de atención integral para personas con discapacidad en el Departamento del Quindío	50,000,000.00	Recurso Ordinario	20	50,000,000	-	50,000,000	-	-	50,000,000	0%
2020003630052	Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de obras físicas de infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento del Quindío	3,934,014,919.00	Estampilla Pro-Desarrollo	04	770,014,919	328,199,000	441,815,919	328,199,000	182,999,000	441,815,919	27%
			Superávit Estampilla desarrollo	82	3,164,000,000	1,784,981,895	1,399,018,105	735,341,100	313,181,100	2,428,658,900	
2021003630018	Adecuación planta de beneficio animal en el Departamento del Quindío	3,400,000.00	Recurso Ordinario	20	3,400,000	3,400,000	-	3,400,000	3,400,000	-	100%
2021003630019	Adecuación física de mercado en el Departamento del Quindío	40,000,000.00	Recurso Ordinario	20	40,000,000	35,200,000	4,800,000	35,200,000	8,400,000	4,800,000	35%
2020003630053	Mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y/o atención las vías para garantizar la movilidad y competitividad en el departamento del Quindío.	10,000,855,363.00	Recurso Ordinario	20	57,508,240	52,500,000	5,008,240	22,500,000	22,500,000	35,008,240	49%
			Superávit Recurso Ordinario	88	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	19,999,278	-	
			Superávit Convenio Administrativo	95	3,054,512,644	3,054,512,644	-	3,054,512,644	2,653,014,430	-	
			Sobretasa al ACPM	23	1,019,430,273	755,300,000	264,130,273	752,600,000	365,796,666	266,830,273	
			convenio 1645 de 2021 Inviás Salento	219	3,798,323,517	3,798,323,517	-	3,047,000,000	-	151,323,517	
			convenio 1600 del 2020 Inviás vías terciarias	218	10,000,000,000	884,800,000	9,115,200,000	884,800,000	36,000,000	9,115,200,000	
			Superávit Convenio INVIAS Colombia Rural	207	401,080,689	372,404,082	28,586,607	366,571,482	49,000,000	34,509,207	
			Recurso Ordinario	20	50,000,000	10,000,000	40,000,000	10,000,000	6,000,000	40,000,000	7%
			Sobretasa al ACPM	23	100,000,000	-	100,000,000	-	-	100,000,000	

**ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

2020003630054	Elaboración estudios y diseños de infraestructura vial en el Departamento del Quindío	155,000,000.00	Recurso Ordinario	20	155,000,000	155,000,000	-	86,000,000	-	69,000,000	55%
2021003630004	Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de estabilización de Taludes en el Departamento del Quindío	2,014,285,000.00	Sobretasa al ACPM	23	600,000,000	209,900,000	390,100,000	9,900,000	8,800,000	590,100,000	52%
			Superávit Recurso Ordinario	88	1,354,285,000	980,696,869	373,588,130	980,696,869	701,209,597	373,588,130	
			Recurso Ordinario	20	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	56,900,000	-	
2021003630002	Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de infraestructura para la mitigación y atención de desastres en los municipios del departamento del Quindío	1,261,472,133.72	Sobretasa al ACPM	23	300,000,000	184,909,122	115,090,878	143,900,000	119,549,280	156,100,000	16%
			Superávit Recurso Ordinario	88	861,472,133	63,000,000	788,472,133	50,000,000	40,826,000	801,472,133	
			Recurso Ordinario	20	100,000,000	89,113,650	10,886,350	3,103,979	-	96,896,021	
2020003630057	Mejoramiento de vivienda de interés social en el Departamento del Quindío	380,000,000.00	Recurso Ordinario	20	20,000,000	-	20,000,000	-	-	20,000,000	0%
			Estampilla Pro-Desarrollo	04	360,000,000	-	360,000,000	-	-	360,000,000	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión


Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 16 de 29

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN												
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022												
2021003630003	Mantenimiento de la infraestructura institucional o de edificios públicos en el Departamento del Quindío	126.660.648.00	Recurso Ordinario	20	50.000.000	47.400.000	2.600.000	47.106.667	16.600.000	2.813.333	50%	
			Supervisió	05	76.660.648	16.000.000	60.660.648	16.000.000	16.000.000	60.660.648		
2021003630006	Construcción y/o adecuación de casetas comunales en los diferentes barrios del departamento	36.000.000.00	Recurso Ordinario	20	36.000.000	32.400.000	5.600.000	32.400.000	-	5.600.000	85%	
2020003630014	Implementación del plan departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento básico en el Departamento del Quindío	4.211.007.525.00	S.G.P. Agua Potable Saneamiento Básico	27	515.110.811	515.110.811	-	515.110.811	515.110.811	-	100%	
			S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico	27	300.000.000	300.000.000	-	300.000.000	300.000.000	-	100%	
			Extensión Pro- Desarrollo	04	900.000.000	653.029.602	246.970.397	304.005.186	66.226.000	505.904.833	-	69%
			Supervisió	90	664.789	-	664.789	-	-	664.789	-	100%
			Extensión Pro- Desarrollo	82	443.418.128	443.418.128	-	432.711.236	432.711.236	10.707.893	-	100%
			S.G.P. Agua Potable Saneamiento Básico	27	1.116.812.797	1.116.812.797	-	1.116.812.797	1.082.225.064	-	-	100%
			S.G.P. Agua Potable Saneamiento Básico	27	185.000.000	185.000.000	-	185.000.000	-	-	-	100%
			S.G.P. Agua Potable Saneamiento Básico	27	650.000.000	650.000.000	-	650.000.000	-	-	-	100%
			S.G.P. Agua Potable Saneamiento Básico	27	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-	100%
					36.755.534.437.40			36.755.534.437	24.801.322.851	13.954.211.486	17.186.762.696	8.927.601.461

- Estado de Ejecución metas producto: La secretaría cuenta con 22 metas de las cuales 3 están en semáforo verde oscuro- sobresaliente, 1 en semáforo amarillo- medio, 2 en semáforo naranja-bajo y 16 en semáforo rojo-crítico.

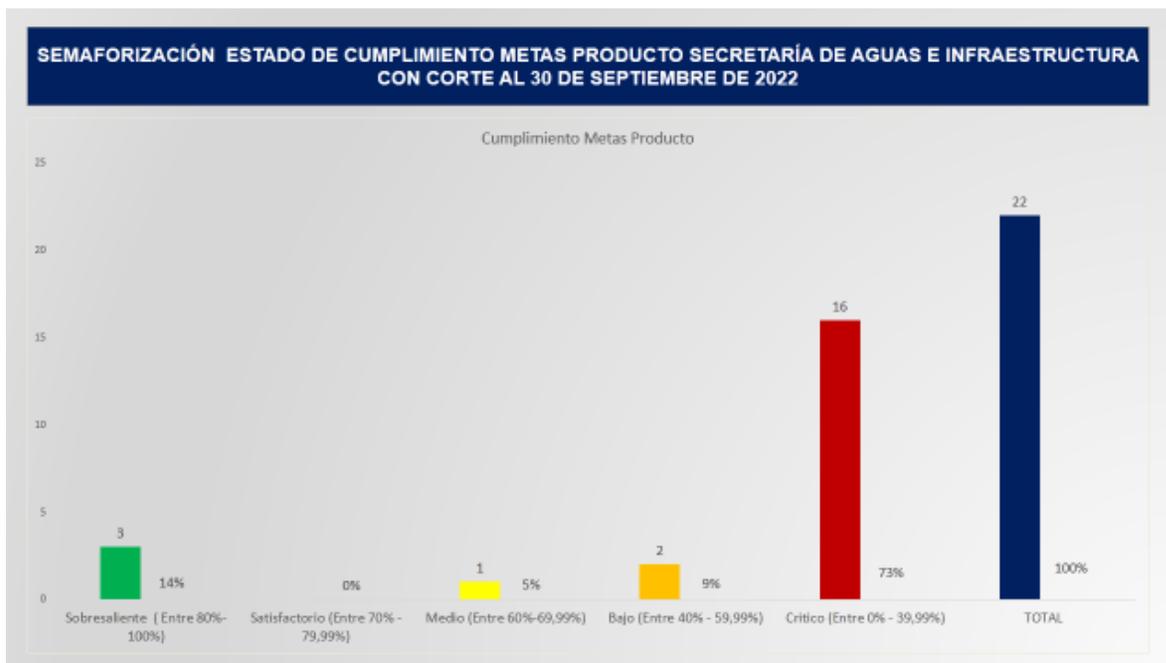

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 29

▪ Estado de cumplimiento de las Metas físicas acumuladas 2020- 2023

ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" SECRETARÍA DE AGRICULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022																							
Nombre del Producto aprobado en el PDT	Dependencia responsable	Nombre del indicador aprobado en el PDT	Línea Base Producto	Unidad de medida del indicador de producto escogido	Meta Producto o Cuantitativa	Tipología Meta Acumulada	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Meta 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Reprogramada	Ejecución Meta 2021	% Ejecución 2021	Meta Física Esperada 2022	Meta Reprogramada	Ejecución Meta 2022	% Ejecución 2022	Meta Física Esperada 2023	Meta Reprogramada	Avance Meta física 2020 - 2022	Porcentaje Meta física 2020 a sep 2022	Avance Meta física Cuantitativa	Porcentaje Meta física Cuantitativa
Infraestructura de las Instituciones de Seguridad del Estado con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, reforzados	Secretaría de Aguas y Infraestructura	Infraestructura de las Instituciones de Seguridad del Estado construida, mejorada, ampliada, mantenida, reforzada	4	No.	12	No Acumulada	1	1	100%	3		3	100%	4		1	25%	4		5.00	63%	5.00	42%
Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, reforzados	Secretaría de Aguas y Infraestructura	Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, reforzados	1	No.	1	Acumulada	2	2	100%	1		0.6	60%	1		0.0	0%	1		0.93	60%	0.70	45%
Infraestructura de Instituciones Educativas con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, reforzados	Secretaría de Educación y PROYECTA	Infraestructura de Instituciones Educativas construida, mejorada, ampliada, mantenida, reforzada.	54	No.	54	No Acumulada	9	19	211%	15		9	60%	15	6	9	43%	15		37.00	96%	37.00	69%

ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" SECRETARÍA DE AGRICULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022																							
Nombre del Producto aprobado en el PDT	Dependencia responsable	Nombre del indicador aprobado en el PDT	Línea Base Producto	Unidad de medida del indicador de producto escogido	Meta Producto o Cuantitativa	Tipología Meta Acumulada	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Meta 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Reprogramada	Ejecución Meta 2021	% Ejecución 2021	Meta Física Esperada 2022	Meta Reprogramada	Ejecución Meta 2022	% Ejecución 2022	Meta Física Esperada 2023	Meta Reprogramada	Avance Meta física 2020 - 2022	Porcentaje Meta física 2020 a sep 2022	Avance Meta física Cuantitativa	Porcentaje Meta física Cuantitativa
Servicio mantenimiento de infraestructura cultural	Secretaría de Aguas y Infraestructura	Infraestructura Cultural intervenida	4	No.	10	No Acumulada	1	5	500%	2		3	100%	4		1	25%	3		9.00	100%	9.00	90%
Centros de atención integral para personas con discapacidad y familiares dotados	Secretaría de Aguas y Infraestructura y Secretaría de Familia y Salud	Centros de atención integral para personas con discapacidad y dotados	1	No.	1	No Acumulada	0.15			0.25	0.15			0.6		0.00	0%	NP	0.4	0.00	0%	0.00	0%
Infraestructura deportiva recreativa con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, reforzados	Secretaría de Aguas y Infraestructura y PROYECTA Empresa y Desarrollo Territorial	Infraestructura deportiva recreativa construida, mejorada, ampliada, mantenida, reforzada	48	No.	12	No Acumulada	3	4	133%	3		13	100%	3		2	45%	3		19.00	100%	19.00	100%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 18 de 29

ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" SECRETARÍA DE AGRICULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022

Nombre del Producto aprobado en el PDT	Dependencia responsable	Nombre del Indicador aprobado en el PDT	Línea Base Producto	Unidad de medida del indicador de producto escogido	Meta Product o Cuatrime No Acumulado	Tipología Acumulado	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Metas 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Reprogramada	Ejecución Metas 2021	% Ejecución	Meta Física Esperada 2022	Meta Reprogramada	Ejecución Metas 2022	% Ejecución	Meta Física Esperada 2023	Meta Reprogramada	Avance Meta física 2020 - 2022	Porcentaje Meta física 2020 a sep 2022	Avance Meta física Cuatrime o	Porcentaje Meta física Cuatrime a sep 2022
Piscinas construidas dotadas	Secretaría de Aguas e Infraestructura a Deportes	Piscinas construidas dotadas	Y	ND	No.	1	No Acumulado	0.25	0.00	0%	0.25			0.25	0.25			0.25	0.50	0.00	0%	0.00	0%
Plantas de beneficio animal adecuadas	Secretaría de Infraestructura a Agricultura Desarrollo Rural Medio Ambiente	Plantas de beneficio animal adecuadas		ND	No.	1	Acumulado	NP		NP				1		0.00	0%	1		0.00	0%	0.00	0%
Plazas mercado adecuadas	Secretaría de Infraestructura a Agricultura Desarrollo Rural Medio Ambiente	Plazas mercado adecuadas		ND	No.	1	Acumulado	1	0	0%	NP			1		0.00	0%	1		0.00	0%	0.00	0%
Redes domiciliarias de energía eléctrica instaladas	Secretaría de Infraestructura	Viviendas en zonas rurales conectadas a la red del sistema de distribución local de energía eléctrica		ND	No.	155	No Acumulado	70		85				NP	155			NP		0.00	0%	0.00	0%

ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" SECRETARÍA DE AGRICULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022

Nombre del Producto aprobado en el PDT	Dependencia responsable	Nombre del Indicador aprobado en el PDT	Línea Base Producto	Unidad de medida del indicador de producto escogido	Meta Product o Cuatrime No Acumulado	Tipología Acumulado	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Metas 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Reprogramada	Ejecución Metas 2021	% Ejecución	Meta Física Esperada 2022	Meta Reprogramada	Ejecución Metas 2022	% Ejecución	Meta Física Esperada 2023	Meta Reprogramada	Avance Meta física 2020 - 2022	Porcentaje Meta física 2020 a sep 2022	Avance Meta física Cuatrime o	Porcentaje Meta física Cuatrime a sep 2022
Mirador turístico construido	Secretaría de Aguas e Infraestructura	Mirador turístico construido		ND	No.	1	No Acumulado	0.5	0.0	0%	0.5	0.5		NP	0.5			NP	0.5	0.00	0%	0.00	0%
Infraestructura en puentes con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento	Secretaría de Aguas e Infraestructura	Infraestructura en puentes construida, mejorada, ampliada, mantenida y/o reforzada	1	No.	1	Acumulado	NP			1		100%	1		0	0%	1			0.50	50%	0.33	33%
Infraestructura vial con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento.	Secretaría de Infraestructura a PROYECTO Empresa para Desarrollo Territorial	Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	70.379	Km	70.379	Acumulado	70.379	232.35	330%	70.379		227.35	100%	70.379		332.0	100%	70.379		203.90	100%	197.93	100%
Estudios diseños de infraestructura vial.	Secretaría de Infraestructura	Estudios y diseños de infraestructura vial elaborados.	1	No.	8	No Acumulado	1	1	100%	6		2	33%	1	4	1	20%	NP		4.00	67%	4.00	50%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 19 de 29

ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" SECRETARÍA DE AGRICULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022

Nombre del Proyecto aprobado en el PDT	Dependencia responsable	Nombre del indicador aprobado en el PDT	Línea Base Producto	Unidad de medida del indicador de producto escogido	Meta Producto Cuentreño	Tipología Meta Acumulado No Acumulado	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Meta 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Reprogramada	Ejecución Meta 2021	% Ejecución 2021	Meta Física Esperada 2022	Meta Reprogramada	Ejecución Meta 2022	% Ejecución 2022	Meta Física Esperada 2023	Meta Reprogramada	Avance Meta Física 2020 - 2022	Porcentaje Meta física 2020 a sep 2022	Avance Meta física Cuentreño	Porcentaje Meta física Cuentreño a sep 2022
Infraestructura acoturística construida	Secretaría de Aguas Infraestructura a Secretaría de Turismo	Infraestructura acoturística construida	ND	No.	1	No Acumulado	0.1	0.0	0%	0.3	0.1			0.3	0.4			0.3		0.00	0%	0.00	0%
Obras de estabilización de taludes	Secretaría de Aguas Infraestructura a Secretaría de Agricultura Rural y Medio Ambiente - 2	Obras de estabilización de taludes realizadas	ND	No.	12	No Acumulado	1	1	100%	3		0	0%	4	2	1	30%	4	1	2.00	29%	2.00	17%
Obras de infraestructura para mitigación de desastres	Secretaría de Aguas Infraestructura a Secretaría de Medio Ambiente - 2	Obras de infraestructura para mitigación y atención de desastres realizadas	1	No.	12	No Acumulado	2	1	50%	3		2	67%	3	1	0	0%	4	1	3.00	43%	3.00	25%

ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" SECRETARÍA DE AGRICULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022

Nombre del Proyecto aprobado en el PDT	Dependencia responsable	Nombre del indicador aprobado en el PDT	Línea Base Producto	Unidad de medida del indicador de producto escogido	Meta Producto Cuentreño	Tipología Meta Acumulado No Acumulado	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Meta 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Reprogramada	Ejecución Meta 2021	% Ejecución 2021	Meta Física Esperada 2022	Meta Reprogramada	Ejecución Meta 2022	% Ejecución 2022	Meta Física Esperada 2023	Meta Reprogramada	Avance Meta Física 2020 - 2022	Porcentaje Meta física 2020 a sep 2022	Avance Meta física Cuentreño	Porcentaje Meta física Cuentreño a sep 2022
Viviendas urbanas mejoradas	Secretaría de Aguas Infraestructura a PROYECTA Empresa para Desarrollo Territorial	Viviendas de interés social mejoradas	ND	No.	300	No Acumulado	10	0	0%	50		14	28%	120	46	0	0%	120	0	14.00	8%	14.00	5%
Alcantarillados construidos	Secretaría de Aguas Infraestructura a Secretaría de Medio Ambiente - 2	Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas	ND	No.	2	No Acumulado	1	0	0%	1		0	0%	NP	1	0	0%	NP	1	0.00	0%	0.00	0%
Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado	Secretaría de Aguas Infraestructura a Secretaría de Medio Ambiente - 2	Proyectos de acueducto y alcantarillado en áreas urbanas financiados	ND	No.	12	No Acumulado	1	1	100%	4		2	50%	4	2	4	66%	3		7.00	78%	7.00	58%
Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales	Secretaría de Aguas Infraestructura a Secretaría de Medio Ambiente - 2	Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en áreas rurales financiados	ND	No.	2	No Acumulado	0.1			1		0	0%	0.5		0.5	100%	0.4	1.1	0.50	100%	0.50	25%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 20 de 29

ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" SECRETARÍA DE AGRICULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022

Nombre del Producto aprobado en el PDT	Dependencia responsable	Nombre del indicador aprobado en el PDT	Línea Base Producto	Unidad de medida del indicador de producto escogido	Meta Producto Cuatrimestro	Tipología Meta Acumulado No	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Metas 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Reprogramada	Ejecución Metas 2021	% Ejecución	Meta Física Esperada 2022	Meta Reprogramada	Ejecución Metas 2022	% Ejecución	Meta Física Esperada 2023	Meta Reprogramada	Avance Meta física 2020 - 2022	Porcentaje Meta física 2020 a sep 2022	Avance Meta física Cuatrimestro	Porcentaje Meta física Cuatrimestro a sep 2022
Servicios de educación informal en aguas potables saneamiento básico	Secretaría de Aguas e Infraestructura	Eventos de educación informal en aguas saneamiento básico realizados	4	No.	4	Acumulada	4	4	100%	4		4	100%	4		4	100%	4		4.00	100%	3.00	75%
Estudios de pre inversión	Secretaría de Aguas e Infraestructura	Estudios de diseños realizados	0	ND	8	No Acumulada	1	1	100%	3		3	100%	2		0	0%	2		4.00	67%	4.00	50%
Adoptar e implementar la Política Pública de Producción Sostenible y Gestión Integral de Aseo	Secretaría de Agua e Infraestructura	Política Pública de Producción Sostenible y Gestión Integral de Aseo adoptada e implementada.	ND	No.	1	Acumulada	1	0	0%	1		0	0%	NP		1	0%	NP		0.00	0%	0.00	0%

ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" SECRETARÍA DE AGRICULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022


Nombre del Producto aprobado en el PDT	Dependencia responsable	Nombre del indicador aprobado en el PDT	Línea Base Producto	Unidad de medida del indicador de producto escogido	Meta Producto Cuatrimestro	Tipología Meta Acumulado No	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Metas 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Reprogramada	Ejecución Metas 2021	% Ejecución	Meta Física Esperada 2022	Meta Reprogramada	Ejecución Metas 2022	% Ejecución	Meta Física Esperada 2023	Meta Reprogramada	Avance Meta física 2020 - 2022	Porcentaje Meta física 2020 a sep 2022	Avance Meta física Cuatrimestro	Porcentaje Meta física Cuatrimestro a sep 2022
Balones comunales adecuados	Secretaría de Aguas e Infraestructura	Balones comunales adecuados	12	No.	8	No Acumulada	2	2	100%	2		3	100%	2		0	0%	2		5.00	63%	5.00	63%
Infraestructura institucional o de edificios públicos de atención de servicios ciudadanos con procesos constructivos mejorados, ampliados, mantenidos y/o reforzados	Secretaría de Agua e Infraestructura	Infraestructura institucional o edificios públicos construida mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	4	No.	4	Acumulada	4	19	236%	4		3	75%	4		2	25%	4		8.00	100%	6.00	94%



ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" SECRETARÍA DE AGRICULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022																							
Nombre del Producto aprobado en el PDT	Dependiente responsable	Nombre del Indicador aprobado en el PDT	Línea Base Producto	Unidad de medida del indicador de producto escogido	Meta Producto Cuatrimestro	Tipología Meta Acumulado No Acumulado	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Metas 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Reprogramada	Ejecución Metas 2021	% Ejecución 2021	Meta Física Esperada 2022	Meta Reprogramada 2022	Ejecución Metas 2022	% Ejecución 2022	Meta Física Esperada 2023	Meta Reprogramada	Avance Meta física 2020 - 2022	Porcentaje Meta física 2020 a sep 2022	Avance Meta física Cuatrimestro	Porcentaje Meta física Cuatrimestro 4 sep 2022
Infraestructura vial con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento.	Secretaría de Infraestructura	Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida y/o reforzada	ND	No.	5	No Acumulado	NP			2.5		2.5	100%	2.5				NP		2.50	50%	2.50	50%
Infraestructura vial con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento.	Secretaría de Infraestructura	Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida y/o reforzada	ND	No.	54.621	No Acumulado	NP			2.5		2.5	100%	33.481		3.8	11%	18.64		6.30	18%	6.30	12%
Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	Secretaría de Aguas e Infraestructura	Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados		No.	1	No Acumulado	NP			NP		NP			1			NP		0.00	0%	0.00	0%
Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	Secretaría de Aguas e Infraestructura	Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados		No.	3	No Acumulado	NP			NP		NP			2			1		0.00	0%	0.00	0%



6. Estado de ejecución Sistema General de Regalías SGR secretaría de Aguas e Infraestructura corte al 30 de septiembre de 2022:

- La secretaría de Infraestructura tiene recursos del Sistema General de Regalías por \$ 53.600.603.882.44, compromisos por valor de \$ 32.437.254.018.12 correspondiente al 61% y obligaciones por valor de \$ 19.892.718.282.64 correspondiente al 37%.

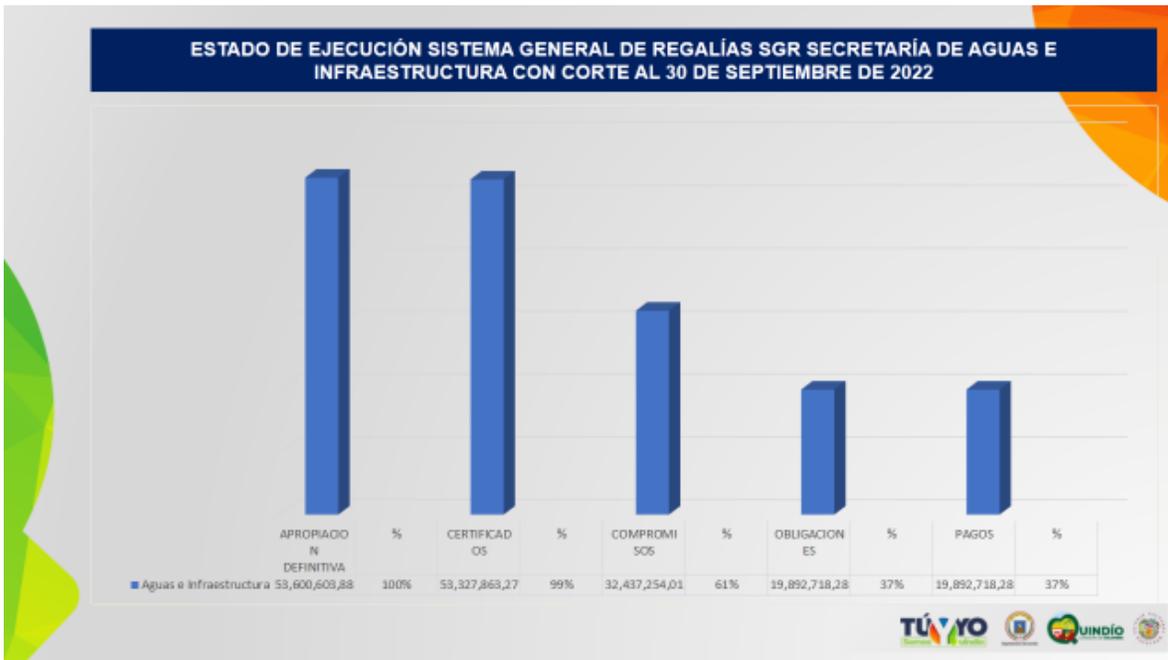

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 22 de 29

- Los proyectos de regalías que tiene a cargo esta secretaría son:

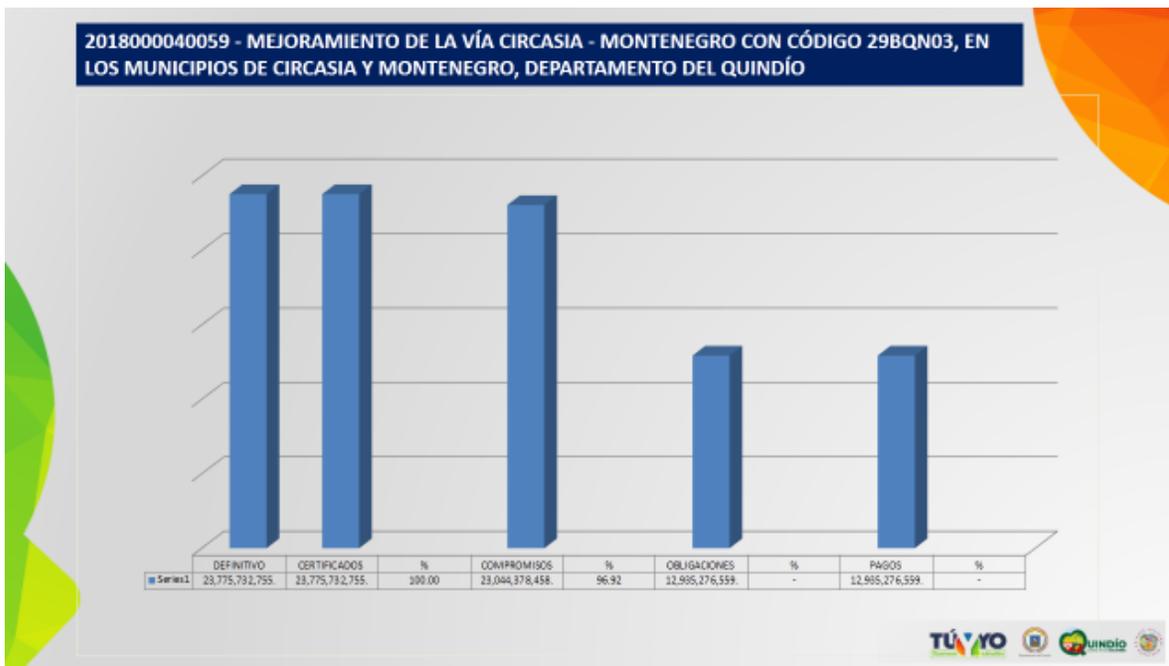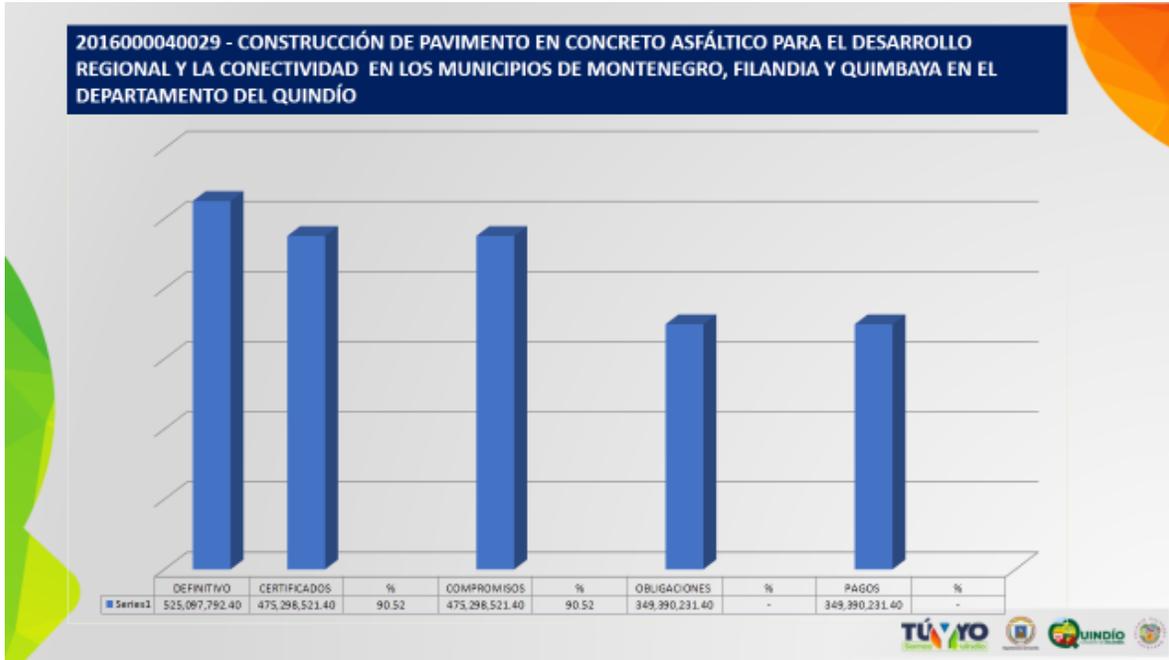



FORMATO

Código: F-CIG-03


Acta de reunión

Versión: 04


Fecha: 07/12/2018

Página 23 de 29

20181301011385 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA BANCA VÍA LA ESPAÑOLA RÍO VERDE, BARRAGÁN CÓDIGO 40QN04-1 QUINDÍO

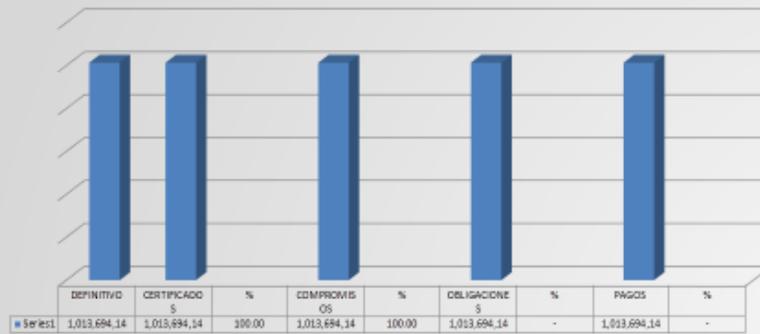

20181301011142 - CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RIO VERDE-PIJAO (COD.40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CÓRDOBA-CARNICEROS (COD.40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CÓRDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

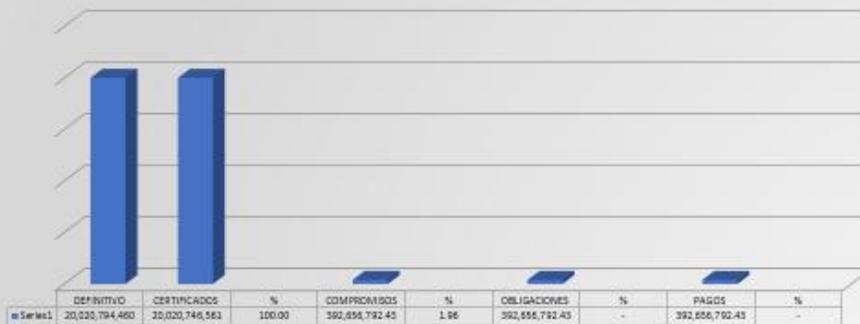



FORMATO

Código: F-CIG-03


Acta de reunión

Versión: 04


Fecha: 07/12/2018

Página 24 de 29

2013000040049 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL SECUNDARIA, TERCARIA Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

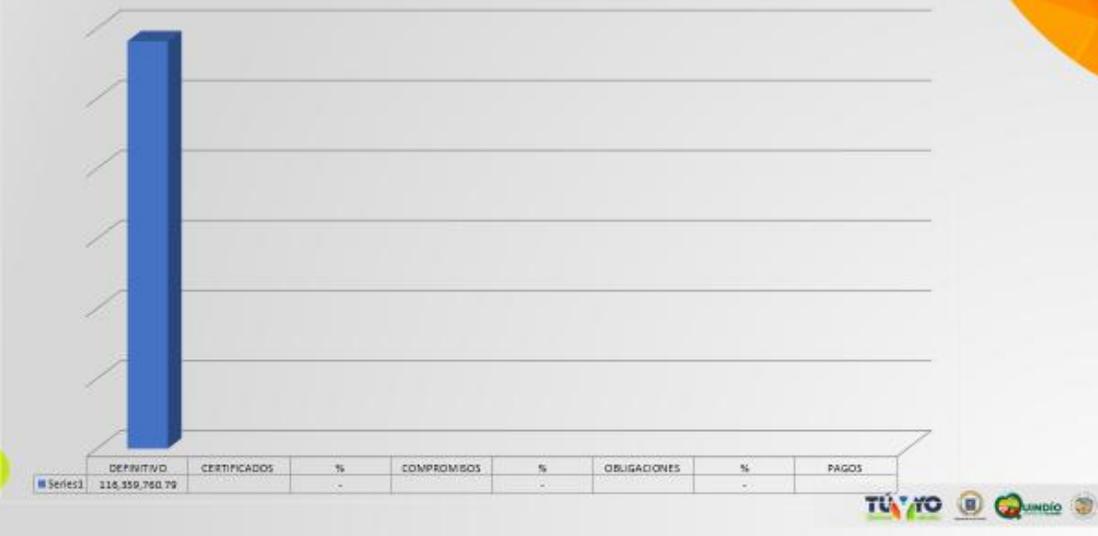


2017000040038 - REMODELACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, OBRAS DE URBANISMO COMPLEMENTARIAS Y MOVILIDAD DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

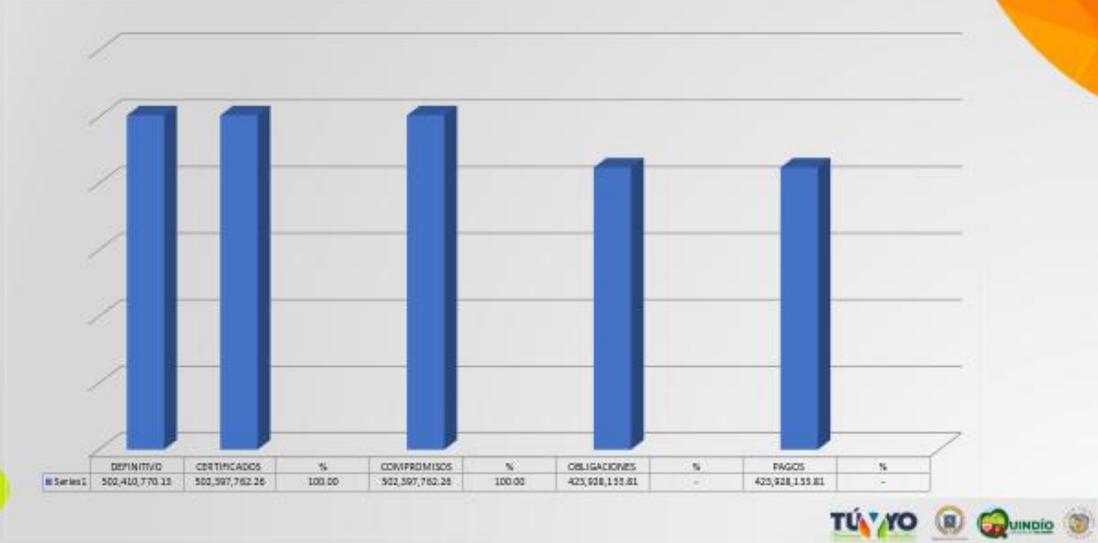




2017000040014 - REMODELACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS RESULTANTES DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEL ESTUDIO DE REORDENAMIENTO FÍSICO FUNCIONAL DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS. QUINDÍO

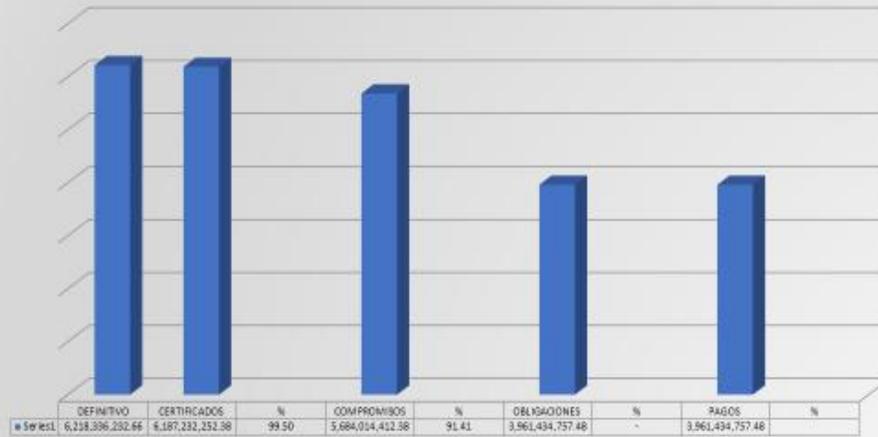

2020003630002 - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID19) EN ARMENIA, QUINDÍO

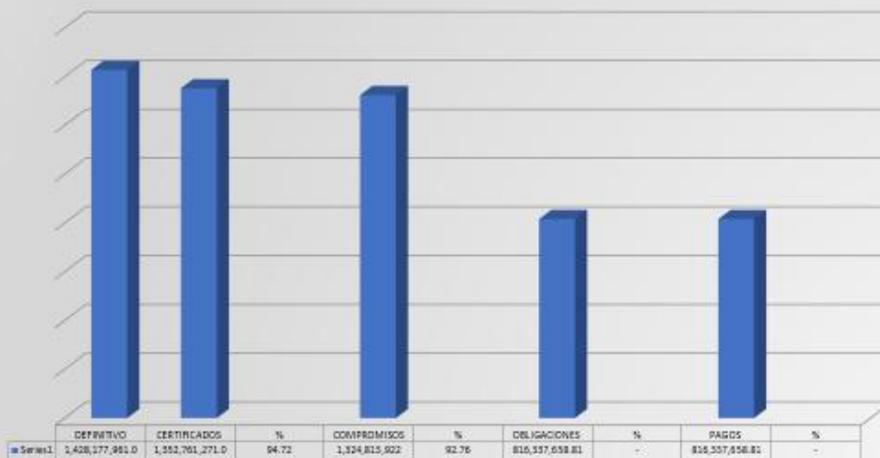

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

7. Conclusiones:

La Directora técnica a través de presentación en power point expone las principales conclusiones del proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo “TU Y YO SOMOS QUINDIO” de competencia de la Secretaría de Aguas e Infraestructura.

**CONCLUSIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

- La Secretaría de Aguas e Infraestructura, cuenta con un compromiso de (\$17.188.762.698.55), equivalente al (48%) del total del presupuesto asignado de (\$35.755.534.437.4), que se encuentra bajo su responsabilidad con corte al 30 de septiembre de 2022, ubicándose en semáforo naranja- bajo.

- La Secretaría de Aguas e Infraestructura, cuenta con un nivel muy bajo en el estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo, de las veintidós (22) metas que se encuentran bajo su responsabilidad, tres (3) se encuentran en semáforo verde oscuro- sobresaliente para un 14%, una (1) en amarillo- bajo (5%), dos (2) en semáforo naranja- bajo (9%) y diez y seis (16) en semáforo rojo- crítico (73%).

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	3	14%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)		0%
Medio (Entre 60%-69,99%)	1	5%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	2	9%
Crítico (Entre 0% - 39,99%)	16	73%
TOTAL	22	100%

**CONCLUSIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

- La secretaría presenta una diferencia de 13% entre los certificados de disponibilidad y los Registros Presupuestales- Compromisos, los cuales se sugieren revisar, si se encuentran en un trámite precontractual o se deben liberar.

- El porcentaje de compromiso de 61% por valor de \$32.437.254.018.12 con los recursos del Sistema General de Regalías SGR, de responsabilidad de las secretaría de Aguas e Infraestructura, es medio, con respecto al total de los recursos apropiados por un valor de \$53.600.603.882.44

- La Secretaría de Aguas e Infraestructura, tiene recursos del balance sin comprometer, los cuales deben ser una prioridad

Recurso Ordinario	Definitivo	Certificados	Disponible	Compromisos
R. Balance (88)	2.819.229.730	1.596.508.817	1.222.720.912	1.583.508.817
Porcentaje	100%	57%	43%	56%
R. Balance (82)	6.009.696.028	4.528.768.780	1.480.927.248	1.524.052.335
Porcentaje	100%	75%	25%	25%





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 27 de 29

**CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022**

● La Secretaría Aguas e Infraestructura, con metas de bajo cumplimiento (semáforo naranja) y críticas (semáforo rojo), que debe ser la prioridad, sin descuidar las que han obtenido buenos resultados.

Nombre del Producto aprobado en el PDT	Dependencia responsable	Nombre del indicador aprobado en el PDT	Línea Base Producto	Unidad de medida del indicador de producto escogido	Meta Producto Cuatrimestro	Tipología Meta Acumulada	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Meta 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Reprogramada 2021	Ejecución Meta 2021	% Ejecución	Meta Física Esperada 2022	Meta Reprogramada	Ejecución Meta 2022	% Ejecución	Meta Física Esperada 2023	Meta Reprogramada	Avance Meta Física 2020 - 2022	Avance Porcentaje Meta Física Cuatrimestro 2022	Avance Porcentaje Meta Física Cuatrimestro a sep 2022	
Centros de atención integral para personas con discapacidad construidos	Secretaría de Infraestructura y Familia	Centros de atención integral para personas con discapacidad construidos	1	No.	1	No Acumulada	0.15			0.25	0.15			0.6	0.00	0.00	0%	NP	0.4	0.00	0%	0.00	0%
Piscinas construidas dotadas	Secretaría de Infraestructura y Deportes	Piscinas construidas dotadas	ND	No.	1	No Acumulada	0.25	0.00	0%	0.25				0.25	0.25			0.25	0.50	0.00	0%	0.00	0%
Plantas beneficio animal adecuadas	Secretaría de Agricultura Rural Medio Ambiente	Plantas beneficio animal adecuadas	ND	No.	1	Acumulada	NP			NP				1		0.00	0%	1		0.00	0%	0.00	0%
Piscinas	Secretaría de Infraestructura	Piscinas	00																				

**CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"
SECRETARÍA SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022**

Nombre del Producto aprobado en el PDT	Dependencia responsable	Nombre del indicador aprobado en el PDT	Línea Base Producto	Unidad de medida del indicador de producto escogido	Meta Producto Cuatrimestro	Tipología Meta Acumulada	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Meta 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Reprogramada 2021	Ejecución Meta 2021	% Ejecución	Meta Física Esperada 2022	Meta Reprogramada	Ejecución Meta 2022	% Ejecución	Meta Física Esperada 2023	Meta Reprogramada	Avance Meta Física 2020 - 2022	Avance Porcentaje Meta Física Cuatrimestro 2022	Avance Porcentaje Meta Física Cuatrimestro a sep 2022	
Redes domiciliarias de energía eléctrica instaladas	Secretaría de Infraestructura	Viviendas en zonas rurales conectadas a la red del sistema local de energía eléctrica	ND	No.	100	No Acumulada	70			80				NP	100			NP		0.00	0%	0.00	0%
Mirador turístico construido	Secretaría de Infraestructura	Mirador turístico construido	ND	No.	1	No Acumulada	0.5	0.0	0%	0.5	0.5			NP	0.5			NP	0.5	0.00	0%	0.00	0%
Infraestructura en puentes con procesos construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento	Secretaría de Infraestructura	Infraestructura en puentes construida, mejorada, ampliada, mantenido y/o reforzada	1	No.	1	Acumulada	NP			1		1	100%	1		0	0%	1		0.50	50%	0.33	33%
Infraestructura ecoturística construida	Secretaría de Infraestructura y Turismo	Infraestructura ecoturística construida	ND	No.	1	No Acumulada	0.1	0.0	0%	0.3	0.1			0.3	0.4			0.3		0.00	0%	0.00	0%
Obras para estabilización de	Secretaría de Infraestructura	Obras para estabilización de	ND	No.	12	No Acumulada	1	1	100%	3	0	0	0%	4	2	1	25%	4	1	2.00	25%	2.00	17%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 28 de 29

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"
SECRETARÍA SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022

Nombre del Producto aprobado en el PDT	Dependencia responsable	Nombre del indicador aprobado en el PDT	Línea Base Producto	Unidad de medida del indicador de producto escogido	Meta Producto Cuatrimestro	Tipología Meta Acumulada No Acumulada	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Metas 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Reprogramada	Ejecución Metas 2021	% Ejecución 2021	Meta Física Esperada 2022	Meta Reprogramada	Ejecución Metas 2022	% Ejecución 2022	Meta Física Esperada 2023	Meta Reprogramada	Avance Meta física 2020 - 2022	Avance Porcentaje Meta física 2020 a sep 2022	Avance Meta física Cuatrimestro	Avance Porcentaje Meta física Cuatrimestro a sep 2022
Obras de infraestructura para mitigación de desastres	Secretaría de Aguas e Infraestructura	Obras de infraestructura para mitigación y atención de desastres realizadas	1	No.	12	No Acumulada	2	1	50%	3		2	67%	3	1	0	0%	4	1	3.00	43%	3.00	25%
Viviendas urbanas mejoradas	Secretaría de Aguas e Infraestructura	Viviendas de interés social mejoradas	ND	No.	300	No Acumulada	10	0	0%	50		14	28%	120	48	0	0%	120	0	14.00	0%	14.00	5%
Alcantarillados construidos	Secretaría de Aguas e Infraestructura	Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas	ND	No.	2	No Acumulada	1	0	0%	1		0	0%	NP	1	0	0%	NP	1	0.00	0%	0.00	0%
Adoptar e implementar la Política Pública de Consumo Sostenible Gestión Integral de Asso Infraestructura	Secretaría de Aguas e Infraestructura	Política Pública de Consumo Sostenible y Gestión Integral de Asso adoptada e implementada	ND	No.	1	Acumulada	1	0	0%	1		0	0%	NP	1	0	0%	NP	1	0.00	0%	0.00	0%

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"
SECRETARÍA SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022

Nombre del Producto aprobado en el PDT	Dependencia responsable	Nombre del indicador aprobado en el PDT	Línea Base Producto	Unidad de medida del indicador de producto escogido	Meta Producto Cuatrimestro	Tipología Meta Acumulada No Acumulada	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Metas 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Reprogramada	Ejecución Metas 2021	% Ejecución 2021	Meta Física Esperada 2022	Meta Reprogramada	Ejecución Metas 2022	% Ejecución 2022	Meta Física Esperada 2023	Meta Reprogramada	Avance Meta física 2020 - 2022	Avance Porcentaje Meta física 2020 a sep 2022	Avance Meta física Cuatrimestro	Avance Porcentaje Meta física Cuatrimestro a sep 2022
Infraestructura vial con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento.	Secretaría de Aguas e Infraestructura	Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	ND	No.	54.621	No Acumulada	NP			2.5		2.5	100%	33.481		3.8	11%	18.84		6.30	10%	6.30	12%
Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	Secretaría de Aguas e Infraestructura	Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados		No.	1	No Acumulada	NP			NP		NP			1			NP		0.00	0%	0.00	0%
Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	Secretaría de Aguas e Infraestructura	Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados		No.	3	No Acumulada	NP			NP		NP			2			1		0.00	0%	0.00	0%

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Presentación en power point
2	Listado de asistencia

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
----------------------	--------------------	-------------	---------------

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 29 de 29

<p>La secretaría de Aguas e Infraestructura se compromete a realizar una mesa de trabajo para revisar los CDP de regalías.</p> <p>2. Se comprometen a revisar que procesos tienen pendientes con CDP o RP, y gestionarlos en jurídica.</p>			
--	--	--	--

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

--	--	--

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora técnica Planeación	
Adriana Gómez Orrego	Contratista	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG
