

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 46

<b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b>			
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</b>			
<b>ACTA NÚMERO:</b>	No 123 de 2022		
<b>FECHA:</b>	23-08-2022	<b>HORA DE INICIO:</b>	8:00 a.m.
		<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	11:30 a.m.
<b>LUGAR:</b>	Secretaria de Aguas e infraestructura y Oficina de Control Interno de Gestión		
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	SI	NO	X
Seguimiento y verificación de la Gestión realizada para cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío” y el Plan de Acción de la Secretaria de Aguas e Infraestructura correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021 con corte al 31 de diciembre			

<b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b>			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	José Duván Lizarazo Cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Contratista OICG	Hernán Gallego Cano	Oficina de Control Interno de Gestión

<b>AGENDA DEL DÍA</b>		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Identificar las metas producto de la Secretaria de Aguas e Infraestructura del Departamento y su cumplimiento físico (eficacia), igual que su ejecución presupuestal (eficiencia) con corte 31 de diciembre de 2021 en el Plan Indicativo 2020–2023, presentadas en el informe <b>“Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023”</b> – “Tu y Yo somos Quindío” realizado por la Secretaria de Planeación, de acuerdo con lo programado para el semestre, con el fin de garantizar su comportamiento en lo referente a la ejecución física durante la vigencia del 2do Semestre de 2021	Hernán Gallego Cano Auditor Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 46

### DESARROLLO TEMATICO

- 1 Relacionar las metas producto, con el fin de identificar a que proyectos de inversión pertenecen, a partir de ahí verificar la contratación y ejecución de la Secretaría de Aguas e Infraestructura

### CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

De acuerdo a la verificación realizada sobre el cumplimiento a las Metas del Plan de Acción por parte de la Secretaria de Aguas e Infraestructura del Departamento y verificada por parte de la Oficina de Control Interno de gestión, se pudo determinar lo siguiente.

Mediante esta evaluación y consolidación a los proyectos de acuerdo con las Metas de producto contenidas en el Plan de Desarrollo presentado por la Secretaria de Aguas e Infraestructura del Departamento, se recopiló la información pertinente con el fin de evaluar la ejecución y avance de esta en el Plan de Acción con corte a 31 de diciembre de 2021.

Según la información suministrada por parte de la Secretaria de Aguas e Infraestructura se pudo establecer que la Secretaria de Aguas e Infraestructura tiene veinte (20) Metas distribuidas en las cuatro Líneas Estratégicas contempladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tu y Yo somos Quindío", así:

#### ESTRATEGIA 1. INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD

**Programa: Promoción de Acceso a la Justicia "Tu y Yo con Justicia"**  
**BPIN-202000363-0017**  
**Código 1202019**

Meta: Infraestructura de las Instituciones de seguridad del estado con procesos constructivos y/o mejorados y/o ampliados y/o mantenidos y/o reforzados – cuatro (04)

INDICADOR: Infraestructura de las Instituciones de seguridad del estado construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenida, Y/o Reforzada

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación para el 2022 de \$ 64'250.000.00. recursos ordinarios. De los cuales ha comprometido en el primer semestre de la vigencia 2022 \$ 2'100.000.00, lo que corresponde al **3,00 % de la asignación, lo cual representa la EFICIENCIA**

Y como Meta física la secretaria tiene dentro del Plan de Acción para el 2022, la infraestructura de cuatro (04) Instituciones de seguridad del estado construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenida, Y/o Reforzada.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 46

**EVIDENCIA:**

La Secretaria de Aguas e Infraestructura a través de la dirección de Infraestructura Social no presenta ninguna acción al indicador que es el construir y/o Mejorar, y/o Ampliar, y/o Mantener, Y/o Reforzar a las Instituciones de seguridad del estado, solo evidencia visitas técnicas de evaluación así:

- Visita técnica cárcel Peñas Blancas con el fin de intervenir redes eléctricas realizada el 3-02-2022, anexa entrega de materiales eléctricos el 18-01-2022
- Cárcel de mujeres patio sindicatos Armenia
- Base No. 8 Batallón Cacique Calarcá
- CAE Primavera Montenegro

Intervenciones a realizar con personal de la Secretaria y Proceso de Ferretería

**Siendo su Eficacia del 0,00%**

Observación de la OCIG: De acuerdo con el Indicador para esta Meta, de construir, mejorar, ampliar, mantener y/o reforzar, a la infraestructura de Instituciones de Seguridad del Estado, y de acuerdo con las evidencias de la Secretaría de Aguas e Infraestructura NO ha adelantado el objeto de las cuatro 4 adecuaciones con mejoramientos de las instalaciones de seguridad del estado.

**Programa: Prestación de Servicios de Salud “Tu y Yo con servicios de Salud”**

**Código KPT. 1906**

**BPIN-202000363-0018**

**Código 1906015**

Meta: Infraestructura Hospitalaria con procesos constructivos y/o mejorados, y/o ampliados y/o mantenidos, y/o reforzados

INDICADOR: Infraestructura Hospitalaria construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenida, y/o Reforzada, con una (1) para la vigencia 2022


Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación para el 2022 de \$ 516'811.948,00 recursos ordinarios, de los cuales ha comprometido en el primer semestre de la vigencia 2022 \$ 491'811.948,00 de los recursos ordinarios, **lo que corresponde al 95,00 % de la asignación, siendo esta su EFICIENCIA**

Como Meta física la secretaria tiene dentro del Plan de Acción para el 2022, Infraestructura Hospitalaria construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenida, y/o Reforzada una (1)

**EVIDENCIA:**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 46

La Secretaria de Aguas e Infraestructura presenta evidencias del mejoramiento, construcción, ampliación y/o mejoramiento de la infraestructura del Hospital Departamental San Juan de Dios de Armenia, proyecto BPIN2017000040014 que se viene ejecutando con recursos del SGR, de acuerdo con el Modificadorio No 05 al contrato de Obra Pública No 056 de 2018 del 21 de junio de 2022, por valor de \$789'764.914,00, y de acuerdo con el Decreto N0 00426 de 16-06-2022 "Por medio del cual se aprueba el registro de ajuste a proyectos financiados con recursos del SGR de acuerdo con la Ley 2056 de 2020 y Decreto 1821 de 2020"



MODIFICATORIO No. 005 AL CONTRATO DE OBRA No 056 DE 2018, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Y CONSORCIO SALUD QUINDIO.

OBJETO:	REMEDIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AREAS RESULTANTES DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEL ESTUDIO DE REORDENAMIENTO FÍSICO FUNCIONAL DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS, QUINDÍO.
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD QUINDIO
NIT.	NIT: 901.239.061-5
REPRESENTANTE LEGAL	YOLANDA JEANETH CUESTA BOTIVA
CC.	30.083.308 de Villavicencio (M)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$9.049.148.896,95) INCLUIDO

Siendo su Eficacia del 0,00%

Observación de la OCIG:

De acuerdo con el Indicador para esta Meta el cual contempla procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos y/o reforzados realizados, a la infraestructura Hospitalaria del departamento del Quindío, y de acuerdo con las evidencias de la Secretaría de Aguas e Infraestructura el cumplimiento de ésta Meta durante el primer semestre de la vigencia 2022, lo evidencia con el Modificadorio No 05 al contrato de Obra No 056 de 2018, firmado el 21 de junio, por lo cual durante el primer semestre no presenta avances físicos al cumplimiento de la Meta solo financieros. pero debemos resaltar que del presupuesto asignado la SAI ha comprometido el 95,00% pero no evidencia para cual infraestructura hospitalaria fueron asignados.

**Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media." Tú y yo con educación y de calidad"**

**BPIN\_ 202000363-0050**

**Código 2201062**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 46

Meta: Infraestructura de Instituciones Educativas con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados

INDICADOR: Infraestructura de Instituciones Educativas construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenida, Y/o Reforzada – 15 instituciones para la vigencia 2022 y siete que vienen de la vigencia 2021 para un total de veintiún (21) Instituciones Educativas.

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación para el 2022 de \$ 3.902'276.0009, de los cuales la SAI ha comprometido para el primer semestre de la vigencia 2022 \$ 827'049.000,00 **lo que equivale a un 21,20 %, siendo ésta su EFICIENCIA**

Evidencias: En el primer semestre la SAI realizó:

Se realizó mantenimiento a 7 instituciones educativas y se está a la espera de publicación de obra pública para intervenir otras instituciones se encuentra en revisión técnica:

1. Instituciones Educativas Los Pinos del municipio de Salento: se realizó cerramiento con malla eslabonada y tubería galvanizada y se realizó ampliación de cerramiento a una mayor altura, mantenimiento de cerramiento, templada y fijación de malla.
2. Institución Educativa Naranjal municipio de Quimbaya se realizó demolición de concreto de vía interna en mal estado y se retiró escombro, nivelación de terreno se fundió placa con hierro de temperatura.
3. Institución Educativa Libre – sede – Consuelo Betancourt mejoramiento de las instalaciones del restaurante escolar, Resane y estuco sobre muros, Aplicación de pintura vinilo sobre muros, Aplicación de pintura epóxica sobre muros, Reposición de repellos sobre zócalos, Pintura tipo Koraza exterior sobre zócalos, Pintura esmalte sobre carpintería metálica.
4. Institución Educativa Antonio Nariño – Calarcá Quindío Adecuaciones locativas restaurante escolar, Resane y estuco sobre muros, Aplicación de pintura vinilo sobre muros, Cambio de tejas deterioradas, Construcción de media caña en mortero para impermeabilización de losa en cubierta, Instalación de guarda escoba – media caña en PVC.
5. Institución Educativa Francisco Miranda, del corregimiento La India municipio de Filandia Quindío adecuaciones locativas, Instalación de guarda escoba media caña en PVC, Instalación de mesones en acero inoxidable, Instalación de lavaplatos en acero inoxidable, Fraguado de piso cerámico, Instalación de soportes metálicos para estantería.
6. Institución Educativa Quimbaya – Sede Principal Adecuaciones locativas restaurante escolar, Resane y estuco sobre muros, Aplicación de pintura epóxica de Poliuretano sobre muros, Impermeabilización de junta de construcción, Instalación de enchape cerámico sobre pared formato 20x20 cm.
7. Institución Educativa Policarpa Salavarrieta – Sede – Antonia Santos Municipio de Quimbaya adecuaciones locativas, Reposición de tejas en fibro cemento, Resane y estucos sobre





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 46

OBSERVACIONES OCIG: La SAI, aporta como evidencias la contratación de Personal Técnico y Profesional mediante la Contratación de Prestación de Servicios, en el anexo a la presente Acta un cuadro en Excel con la información de cada uno de ellos, y en el segundo semestre las obras realizadas por PROYECTA de acuerdo con el Convenio Interadministrativo celebrado entre la Gobernación del Quindío y Proyecta con una inversión de \$1.062.662.479,64 el cual contó con aportes de la Secretaria de Educación por valor de \$158.321.359,00.

La SAI tiene como Meta para el año 2022 Mantener, mejorar y/o rehabilitar la Infraestructura de veintiún (21); y en primer semestre de 2022 ha intervenido (07), y la presentación de Estudios Previos para la realización del proyecto para el cumplimiento de ésta Meta con el fin que la Secretaria Jurídica y de Contratación adelante la Contratación y/o Licitación correspondiente

**Programa: Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos. "Tú y yo somos cultura Quindiana"**

**BPIN-20200036-0051**

**Código 3301068**

Meta: Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural

INDICADOR: Infraestructura cultural intervenida – 4 PARA EL 2022

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 67'500.000,00 recursos ordinario de los cuales ha comprometido en el primer semestre de 2022 \$ 11'600'000,00 **lo que equivale a un 17,00 % siendo esta su EFICIENCIA**

EVIDENCIAS: La Secretaría de Aguas e Infraestructura presenta como evidencia la realización de visitas técnicas y se cuenta con presupuestos, planos y estudios previos de para el proceso de mínima cuantía de:

- Casa de la cultura La Tebaida
- Casa de la historia Buenavista

**CON UNA EFICACIA DEL 0,00%**

OBSERVACIONES OCIG: Analizada la contratación del rubro en la parte Cultural la SAI aporta para ésta Meta los estudios, visitas técnicas y se cuenta con presupuestos, planos para el proceso de contratación por mínimas cuantías, sin embargo, su objetivo no se ha cumplido en el primer semestre de 2022

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 46

**Programa: Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar. "Tú y yo con atención integral"**  
**BPIN-202100363-0017**  
**Código 4104036**

Meta: Construcción y dotación centros de atención integral para personas con discapacidad en el departamento del Quindío

INDICADOR: Centros de atención integral para personas con discapacidad construidos y dotados – 0,6

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 50'000.000,00 recursos ordinario de los cuales no ha comprometido en el primer semestre de 2022 ninguna partida **lo que equivale a un 0,00 % siendo esta su EFICIENCIA**

EVIDENCIAS: La Secretaría de Aguas e Infraestructura NO presenta evidencias para el cumplimiento de ésta Meta en el primer semestre de 2022:

**CON UNA EFICACIA DEL 0,00%**

OBSERVACIONES OCIG: Revisada la matriz presentada por la secretaria de aguas e Infraestructura para el seguimiento del primer semestre al Plan de Acción, no aparece evidencia para el cumplimiento de ésta Meta.

**Programa: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte. "Tú y yo en la recreación y el deporte"**  
**BPIN-202000363-0052**  
**Código 4301004**

Meta: Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados)

INDICADOR: Infraestructura deportiva y/o recreativa construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, Y/o Reforzada – tres (03)

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$3.934'014.919,00, de los cuales la SAI ha comprometido en el primer semestre de la vigencia 2022 \$ 542'440.0000,00 **que corresponde a 14, % siendo esta su EFICIENCIA**

Evidencias: La Secretaría de Aguas e Infraestructura presenta como evidencias para el cumplimiento de ésta Meta la siguiente información:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 46

Se realizó mantenimiento a 1 infraestructura deportiva en el departamento del Quindío así:

1. En el estadio del municipio de Córdoba se realizó resane de paredes, estuco y pintura de fachada frontal y lateral, pintura de pasamanos.

Además, se realizaron las siguientes labores menores con personal y recursos de la secretaría de Aguas e Infraestructura:

- Limpieza y rocería de terreno parque Infantil en el barrio Uribe Armenia donde se ubican los juegos infantiles, se hace escalera en concreto dando acceso al área de juegos. Para realizar la escalera se realizó limpieza del área, excavación, viga de cimentación, muro, nivelación de terreno, lleno compactado y fundición de escalera en concreto e instalación de pasamanos.
- Limpieza y rocería del área de cancha de futbol en la vereda La Cristalina municipio de Circasia, se cambió puerta de acceso a la cancha. Se repara tramos de malla en mal estado y se pinta.
- Se realiza rocería y limpieza de las zonas verdes, cerramiento cancha futbol del barrio la Cecilia Armenia.

Se les realiza mantenimiento a:

- Rocería y limpieza de canaletas concreto de las zonas verdes en el Polideportivo y coliseo La Patria Armenia.
- Rocería y limpieza de las zonas verdes, en la pista de motocrós Armenia.

En proceso para la intervención de los siguientes escenarios deportivos en el municipio de Armenia los estudios previos en revisión de la Secretaría Jurídica y de contratación para realizar la Licitación correspondiente:

- Villa del Café
- Arco Iris

Además, los biosaludables y parques infantiles, y escenario deportivo las Garzas en Pijao en proceso en revisión.

**Con una EFICACIA del 10,00%**

OBSERVACIONES OCIG: En cumplimiento del proyecto "Construir, mantener, mejorar y/o rehabilitar la infraestructura social del Departamento del Quindío", meta, mejoramiento y/o rehabilitación de la infraestructura de doce (12) escenarios deportivos y/o recreativos en el departamento del Quindío para el cuatrienio y de tres (03) para la vigencia 2022, para el primer semestre ha realizado solo actividades menores de mantenimiento con personal de la secretaría de aguas e infraestructura en varios escenarios del departamento, y las obras con los recursos solicitados apenas se encuentran en estudios previos para los parques infantiles biosaludables

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 46

en los municipios del departamento, el escenario deportivo Las Garzas en el municipio de Pijao y los de villa del Café y Arco Iris.

## ESTRATEGIA 2. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

**Programa: Infraestructura productiva y comercialización. "Tú y yo con agro competitivo"**  
**BPIN-202100363-0018**  
**Código 170965**

**META:** Infraestructura productiva y comercialización

**INDICADOR:** Plantas de Beneficio animal adecuadas - 1

Para la ejecución de esta Meta la Secretaría del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$40'000.000,00, de recursos ordinarios; del departamento vigencia 2022, la SAI ha comprometido en el primer semestre de la vigencia 2022 solo \$ 3'400,000,00, **para un avance de 9,00 % EFICIENCIA**

**EVIDENCIAS:** La Secretaría de Aguas e Infraestructura tiene como evidencia a ésta Meta la respuesta de nueve (09) municipios del Departamento (Montenegro, Filandia, Salento, Buenavista, La Tebaida, Armenia, Quimbaya, Génova y Córdoba) a una solicitud enviada por correo electrónica el día 22-03-2022 a las alcaldías municipales por el arquitecto Carlos Andrés Peláez Álzate, de la jefatura Social de la Secretaría en la cual requería información relacionada con si en su municipio existe Planta de Beneficio Animal, en la cual todos contestaron que NO existía Planta de Beneficio animal, solo el municipio de Armenia informa de la existencia de una Planta pero de carácter Privado (FRIGOCAFE)

### Respuesta Solicitud de Información 23/03/2022

29/3/22 15:47

De: Departamento Administrativo de Planeación Alcaldía de Armenia <planeacion@armania.gov.co>  
 Para: jefaturasocial@gobernacionquindio.gov.co

Cc: Lidia Clemencia Delgado Gutierrez <cdelgado@armania.gov.co>, Diego Fernando Tolón Gil <dtolon@armania.gov.co>, Jefe Oficina Planeación <jefo@armania.gov.co>

Cordial Saludo

Arquitecto  
 Carlos Andrés Peláez Álzate  
 Jefe de Oficina de Infraestructura Social  
 Secretaría de Aguas e Infraestructura  
 Departamento del Quindío

En respuesta a su solicitud realizada mediante correo electrónico el día 23 de marzo del 2022 respecto al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío "TÚ Y YO SOMOS QUINDIÓ", nos permitimos informar que actualmente el municipio de Armenia no cuenta con "Plantas de beneficio animal Públicos" solamente se cuenta con el Frigocafe entidad privada.

Esperamos sea de oportuna colaboración

Atentamente

Proyecto y estudio: Adriana Velásquez Hurtado- Profesional Contrata DAPM



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 46

**Siendo su eficacia 0,00 %****OBSERVACIONES DE LA OCIG:**

Esta oficina manifiesta que los entes territoriales acorde con los Actos administrativos del orden Departamental (Resolución No 000740 de 30 de abril de 2010) "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE RACIONALIZACION DE PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO", mediante el cual se racionaliza la prestación del servicio de sacrificio animal, en la Planta de Sacrificio denominada FRIGOCAFE ubicada en la ciudad de Armenia la cual es de carácter privado, lo anterior siendo acorde con el artículo 4 del Decreto 2965 de 2008, decreto 2380 de 2009, Decreto 2270 de 2012 y Decreto No 1500 de 2007, por lo cual el departamento no puede invertir dineros al no existir plantas de sacrificio animal públicas y de acuerdo con la Racionalización realizada por el departamento, excepto los municipios de Génova, La Tebaida y Filandia, quedando como Planta de beneficio de autoconsumo, para cada municipio, el resto de los municipios se acogieron al Plan de Racionalización.

Luego mediante Resolución No 0001451 de 21-06-2016 "POR MEDIO DE LA CUAL SE INCORPORAN ALGUNAS PLANTAS MUNICIPALES DE BENEFICIO ANIMAL DE GANADO BOVINO Y PORCINO DENTRO DEL PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEPARTAMENTAL, CON EL OBJETO DE QUE SE CONVIERTAN EN PLANTAS DE AUTOCONSUMO".

Y Con posterioridad mediante el Decreto No 004 de 27-01-2017 el municipio de La Tebaida adopta el cierre voluntario de la planta de beneficio animal.

Mediante resolución No 141 de 15-06-2018 el Municipio de Filandia dispone del cierre oficial de planta de beneficio animal.

Igualmente, en informe de la corporación autónoma regional del Quindío CRQ, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016 determina el incumplimiento del vertimiento de las aguas residuales de las tres plantas de autoconsumo que estaban en ese momento funcionado en el departamento concluyendo que se debe realizar el cierre de ellas.

Por todo lo anterior la OCIG, considera que la administración departamental al no poder invertir recursos en las Plantas de beneficio animal en el departamento toda vez que ningún municipio cuenta con Planta de Beneficio animal, acorde con el Plan de Racionalización del Depto., y además que en la actualidad la única planta autorizada es la que funciona en el municipio de Armenia denominada FRIGOCAFE siendo de carácter privado, por ello sugiere replantear la META: Infraestructura productiva y comercialización y su INDICADOR: Plantas de Beneficio animal adecuadas y reasignación de los recursos.-



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 46

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Comunicado Cierre PBA Filandia	18/08/2022 2:50 p. m.	Chrome HTML Do...	569 KB
DECRETO 004 DE 2017 - CIE	22 2:17 p. m.	Chrome HTML Do...	655 KB
Informe Centrales de Benef	Tamaño: 568 KB 22 2:19 p. m.	Chrome HTML Do...	147 KB
INFORME FINAL PBA QUINDIO	Fecha de modificación: 18/08/2022 2:50 p. m. 22 3:31 p. m.	Chrome HTML Do...	7.139 KB
Informe Invima PBA Quindío 2017	18/08/2022 2:49 p. m.	Chrome HTML Do...	2.351 KB
Resol 1451 Permiso Plantas de Autoconsumo Quindío	18/08/2022 2:30 p. m.	Chrome HTML Do...	1.235 KB
Resolución 740 de 2010 aprobación del plan de racionalización	18/08/2022 3:20 p. m.	Chrome HTML Do...	115 KB
Resolución-141-2018 Cierre PBA Filandia	18/08/2022 3:12 p. m.	Chrome HTML Do...	796 KB

**BPIN-202100363-0019**  
**Código – 1709078**

Meta: Adecuación Plazas de Mercado en el departamento del Quindío

INDICADOR: Plazas de Mercado Adecuadas

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$40'000.000,00 recursos ordinarios, de los cuales ha comprometido en el primer semestre de la vigencia 2022 \$ 11'400.000,00 con un avance de un **29,00%** siendo esta su **EFICACIA**

EVIDENCIAS: Para la adecuación de las plazas de mercado, se realizó:

- Visita técnica y elaboración de presupuesto, estudios previos de la plaza de mercado del municipio de Circasia Quindío para la estructuración de los estudios previos.

**Para una EFICACIA del 0,00%**

OBSERVACIONES OCIG: La SAI no presenta evidencias para el cumplimiento de la Meta, apenas está en la elaboración de estudios previos para la Plaza de Mercado del municipio de circasia.

### **ESTRATEGIA 3. TERRITORIO, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENEBLE**

Programa: Infraestructura red vial regional. "Tú y yo con movilidad vial"

**BPIN-202000363-0053**  
**Código 2402022**

META: Infraestructura en puentes con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 46

INDICADOR: Puente de la red vial secundaria con mantenimiento

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$150'000.000,00, de recursos ordinarios y recursos del balance; del departamento vigencia 2022, la SAI ha comprometido en el primer semestre de la vigencia 2022 solo \$ 2'400,000,00, **para un avance de 2,00 % EFICIENCIA**

EVIDENCIAS: Como evidencia la secretaria presenta los Estudios Previos y Pliego de condiciones a la secretaria Jurídica y de Contratación a la "Consultoría para la evaluación del riesgo, estabilización y complementarias estudios y diseños de puentes en el departamento del Quindío" para los puentes La Sonadora sobre la vía La Rochela – Quebrada negra del municipio de Calarcá y La Soledad sobre el Río Verde en el municipio de Córdoba.

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo
ESTUDIOS DEL SECTOR.pdf	2.463.097	2.463.097	Chrom
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	3.496.963	3.496.963	Chrom
Pliego de condiciones Definitivo Documento base D.T Consul...	5.361.531	5.361.531	Chrom

**Con una EFICACIA del 0,00%**

OBSERVACIONES DE LA OCIG: Las evidencias presentadas por la SAI, para esta Meta es apenas los Estudios Previos para la Consultoría de estudios y diseños de puentes en el departamento del Quindío, el Indicador de la Meta es la de mantenimiento de puentes en el departamento y en el primer semestre de la vigencia 2022, no se ha adelantado ningún mantenimiento.

**Programa: Infraestructura red vial regional. "Tú y yo con movilidad vial"**

**BPIN-202000363-0053**

**Código 2402041**

Meta: Infraestructura vial con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 46

INDICADOR: Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de:

Superávit Recurso Ordinario	88	20.000.000,00	20.000.000,00
Superávit Convenios Administrativo	95	3.554.512.644,00	3.554.512.644,00
Sobretasa al ACPM	23	1.019.430.273,00	342.300.000,00
convenio 1645 de 2021 invias Salento	219	3.798.323.517,00	-
convenio 1609 del 2020 invias vías terciarias	218	10.000.000.000,00	27.500.000,00
Superávit Convenio INVIAS Colombia Rural	207	401.080.689,00	55.000.000,00
<b>TOTAL VIGENCIA 2022</b>		<b>18.850'855.363,00</b>	<b>4.133.212.644</b>

recursos para ejecutar en esta Meta en la vigencia 2022 de \$ 18.850'855.363,00, de los cuales ha comprometido durante el primer semestre recursos por valor de \$ 4.133'212.644,00 **para un avance de 23,00 % SIENDO ESTA SU EFICIENCIA**

Evidencias: La secretaria de Aguas e Infraestructura a través de la Dirección vial presenta las siguientes evidencias, para el cumplimiento de la Meta en el primer semestre de la vigencia 2022:

Realizó Mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y/o atención en las vías para garantizar la movilidad y competitividad en el departamento del Quindío de la infraestructura vial en 190,00 kms, en los Municipios de la siguiente forma:

Se han intervenido 190 kilómetros de los 70.379 de la Meta con maquinaria del departamento y con el convenio con el Comité de Cafeteros, distribuidos así:

Filandia 36, Quimbaya 30, Montenegro 37, Tebaida 10, Calarcá 17, Salento 39, Circasia 21

Se está realizando intervención de vías terciarias mediante Convenio 1609 Colombia Rural - Ejército. INVIAS:

Circasia 7.3

Montenegro 2.7

MUNICIPIOS	INTERVENCION KM	
	ENERO	OBSERVACIONES



Acta de reunión

ARMENIA	
BUENAVISTA	
CALARCA	
CIRCASIA	
CORDOBA	
FILANDIA	
GENOVA	
LA TEBAIDA	
MONTENEGRO	
PIJAO	
QUIMBAYA	
SALENTO	

No se intervino en este mes porque el contrato de los contratistas no salió sino hasta el 21 de enero

MUNICIPIOS	INTERVENCION KM	
	FEBRERO	OBSERVACIONES
ARMENIA		
BUENAVISTA		
CALARCA		
CIRCASIA	10	
CORDOBA		
FILANDIA	5	
GENOVA		
LA TEBAIDA	10	
MONTENEGRO		
PIJAO		
QUIMBAYA	25	
SALENTO		



Via al municipio, Quimbaya, Quindío, Colombia

MUNICIPIOS	INTERVENCION KM	
	MARZO	OBSERVACIONES
ARMENIA		
BUENAVISTA		
CALARCA	13	
CIRCASIA		
CORDOBA		
FILANDIA		
GENOVA		
LA TEBAIDA		
MONTENEGRO	12	
PIJAO		
QUIMBAYA		
SALENTO		





MUNICIPIOS	INTERVENCION KM	
	ABRIL	OBSERVACIONES
ARMENIA		
BUENAVISTA		
CALARCA		
CIRCASIA		
CORDOBA	6	
FILANDIA		
GENOVA		
LA TEBAIDA		
MONTENEGRO	12	
PIJAO	5	
QUIMBAYA		
SALENTO		



MUNICIPIOS	INTERVENCION KM	
	MAYO	OBSERVACIONES
ARMENIA		
BUENAVISTA		
CALARCA		
CIRCASIA		
CORDOBA		
FILANDIA		
GENOVA		
LA TEBAIDA		
MONTENEGRO	12	
PIJAO		
QUIMBAYA		
SALENTO	4	



MUNICIPIOS	INTERVENCION KM	
	JUNIO	OBSERVACIONES
ARMENIA		
BUENAVISTA		
CALARCA		
CIRCASIA	13	
CORDOBA		
FILANDIA		
GENOVA		
LA TEBAIDA		
MONTENEGRO	7	
PIJAO		
QUIMBAYA		



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 46

SALENTO

6

### Avance 3,00% EFICACIA

OBSERVACIONES DE LA OCIG: La SAI NO presenta evidencias, de la ejecución del convenio 1609 "Colombia Rural", Ejército Nacional – INVIAS.

Y el mantenimiento de 142 Km en los municipios de Circasia 23 Km, Filandia 5 Km, La tebaida 10 Km, Quimbaya 25 Km, Calarcá 13 Km, Montenegro 43 Km, Circasia 6 Km, Pijao 6 Km y Salento 10 Km.

**Programa: Ordenamiento Ambiental Territorial. "Tú y yo planificamos con sentido ambiental"**

**BPIN- 202000363-0054**


**Código 2402118**

Meta: Estudios y diseños de infraestructura vial – seis (06)

INDICADOR: Estudios y diseños de infraestructura vial elaborado.

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 155'000.000,00, de recursos ordinarios, de los cuales no ha comprometido ningún recurso en el primer semestre de 2022 **siendo su ejecución del 0,00 % (EFICIENCIA)**

EVIDNCIA: Como evidencia la secretaria presenta los Estudios Previos y Pliego de condiciones a la secretaria Jurídica y de Contratación a la "Consultoría para la evaluación del riesgo, estabilización y complementarias estudios y diseños de puentes en el departamento del Quindío" para los puentes La Sonadora sobre la vía La Rochela – Quebrada negra del municipio de Calarcá y La Soledad sobre el Río Verde en el municipio de Córdoba.



Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo
..			Disco lt
ESTUDIOS DEL SECTOR.pdf	2.463.097	2.463.097	Chrom
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	2.490.963	2.490.963	Chrom
Pliego de condiciones: Definitivo Documento Base D.T Consul...	6.361.531	6.361.531	Chrom

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 46

**Avance del 0,00% (EFICACIA)**

OBSERVACIONES DE LA OCIG: Esta Meta contempla cinco (5) Estudios y diseños para la vigencia 2022, al término del primer semestre de 2022 la Secretaria de Aguas e Infraestructura solo ha presentado los estudios previos, estudios del sector y Pliegos de condición para la contratación de la consultoría para diferentes puentes en el departamento del Quindío.

**Programa: Ordenamiento Ambiental Territorial. "Tú y yo planificamos con sentido ambiental"**

**BPIN-2021003630-004**

**Código 3205010**

Meta: Obras para estabilización de taludes realizadas – Cuatro (04)

INDICADOR: Obras para estabilización de taludes realizadas

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 2.014'285.000,00, de recursos ordinarios, superávit y sobretasa ACPM, de los cuales ha comprometido en el primer semestre del 2022 \$ 1.046'396.689,44 siendo su ejecución **del 52,00 % siendo esta su EFICIENCIA**

**EVIDENCIAS:**

Para la Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de estabilización de Taludes en el Departamento del Quindío se realizó ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 047 DE 2019 PARA LA CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA BANCA VÍA LA ESPAÑOLA - RIO VERDE - BARRAGAN, CÓDIGO 40QNO4-1, SECTOR TARAPACA, MUNICIPIO DE CALARCÁ, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, por valor de \$839'483.749,44

Está en trámite final convenio con Proyecta para el Contrato Barragán- Génova

Se encuentran en revisión final los estudios previos de Obras para estabilización de taludes en los siguientes puntos:

- Muro de contención Picota 1 y Picota 2 para la estabilización de taludes
- Muro de contención Cócora para la estabilización de taludes.

Igualmente presenta como evidencia la remoción de derrumbes en las vías del departamento del Quindío en el primer semestre.

**Avance 45,00% EFICACIA**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 19 de 46

**OBSERVACIONES DE LA OCIG:**

Las evidencias presentadas por la SAI, para esta Meta es apenas los Estudios Previos para la Consultoría de la estabilización de taludes en vías del Departamento el Indicador de la Meta es la de Obras para estabilización de taludes realizadas y en el primer semestre de la vigencia 2022, no se ha adelantado ninguna obra apenas se encuentra en contratación.

**Programa: Ordenamiento Ambiental Territorial. "Tú y yo planificamos con sentido ambiental"**

**BPIN-2021000363-0002**

**Código 3505021**

Meta: Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres.

INDICADOR: Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$1.251.472.133,72,00, de recursos ordinarios, recursos el superávit, y sobretasa al ACPM, de los cuales comprometió en el primer semestre de la vigencia 2022 \$ 194.103.979,00 siendo su ejecución **del 16,00 % siendo esta su EFICIENCIA**

**EVIDENCIAS:**

Para la construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de infraestructura para la mitigación y atención de desastres en los municipios del departamento del Quindío, se está ejecutando por Proyecto mediante regalías en etapa de pólizas y firma de acta de inicio de los procesos de:

**OBRAS DE REHABILITACIÓN DE BANCA EN 9 PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA QUE INTERCOMUNICA A GÉNOVA CON LA VÍA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CAICEDONIA EN EL NORTE DEL VALLE Y LOS MUNICIPIOS CORDILLERANOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Contrato 017 de 2022 en ejecución.**

Además, se están realizando visitas de inspección para priorizar puntos a intervenir.

Se realizó la atención de derrumbes para un total de 338 metros cúbicos de material removido en el departamento.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 20 de 46

MUNICIPIOS	INTERVENCION KM	
	ENERO	OBSERVACIONES
ARMENIA		No se intervino en este mes porque el contrato de los contratistas no salió sino hasta el 21 de enero
BUENAVISTA		
CALARCA		
CIRCASIA		
CORDOBA		
FILANDIA		
GENOVA		
LA TEBAIDA		
MONTENEGRO		
PIJAO		
QUIMBAYA	105	
SALENTO		



MUNICIPIOS	INTERVENCION KM	
	FEBRERO M3	OBSERVACIONES
ARMENIA		
BUENAVISTA	35	
CALARCA	105	
CIRCASIA	28	
CORDOBA		
FILANDIA		
GENOVA		
LA TEBAIDA	18	
MONTENEGRO		
PIJAO		
QUIMBAYA	42	
SALENTO	21	



MUNICIPIOS	INTERVENCION KM	
	MARZO M3	OBSERVACIONES
ARMENIA		
BUENAVISTA		
CALARCA	24	
CIRCASIA	42	
CORDOBA		
FILANDIA	25	
GENOVA		
LA TEBAIDA		
MONTENEGRO	35	





PIJAO		
QUIMBAYA	15	
SALENTO		

MUNICIPIOS	INTERVENCION KM	
	ABRIL M3	OBSERVACIONES
ARMENIA		
BUENAVISTA		
CALARCA		
CIRCASIA	21	
CORDOBA		
FILANDIA		
GENOVA		
LA TEBAIDA		
MONTENEGRO	56	
PIJAO		
QUIMBAYA	63	
SALENTO	24	



MUNICIPIOS	INTERVENCION KM	
	MAYO M3	OBSERVACIONES
ARMENIA		
BUENAVISTA		
CALARCA		
CIRCASIA	35	
CORDOBA		
FILANDIA		
GENOVA		
LA TEBAIDA		
MONTENEGRO	28	
PIJAO		
QUIMBAYA	42	
SALENTO	14	



MUNICIPIOS	INTERVENCION KM	
	JUNIO M3	OBSERVACIONES
ARMENIA		
BUENAVISTA		
CALARCA		
CIRCACIA	11	
CORDOBA		
FILANDIA		
GENOVA		
LA TEBAIDA		



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 22 de 46

MONTENEGRO	16	
PIJAO		
QUIMBAYA	5	
SALENTO	24	

### Avance 0,00% EFICACIA

#### OBSERVACIONES DE OCIG:

Presenta las mismas evidencias para la Meta 3205010, en esta evidencia tomamos las intervenciones realizadas en la atención de desastres remoción de taludes.

**Programa: Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo con vivienda digna"**

**BPIN-202000363-0057**

**Código - 4001015**

Meta: Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas – 166 –viviendas

INDICADOR: Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 380'000.000,00, recursos ordinarios y recursos de la estampilla pro-desarrollo, de los cuales no ha comprometido ningún recurso en el primer semestre de la vigencia 2022, **para un 0,00 % (EFICIENCIA)**

EVIDENCIAS: Se encuentra en proceso de estructuración convenio con Proyecta para la intervención de las viviendas.

### Con un avance del 0,00 % en su EFICACIA

OBSERVACIONES OCIG: Para el cumplimiento la SAI para el cuatrienio tiene una Meta de 300 Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas, y para la vigencia de 2022 tiene una Meta de ciento sesenta y seis (166), y como evidencia una página del convenio interadministrativo suscrito con Proyecta para el Mejoramiento de Viviendas urbanas y rurales en saneamiento básico en el departamento del Quindío, por valor de \$ 240'000.000,00 de los cuales tanto el departamento del Quindío como Proyecta aporran cada uno \$ 120'000.000,00, convenio que tiene un plazo de ejecución de seis meses a partir del enero de 2022.

## ESTRATEGIA 3. TERRITRIO, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENEBLE



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 23 de 46

## Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico. "Tú y yo con calidad del agua"

**Programa: Implementación del plan departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento básico en el Departamento del Quindío**

**BPIN-202000363-0014**

**Código 4003018**

Meta: Alcantarillados construidos

INDICADOR: Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas – UNA (01)

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación para la vigencia 2022 de \$ 515'110.811,00, recursos del Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico de los cuales comprometió recursos por \$ 515'110.811,00 **siendo su EFICIENCIA DEL 100,00%**

### EVIDENCIAS:

En el marco de cooperación y apoyo financiero suscrito con el MVCT, se expidieron el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP, con el fin dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable a través del giro de los recursos al Patrimonio Autónomo FIA. El proyecto que se ejecutará se denomina "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO LA 18, MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO".

Igualmente presenta como evidencia oficio del 16 de junio de 2022 del PDA a la Secretaría Jurídica y de Contratación con el cual hace entrega de los documentos pre-contractuales para el inicio del proceso de contratación de la obra en mención.



**Siendo su EFICACIA del 0,00%**

OBSERVACIONES OCIG: La SAI a través del Plan Departamental de Aguas debe tener en cuenta los compromisos adquiridos en la Consultoría realizada en la vigencia anterior con el fin de darle cumplimiento al Plan aprobado por parte del MVCT (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio) y a la CRQ (Corporación Autónoma Regional del Quindío), además que el Indicador señala Plantas de Aguas Residuales construidas, y éstas apenas se encuentra en proceso de contratación, esperando que para el segundo semestre se dé cumplimiento a la Meta.

**CODIGO-4003025**

Meta: Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado – cuatro (04)

INDICADOR: Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 2.159'194.728,80, recursos del Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico, superávit del SGP y estampilla pro-desarrollo, recursos superávit de la estampilla pro-desarrollo, de los cuales ha comprometido en el primer semestre del 2022 \$1.316'048.136,00 **siendo su avance de un 60,95% (EFICIENCIA)**

27	515.110.811,00	515.110.811,00	515.110.811,00
27	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
04	900.000.000,00	402.472.225,66	68.226.090,00
90	664.789,80	-	-
82	443.419.128,00	443.419.128,00	432.711.235,00

EVIDENCIAS: La Secretaria de Aguas e Infraestructura en el marco de cooperación y apoyo financiero en cumplimiento del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable suscrito con el CONSORCIO FIA, se transfirieron los recursos al Patrimonio Autónomo FIA, referentes al SGP Agua Potable y Saneamiento Básico.

Se financiaron 2 proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 25 de 46

- \* OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LA TEBADA.
- \* OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SALENTO.

Están en proceso precontractual y publicados en el SECOP-II los siguientes proyectos:

- \* Optimización de redes de alcantarillado en el barrio Sueños de Libertad en el municipio de Filandia
- \* Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Montenegro.

Se encuentra en elaboración de estudios previos el proyecto:

- \* Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Génova

Igualmente, suscribió tres Contratos así:

1. Contrato de Consultoría No 001 del 07 de febrero de 2022 “Estudios y diseños para la optimización de la línea de aducción y conducción del sistema de acueducto del municipio de La Tebaida – departamento del Quindío”
2. Contrato de Consultoría No 005 del 24 de mayo de 2022 “Interventoría a los estudios y diseños para la optimización de la línea de aducción y conducción del sistema de acueducto del municipio de La Tebaida – departamento del Quindío”
3. Contrato de Obra No 003 de 2022 “Optimización de Redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de La Tebaida – departamento del Quindío”



Nombre	Tamaño	Comprimado	Tipo
ACTA DE INICIO consultoria 001 2022 (2).pdf	539.590	559.920	Clase
ACTA DE INICIO consultoria 005 2022 (1).pdf	544.156	544.156	Clase
Acta de obra # 2 CIG 003 de 2022.pdf	2.284.727	2.284.727	Clase
Acta de supervisión 2 CIG 003 de 2022.pdf	1.531.854	1.511.864	Clase

### Presenta un avance del 33,00% en su EFICACIA

OBSERVACIONES OCIG: De acuerdo con la información aportada por el PDA, se evidencia el cumplimiento de la Meta para el primer semestre de la vigencia 2022 en un 33%, pues la meta contempla seis proyectos, y en la actualidad solo se encuentran en ejecución dos, y los demás apenas se están realizando los estudios porque solo cumplieron con 2 de los 6 proyectos que deben realizar en la vigencia 2022, queremos manifestar que el PDA cuenta con el personal idóneo y capacitado para alcanzar el cumplimiento de la Meta.

**Código – 4003026**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 26 de 46

Meta: Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales – uno (01)


Indicador: Proyecto de acueducto y de manejo de aguas residuales en áreas rurales financiadas

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 1.116'812.797,00, recursos del Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico de los cuales se transfirieron los recursos al Patrimonio Autónomo FIA, referentes al SGP Agua Potable y Saneamiento Básico, **siendo su avance de un 100,00% (EFICIENCIA)**

EVIDENCIAS: A través del Plan Departamental de Aguas, nos evidencia En el marco de cooperación y apoyo financiero en cumplimiento del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable suscrito con el CONSORCIO FIA, se transfirieron los recursos al Patrimonio Autónomo FIA, referentes al SGP Agua Potable y Saneamiento Básico; El DNP definió las doceavas para la vigencia 2022 mediante el documento de distribución SGP el día 25 de febrero del presente. Se está realizando el trámite para suscribir el anexo 3 mediante el cual se giran los recursos, en el marco del contrato del PDA.

El Plan Departamental de Aguas- PDA, evidencia en el cumplimiento de ésta Meta en el primer semestre de 2022, anexando, los siguientes documentos aprobados para el proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, RESGUARDO INDÍGENA DACHI AGORE DRUA, MUNICIPIO DE CALARCÁ", por valor de \$ 1.012'377.812.797 00

1. Oficio del 28-06-2022 Concepto Revisión Proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, RESGUARDO INDÍGENA DACHI AGORE DRUA, MUNICIPIO DE CALARCÁ"
2. LISTA DE CHEQUEO PROYECTOS DE INVERSIÓN - VENTANILLA ÚNICA REGIONA, del 28-06-2022
3. Acta del comité Técnico Departamental de Proyectos, aprobada en julio de 2022



Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo
Acta viabilidad dachi.pdf	713.606	713.606	Chrom
Concepto Viabilidad AGORE DRUA2.pdf	215.249	215.249	Chrom
Oficio viabilidad DACHI.pdf	357.015	357.015	Chrom

Siendo su **EFICACIA DEL 50%**



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 27 de 46

OBSERVACIONES OCIG: De acuerdo con la información aportada por el PDA, se evidencia el cumplimiento de la Meta para el primer semestre de la vigencia 2022, con el concepto favorable, y el Acta del comité Técnico departamental de Proyectos y la asignación de recursos,

**Código – 4003028**

Meta: Servicios de educación informal en agua potable y saneamiento básico – cuatro (04)

INDICADOR: Eventos de educación informal en agua y saneamiento básico realizados

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 185'000.000,00, recursos del Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico de los cuales ha comprometido en el primer semestre de la vigencia 2022 la totalidad de los recursos, **siendo su avance de un 100,00% (EFICIENCIA)**

EVIDENCIAS:

El Plan Departamental de Aguas – PDA nos aporta como evidencias el Plan de Gestión Social del Quindío 2022 en el cual anexan los eventos realizados durante el primer semestre de 2022, Entre otros:

7 de enero: Capacitación UEAA  
Batallón de Alta montaña



24 de febrero:  
Encuentros PDA Génova





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 28 de 46


22 de marzo: Día mundial del Agua  
Armenia



Montenegro



23 marzo: Celebración día del Agua, IE Hojas Anchas de Circasia

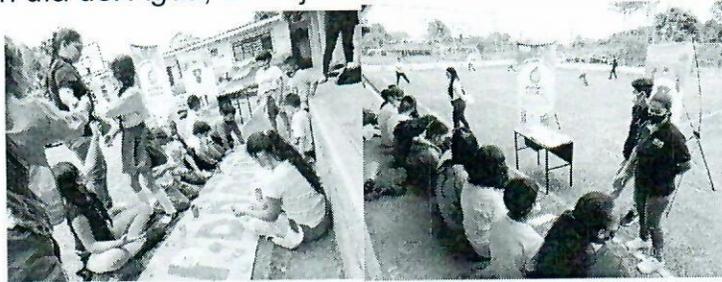

21 de abril:

Acompañamiento a la burbuja ambiental del Eje Cafetero en Risaralda



22 de abril: siembra día de la tierra Armenia



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 29 de 46



29 de abril: Día del Árbol en Armenia



7 de mayo: stand reactivación económica en Montenegro



18 de mayo: Celebración día del reciclaje - Armenia





La Tebaida



19 de mayo: - Encuentros PDA Buenavista



21 de mayo: Capacitación UEAA en la fundación Imagina de Armenia.



24 de mayo: - Encuentros PDA Córdoba y La Tebaida





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 31 de 46

1 Junio: Jornada ambiental San José Fachadas de Filandia



C.O 002 DE 2022 - SOCIALIZACIÓN INICIAL



SOCIALIZACIÓN 50% DE EJECUCIÓN



SOCIALIZACIÓN FINAL





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 32 de 46

- **C.O 003 DE 2022 - SOCIALIZACIÓN INICIAL**



**SOCIALIZACIÓN 50% DE EJECUCIÓN**



**SOCIALIZACIÓN FINAL**



- **C.O 010 DE 2021 - SOCIALIZACIÓN INICIAL**



- C.O 013 DE 2021 - SOCIALIZACIÓN FINAL



- C.CONULTORIA 021 DE 2019 - SOCIALIZACIÓN INICIAL



- C.O 002 DE 2022 - RECORRIDO RUTA SALUDABLE INICIAL



RECORRIDO RUTA SALUDABLE 50% DE EJECUCIÓN



FORMATO

Código: F-CIG-03


Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 34 de 46



### RECORRIDO RUTA SALUDABLE FINAL

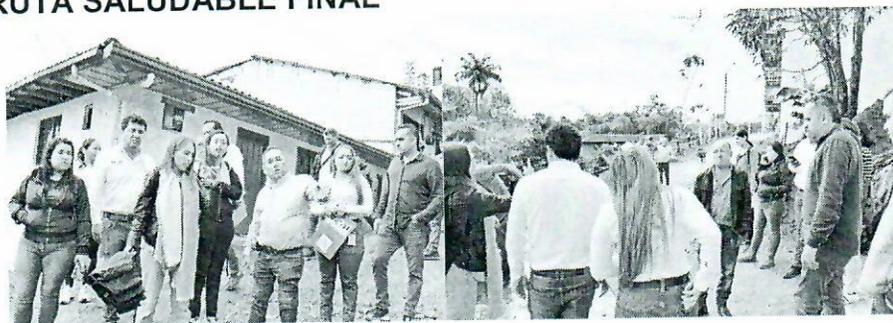

- C.O 003 DE 2022 - RECORRIDO RUTA SALUDABLE INICIAL



### RECORRIDO RUTA SALUDABLE 50% DE EJECUCIÓN



### RECORRIDO RUTA SALUDABLE FINAL



- **C.O 010 DE 2021 - RECORRIDO RUTA SALUDABLE INICIAL**



- **C.O 002 DE 2022**



- **C.O 003 DE 2022**





- **C.O 010 DE 2022**



- **C.O 004 DE 2022**



- **MESA DE CONCERTACIÓN CON LAS 3 COMUNIDADES INDIGENAS, LA AUTORIDAD AMBIENTAL CRQ Y EL PDA**



- **MAQUETA DEL SISTEMA A IMPLIMENTAR EN LAS 3 COMUNIDADES INDIGENAS, ELABORADA POR ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA**





- MESA DE CONCERTACIÓN CON GOBERNADOR DEL QUINDIO, EL VICEMINISTERIO DEL INTERIOR, UNIDAD DE VICTIMAS, AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, COMUNIDADES INDIGENAS, CRQ Y EL PDA.



- Encuentros PDA Buenavista



Encuentros PDA Pijao



Encuentros PDA Córdoba





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 38 de 46

### Encuentros PDA Salento




### Encuentros PDA La Tebaida



### Entrega STARD La Silvia de La Tebaida



### Socialización Política pública de Aseo (Alcaldes)

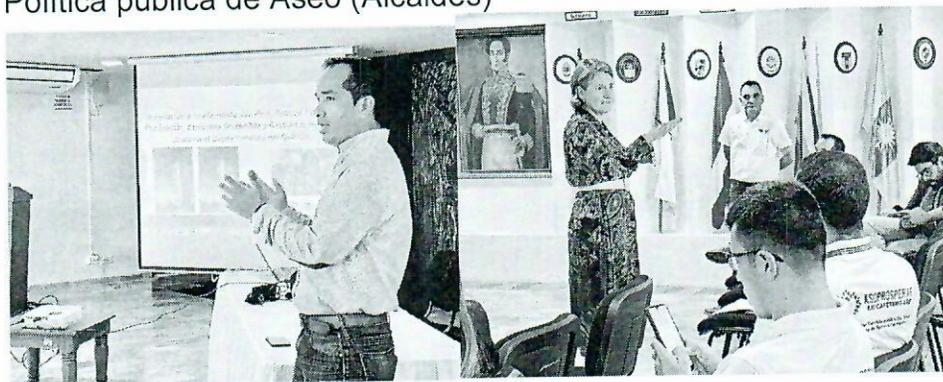

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 39 de 46

**Con un avance del 100,00% en su EFICACIA**

**Código – 4003042**

Meta: Estudios de pre inversión e inversión – tres (03)

INDICADOR: Estudios o diseños realizados

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 650'000.00,00, recursos del Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico de los cuales, En el cumplimiento del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable suscrito con el CONSORCIO FIA, se transfirieron los recursos al Patrimonio Autónomo FIA, **siendo su avance de un 100,00% (EFICIENCIA)**

EVIDENCIAS: La dirección del Plan departamental de Aguas de la SAI, nos presenta como evidencias para el primer semestre de 2022 para el cumplimiento de esta Meta lo siguiente:

El DNP definió las doceavas para la vigencia 2022 mediante el documento de distribución SGP el día 25 de febrero del presente. Se está realizando el trámite para suscribir el anexo 3 mediante el cual se giran los recursos, en el marco del contrato del PDA.

CONTRATO DE CONSULTORIA NÚMERO 01 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Y CONSORCIO DISEÑOS I.N.J  
OBJETO "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO NIT: 890001639-1

CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS I.N.J NIT: 901561972 9 REPRESENTANTE LEGAL NELSON JAVIER LARA GUALTEROS CC. 79.460.484

VALOR CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON TRES CENTAVOS (\$176.727.930,03) INCLUIDOS IMPUESTOS

DIRECCIÓN Corregimiento el Caimo, Conjunto residencial el bosque casa 29 TELEFONO 3148251783 PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución del contrato será de CUATRO (4) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio

**Con un avance del 0,00% en su EFICACIA**

OBSERVACIONES DE LA OCIG: El anterior contrato de Consultoría presentado por el Plan Departamental de Aguas, a 30 de junio de 2022, no se había comenzado su ejecución como queda demostrado en los documentos anexos, y la Meta es muy clara que son Estudios o

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 40 de 46

Diseños realizados, por lo cual es importante que se encuentre al menos contratado uno de los tres estudios o diseños para la presente vigencia, y debe contratar y/o realizar Estudios o diseños de otros dos proyectos en la vigencia 2022, dentro de las evidencias colocan otro proyecto pero corresponde a un contrato de 2019.

**Código – 4003006**

Meta: Documentos de planeación.

INDICADOR: Documentos de planeación elaborados

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$100'000.0000,00, recursos del Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico de los cuales en el marco de cooperación y apoyo financiero en cumplimiento del Contrato de Fiducia Mercantil irrevocable suscrito con el CONSORCIO FIA, se transfirieron los recursos al Patrimonio Autónomo FIA, referentes al SGP Agua Potable y Saneamiento Básico para la implementación de la política una vez aprobada, **siendo su avance de un 100,00% (EFICIENCIA)**

**EVIDENCIAS:**

El DNP definió las doceavas para la vigencia 2022 mediante el documento de distribución SGP el día 25 de febrero del presente. Se está realizando el trámite para suscribir el anexo 3 mediante el cual se giran los recursos, en el marco del contrato del PDA.

Pero no presenta ningún documento de Planeación elaborado, ni de haber empezado alguna acción para el cumplimiento de la Meta

**Siendo su EFICACIA DEL 0,00%**

OBSERVACIONES OCIG: Dejamos constancia que el Plan Departamental de Aguas – Secretaría de Aguas e Infraestructura no presenta evidencias al cumplimiento de la Meta

**ESTRATEGIA 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA**

**Programa: Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional. "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "**

**BPIN-202000363-0058**

**Código – 4599016**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 41 de 46

Meta: Infraestructura Institucional o de Edificios Públicos de atención de servicios ciudadanos con procesos constructivos y/o mejorados y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados – cuatro (04)

INDICADOR: Infraestructura Institucional o Edificios Públicos construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, Y/o Reforzada

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$126'660.648,00, recursos ordinarios y recursos del superávit, de los cuales comprometió en el primer semestre de la vigencia 2022 \$27'200.000,00 para **una ejecución del 26,00% siendo ésa su EFICACIA**

EVIDENCIAS: La Secretaría de Aguas e Infraestructura presenta como evidencia para el primer semestre de la vigencia 2022 la siguiente información:

Se realizó mantenimiento y mejoramiento a 1 infraestructuras institucionales o de edificios públicos en el Departamento del Quindío:

1. Edificio Centro Administrativo Departamental- Gobernación: Se realizaron intervenciones menores en los Pisos 18, Piso 1, Piso 5 y Parqueadero con proceso de ferretería y personal de la secretaria.

También se realizaron las siguientes actividades:

- Visita técnica a las instalaciones del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío como insumo para la elaboración de presupuesto y elaboración de estudios previos.

Se va realizar intervención con personal de la secretaria y proceso de ferretería los siguientes edificios públicos:

- Centro de convenciones
- Indeportes
- Laboratorio de Salud Pública
- Edificio de la Gobernación – Pasaportes

**Con un avance del 25,00% en su Eficacia**

OBSERVACIONES DE LA OCIG: Para esta Meta la secretaria de Aguas Infraestructura como Indicador de la Infraestructura Institucional o Edificios Públicos construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, Y/o Reforzada, cuatro (4) obras de las cuales evidencia la ejecución de tres proyectos, y el Indicador nos determina cuatro (4) Sedes Intervenido.

**Construcción y/o adecuación de casetas comunales en los diferentes barrios del departamento**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 42 de 46

**BPIN-202000363-0059**  
**Código – 4502003**

Meta: Salones comunales adecuados – dos (02)

INDICADOR: Salones comunales adecuados

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$38'000.000,00, recursos ordinarios, de los cuales no ha comprometido ningún recurso en el primer semestre de la vigencia 20222 con **un avance de un 0,00% siendo esta su EFICACIA**

**EVIDENCIAS:**

La Secretaría de Aguas e Infraestructura NO presenta evidencias del cumplimiento de la Meta para la vigencia 2022:

Para la adecuación de salones comunales, se realizaron tres visitas:

- Visita técnica al salón comunal Clementina López del municipio de Quimbaya
- Visita técnica al salón comunal Javier Vaquero del municipio de Córdoba
- Visita técnica al salón comunal Villa Laura del municipio de Quimbaya; esto como insumo para la elaboración de presupuesto y elaboración de estudios previos.

Se van a realizar intervenciones con el proceso de ferretería y personal de la secretaria a:

- Caseta comunal La Nubia del municipio de Salento
- Caseta La Española municipio de Circasia

**Para una EFICACIA del 0,00%**

**OBSERVACIONES OCIG:**

La SAI NO presenta avance en el cumplimiento de esta Meta en el primer semestre de la vigencia 2022, la cual es la de adecuar dos salones comunales, y nos presentan evidencias de visitas técnicas con el fin de adelantar las adecuaciones a realizar en varios salones de los municipios del departamento

**EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION A LOS  
 COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.**

El análisis a las áreas de la Secretaria de Aguas e Infraestructura Vial, Social, PDA (Plan Departamental de Aguas) y al grupo técnico de la Secretaria, teniendo como referentes el

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 43 de 46

cumplimiento misional de la entidad y la satisfacción de las necesidades de la comunidad, en lo referente a garantizar una infraestructura adecuada.

Con el resultado de las evidencias aportadas, y analizadas por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión con la relación al cumplimiento de las metas de la Secretaría dentro del Plan de Acción del Departamento del Quindío de acuerdo con el Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 2020-2023, la relación de las metas producto verificadas y las cuales fueron solicitadas por la Oficina de Control Interno mediante Circular No S.A. 60.07.01-000691 del 05 de julio de 2022 y Evidencias aportadas por la Secretaría de Aguas e Infraestructura por correo institucional oficio S.A.I.80.145.01-01240 de 19 de julio de 2022 y correo electrónico de evidencias de cumplimiento a las Metas producto, y el Anexo No 07 de la Secretaría de Aguas e Infraestructura con corte al 31-06-2022, para el cumplimiento de la totalidad del Plan de Desarrollo, se solicita por parte de la Oficina de control Interno para que la Secretaría de Aguas e Infraestructura, aporte toda la información detallada de cada una de las Metas relacionadas con el fin de que la evaluación al Plan de Desarrollo muestre un avance lo más acertado de las Metas asignadas a la secretaría en el primer semestre de la vigencia 2022,

**DEBILIDADES:**

La baja ejecución y la falta de compromiso de la secretaría en el cumplimiento y ejecución de las metas del Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020 – 2023, para la vigencia 2022 primer semestre en especial las metas asignadas a la División Social.

**FORTALEZAS:**

La Secretaria de Aguas e Infraestructura cuenta con un buen equipo de profesionales para el cumplimiento de sus metas, igualmente una asignación de unos muy buenos recursos para dar cumplimiento a cada una de las Metas para la vigencia del Plan de Desarrollo.

**RECOMENDACIONES:**

La Oficina de Control Interno de Gestión, solicita a la Secretaría de Aguas e Infraestructura realizar Mesas de trabajo con todos los actores que intervienen en la ejecución de las Metas, para que se revise el Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 2020 - 2023, que implementó el Gobierno Departamental para que en la vigencia 2022 y en especial ya para el segundo semestre se cumplan las Metas que están programadas para la vigencia 2022, igualmente revisar las Metas al corte de los dos primeros años que se encuentran con porcentajes muy bajo en su avance tanto en su eficacia como en su Eficacia. Se tienen varios estudios realizados y varios proyectos con estudios previos para su contratación con el fin de ser ejecutados en el segundo semestre de 2022

Igualmente, revisar las Metas que quedaron acumuladas de las vigencias 2020 y 2021 con el fin de dar cumplimiento a dicho Plan y no dejar acumular más actividades sin cumplimiento para el último año (2023), igualmente analizar las Metas de las cuales no se ejecutó tanto la meta

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 44 de 46

física como la meta presupuestal, igual en las metas en las cuales la ejecución presupuestal difiere bastante del cumplimiento físico de la meta.

La Oficina de control Interno, de acuerdo con el seguimiento al cumplimiento al Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 202 – 2023, para la vigencia 2022, analiza el bajo nivel de cumplimiento tanto en la EFICIENCIA COMO EN LA EFICACIA, a las metas asignadas para la vigencia, pues su cumplimiento en cuanto a la EFICACIA ALCANZA SOLO EL 29 %, es decir de los recursos asignados sólo comprometió algo más de una cuarta parte de ellos, y si analizamos la ejecución material de las 22 Metas solo una (1) se cumplió al 100 %, cuatro (4) presentan algún avance y las diecisiete (17) restantes presentan un avance supremamente bajo inclusive en 0% en su ejecución

De igual manera tenemos metas que se encuentran acumuladas de las vigencias 2020 y 2021 y que aún siguen sin avance e incluso sin empezar su ejecución.

La OCIG, reitera que proyecto 2021003630018-1709065 "Adecuación de Plantas de Tratamiento de Beneficio Animal adecuadas", no se pueden invertir recursos debido a que el Departamento del Quindío se acogió al Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal en el año 2012 mediante Resolución 740, y en el año 2017 las únicas plantas que no estaban en el Plan de Racionalización las cerraron como son los municipios de Génova, Filandia y La Tebaida.

#### OBSERVACIONES FINALES

Igualmente queremos destacar que la Secretaría de Aguas e Infraestructura tuvo una asignación de Recursos para la Vigencia 2021, para cumplir con las Metas del Plan de Desarrollo:

	PRESUPUESTO	PORCENTAJE
<b>Asignado</b>	<b>\$ 35.792'134.437,00</b>	
<b>Comprometido</b>	<b>\$ 10.552'275.473,00</b>	<b>29,00 % Eficacia</b>
<b>Saldo disponible</b>	<b>\$ 25.235'858.964,00</b>	

De carácter Informativo tenemos un resumen de cada una de las Metas en cuanto a Eficiencia y Eficacia, el cual le servirá a la Secretaría de Aguas e Infraestructura, para Planear la ejecución del Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" para el año 2021



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 45 de 46

No	META	EFICIENCIA %	EFICACIA %
1	Infraestructura de las Instituciones de Seguridad del Estado construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	3	0
2	Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados realizados	95	0
3	Infraestructura de Instituciones Educativas construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada.	21	33
4	Infraestructura cultural intervenida	17	0
5	Centros de atención integral para personas con Discapacidad construidos y dotados	0	0
6	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva.	14	10
7	Plantas de beneficio animal adecuadas	9	0
8	Plazas de mercado adecuadas	29	0
9	Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	23	3
10	Infraestructura en puentes construida, mejorada, ampliada, mantenida y/o reforzada	2	0
11	Estudios y diseños de infraestructura vial elaborado	0	0
12	Obras para estabilización de taludes realizada	52	45
13	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas	16	0
14	Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas	0	0
15	Infraestructura Institucional o edificios públicos construida mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	26	25
16	Salones comunales adecuados	0	0
17	Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas	100	0
18	Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados	61	33
19	Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados	100	50
20	Eventos de educación informal en agua y saneamiento básico realizados	100	100
21	Estudios o diseños realizados	100	0
22	Política Pública de Producción Consumo Sostenible y Gestión Integral de Aseo adoptada e implementada.	100	0

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	EFICIENCIA		EFICACIA	
VERDE OSCURO	80-100	6	27%	1	5%
VERDE CLARO	70-79	0	0%	0	0%
AMARILLO	60-69	1	5%	0	0%
NARANJA	40-59	1	5%	2	9%
ROJO	0-39	14	63%	19	86%
<b>TOTAL</b>		<b>22</b>		<b>22</b>	<b>100%</b>


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
	Página 46 de 46	

Teniendo en cuenta a la evaluación al Plan de Acción de la Secretaría de Aguas e Infraestructura para el primer semestre de la vigencia 2022, presentamos el avance a cada una de ellas tanto en su Eficiencia como en su Eficacia, la evaluación está realizada de acuerdo con las evidencias aportadas por la Secretaría en mención a la ejecución Metas Producto – Plan de Desarrollo “Tu y Yo Somos Quindío” 2020 – 2023 de la Secretaría de Aguas e Infraestructura con corte a 30-06-2022

Nº	EVIDENCIAS Y ANEXOS
	Circular No S.A.60.07.01-00691 del 05 de julio de 2022 en la cual se solicitan las evidencias a las Secretarías para el seguimiento al Plan de Acción para el primer semestre de la vigencia 2022.
	Oficio SAI.80.145.01-01240 de julio 19 de 2022 enviado por internet con evidencias en el DRIVE.
	Anexo F-PLA-47, F-PLA-46

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguimiento al Plan de Acción para el Segundo Semestre de la Vigencia 2022	Enero de 2023	Secretario de Aguas e Infraestructura – director Vial – Social y Director Plan Departamental de Aguas	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN
Armenia – Quindío julio de 2022

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
HERNAN GALLEGO CANO	Auditor – Contratista OCIG	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG
