
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 15


GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN					
DIRECCIÓN TÉCNICA					
ACTA NÚMERO: 04					
FECHA:	21 de septiembre de 2021	HORA DE INICIO:	2:30 p.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	3:45 p.m.
LUGAR:	Secretaría de Planeación				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	X	NO	
<p>OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Dar a conocer a los integrantes del Comité de Regalías el Índice de Ejecución de los Proyectos del Sistema General de Regalías SGR, las alertas de los proyectos en el GESPROY y el estado de avance de tres proyectos del SGR de competencia de las Secretarías de Educación, Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Aguas e Infraestructura, con el propósito de establecer Acciones de Mejora en caso de aplicar.</p>					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación	Secretaría de Planeación
2	Julián Mauricio Jara Morales	Secretario Jurídico y de Contratación	Secretaría de Jurídica y de Contratación
3	Gilberto Gutiérrez Caro	Secretario de Aguas e Infraestructura	Secretaría de Aguas e Infraestructura
4	Liliana María Sánchez Villada	Secretaria de Educación	Secretaría de Educación
5	Miguel Ángel Mejía Díaz	Director de Desarrollo Rural Sostenible	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
6	Luis Felipe Zuluaga	Director Vial	Secretaría de Aguas e Infraestructura
7	Lina Marcela Vélez	Dirección de análisis Financiero y Administrativo	Oficina Privada


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 15

8	Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica	Secretaría de Planeación
9	Juan José Jaramillo	Asesor	Federación Nacional de Departamentos
10	Nancy Castrillón Alzate	Contratista	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
11	Luisa Fernanda Guevara Osorio	Contratista	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
12	Juan Sebastián Albarracín	Contratista	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
13	Sebastián López Cárdenas	Contratista	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
14	Carlos Enrique Penagos Mejía	Contratista	Secretaría de Aguas e Infraestructura
15	Juan Pablo Bernal Cardona	Contratista	Secretaría de Hacienda
16	Johana Suarez Montejo	Contratista	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
17	Ana Milena Carmona Manjarrés	Contratista	Secretaría de Planeación

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación del quórum y poder votante	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación
2	Objeto de la reunión	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación
3	Importancia de la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías – Índice de ejecución de proyectos del Sistema General – Alertas GESPROY.	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 15

4	Seguimiento y evaluación proyectos de inversión	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación Martha Elena Giraldo Ramírez Directora Técnica Secretaria de Planeación
4.1	Secretaría de Educación: Implementación del programa integral de bilingüismo "Quindío Bilingüe y Competitivo" en el departamento del Quindío.	
4.1.1	Estado de ejecución del proyecto a cargo de la Secretaría de Planeación vigencia 2020-2021	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación Martha Elena Giraldo Ramírez Directora Técnica Secretaría de Planeación
4.1.2	Informe de la Secretaría de Educación a cargo de la ejecución del proyecto: - Ejecutorias en términos de contratación 2020-2021 - Avances proceso contratación y ejecución - Cuellos de botella - Compromisos	Liliana María Sánchez Villada Secretaría de Educación
4.2	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente: Implementación de acciones de adaptación etapa I del Plan de Gestión Integral de Cambio Climático (PIGCC) en el Departamento del Quindío	
4.2.1	Estado de ejecución del proyecto a cargo de la Secretaría de Planeación vigencia 2020-2021	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación Martha Elena Giraldo Ramírez Directora Técnica Secretaría de Planeación
4.2.2	Informe de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente a cargo de la ejecución del proyecto: - Ejecutorias en términos de contratación 2020-2021 - Avances proceso contratación y ejecución - Cuellos de botella - Compromisos	Miguel Ángel Mejía Díaz Director de Desarrollo Rural Sostenible
4.3	Secretaría de Aguas e Infraestructura: Construcción de obras de estabilización y rehabilitación de la vía río verde - Pijao (cód 40QN03), estabilización de la vía Córdoba - Carniceros (cód 40Q09), Municipios de Pijao, Buenavista y Córdoba en el	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 15

Departamento del Quindío		
4.3.1	Estado de ejecución del proyecto a cargo de la Secretaría de Planeación vigencia 2020-2021	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación Martha Elena Giraldo Ramírez Directora Técnica Secretaría de Planeación
4.3.2	Informe de la Secretaría de Aguas e Infraestructura a cargo de la ejecución del proyecto: <ul style="list-style-type: none"> - Ejecutorias en términos de contratación 2020-2021 - Avances proceso contratación y ejecución - Cuellos de botella - Compromisos 	Gilberto Gutiérrez Caro Secretario de Aguas e Infraestructura Luis Felipe Zuluaga Director Vial Carlos Enrique Penagos Mejía Contratista
5	Proposiciones y varios	
6	Cierre de la reunión	

DESARROLLO TEMATICO

1. Verificación del quórum y poder votante:


Se inicia el Comité Técnico con la presentación del orden del día así:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum y poder votante
2. Objeto de la reunión
3. Importancia de la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías – Índice de ejecución de proyectos del Sistema General – Alertas GESPROY.
4. Seguimiento y evaluación proyectos de inversión
- 4.1 Secretaría de Educación: **Implementación del programa integral de bilingüismo "Quindío Bilingüe y Competitivo" en el departamento del Quindío.**
 - 4.1.1 Estado de ejecución del proyecto a cargo de la Secretaría de Planeación vigencia 2020-2021

ORDEN DEL DÍA

- 4.1.2 Informe de la Secretaría de Educación a cargo de la ejecución del proyecto:
 - Ejecutorias en términos de contratación 2020-2021
 - Avances proceso contratación y ejecución
 - Cuellos de botella
 - Compromisos
- 4.2 Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente: **Implementación de acciones de adaptación etapa I del Plan de Gestión Integral de Cambio Climático (PIGCC) en el Departamento del Quindío**
 - 4.2.1 Estado de ejecución del proyecto a cargo de la Secretaría de Planeación vigencia 2020-2021.
 - 4.2.2 Informe de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente a cargo de la ejecución del proyecto:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 15

ORDEN DEL DÍA

- Ejecutorias en términos de contratación 2020-2021
- Avances proceso contratación y ejecución
- Cuellos de botella
- Compromisos

4.3 Secretaría de Aguas e Infraestructura: **Construcción de obras de estabilización y rehabilitación de la vía río verde - Pijao (cód 40QN03), estabilización de la vía Córdoba - Carniceros (cód 40Q09), Municipios de Pijao, Buenavista y Córdoba en el Departamento del Quindío**

4.3.1 Estado de ejecución del proyecto a cargo de la Secretaría de Planeación vigencia 2020-2021.

4.3.2 Informe de la Secretaría de Aguas e Infraestructura a cargo de la ejecución del proyecto:

ORDEN DEL DÍA

- Ejecutorias en términos de contratación 2020-2021
- Avances proceso contratación y ejecución
- Cuellos de botella
- Compromisos

5. Proposiciones y Varios

6. Cierre de la reunión

Posteriormente, se procede a realizar la verificación de la asistencia con la presencia de la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Jurídica y Contratación, existiendo quórum para realizar el Comité.

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y PODER VOTANTE




Integrantes del Comité
 Secretaría Jurídica y de Contratación
 Secretaría de Hacienda
 Secretaría de Planeación

Invitados Permanentes
 Control Interno y de Gestión
 Directora Técnica Secretaría de Planeación Departamental
 Jefe de Proyectos y Cooperación

2. Objeto de la reunión:

El Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, Secretario de Planeación, informa sobre el objeto de la reunión: Dar conocer a los integrantes del Comité de Regalías el Índice de Ejecución de los Proyectos del Sistema General de Regalías SGR, las alertas de los proyectos en el GESPROY y el estado de avance de tres proyectos del SGR de competencia de las Secretarías de Educación, Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Aguas e Infraestructura, con el propósito de establecer acciones de mejora en caso de aplicar.

3. Importancia de la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías – Índice de ejecución de proyectos del Sistema General – Alertas GESPROY:



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 15


El Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, expone la importancia de la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías:

1. Impactar la comunidad Quindiana a través de la ejecución de proyectos macro, que den solución a problemáticas evidenciadas en la formulación del Plan de Desarrollo 2020-2023 “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO.”
2. Dar cumplimiento a las Metas Producto y de Bienestar del Plan de Desarrollo.
3. Ejecutar y cerrar los proyectos del SGR durante el período Administrativo 2020-2023.
4. Incrementar el Índice de Ejecución de Proyectos de Inversión del SGR.
5. Evitar sanciones de las Instancias Nacionales, por una mala gestión en la ejecución de proyectos.

El Secretario de Planeación, resalta la importancia de la correcta y oportuna ejecución de los proyectos financiados con recursos de regalías, con el fin de mitigar la crisis ocasionada por el COVID -19, con los recursos propios por los menores ingresos generados en esta fuente de financiación. De ahí la importancia de comprometer y efectuar los pagos correspondientes a los recursos del SGR, con el propósito de generar ingresos adicionales por concepto de Estampilla y Fondo de Seguridad. Comenta, además, el Doctor Luis Alberto Rincón, que según reunión con el señor Gobernador, el compromiso es, ejecutar tanto los proyectos del período anterior, como los actuales y dejarlos en lo posible terminados y cerrados.

Seguidamente el secretario, socializa el histórico 2016-2021 del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías- IPGR y los resultados de la última calificación con corte al 31 de marzo de 2021, expone el detalle de alertas de la entidad y de los proyectos por cada Unidad Ejecutora, especificando el comparativo de las alertas generadas entre el 15 de junio y el 15 septiembre de 2021.

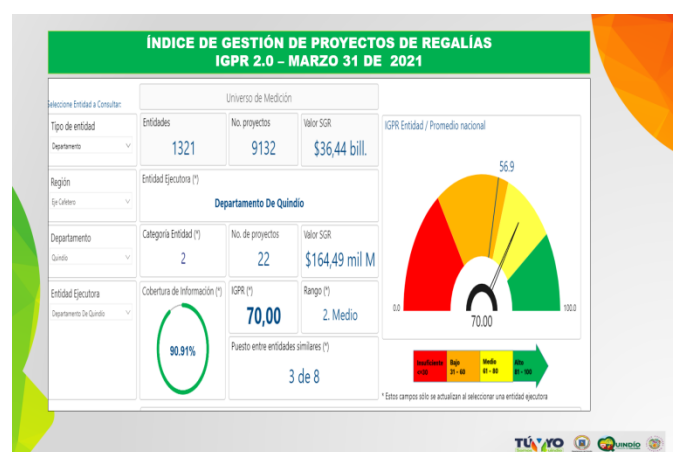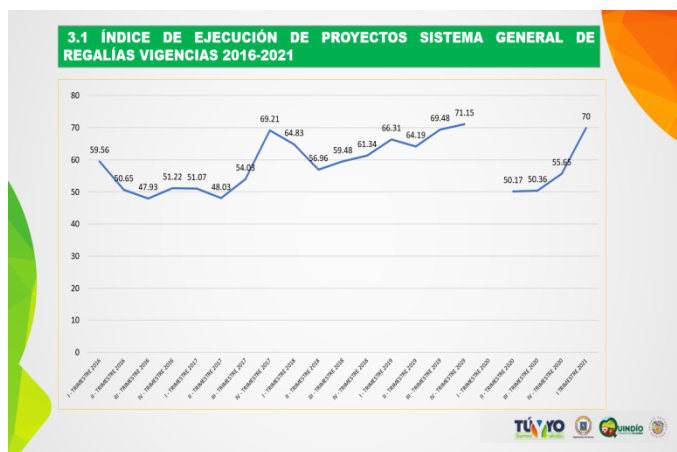

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 15

En cuanto a las alertas, resalta el compromiso y la gestión de las diferentes Unidades Ejecutoras y de la Tesorería del Departamento en la subsanación de las alertas presentadas en el aplicativo GESPROY-SGR en los diferentes períodos. Lo anterior, debido a que, en años atrás se presentaban gran cantidad de alertas y a la fecha se observa notablemente el cambio, lo que ha permitido mejorar y aumentar la calificación del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías- IPGR.

3.2 ALERTAS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR


3.2.1 GESTIÓN FINANCIERA (ENTIDAD)


GESPROY 15 DE JUNIO DE 2021 1. EJ-2-03 - Pagos reportados bajo el concepto de "Otros pagos" sin identificar el proyecto o concepto de gasto correspondiente: Pagos reportados bajo el concepto de "Otros pagos" sin identificar el proyecto o concepto de gasto correspondiente. periodo: diciembre 2020.	GESPROY 26 DE JULIO DE 2021 No genera alertas para el periodo de junio de 2021.
GESPROY 11 DE AGOSTO DE 2021 No genera alertas para el periodo de julio de 2021.	GESPROY 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 No genera alertas para el periodo de agosto de 2021.

3.2.2 ALERTAS EN PROYECTOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR POR SECRETARÍAS SECTORIALES


SECRETARÍAS	ALERTAS				PROYECTOS
	JUNIO 15 DE 2021	JULIO 26 DE 2021	AGOSTO 11 DE 2021	SEPTIEMBRE 15 DE 2021	
AGUAS E INFRAESTRUCTURA	1				2013000040049 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VÍAS SECUNDARIA, TERCERA Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
	1				2018000040059 MEJORAMIENTO DE LA VÍA CIRCUNVALADORA CON CÓRDOG ZIRÓNDO, EN LOS MUNICIPIOS DE CIRCUNVALADORA Y MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
	1	1		1	2017000040014 REMODELACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS RESULTANTES DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEL ESTUDIO DE REORDENAMIENTO FÍSICO FUNCIONAL DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS, QUINDÍO
INTERIOR	2	2			2018000040014 GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN DE LA AMENAZA SÍSMICA PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	1	1	1	1	2013000100263 DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR CURTIEMBRE A TRAVÉS DE LA I+D+I, QUINDÍO, OCCIDENTE
				1	2013000100226 APLICACIÓN DE PROCESOS INNOVADORES EN LA CADENA DE SUMINISTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA GUADUA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, OCCIDENTE
PLANEACIÓN	3				2019000040008 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN DIEZ (10) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
TOTAL	9	4	1	3	

Interviene la Doctora Martha Elena Giraldo Ramírez, Directora Técnica de la Secretaría de Planeación, explicando la gráfica del estado de ejecución gastos de inversión con recursos Sistema General de Regalías – SGR, por Secretaría Sectorial bienio 2021-2022 con corte al mes de agosto de 2021:

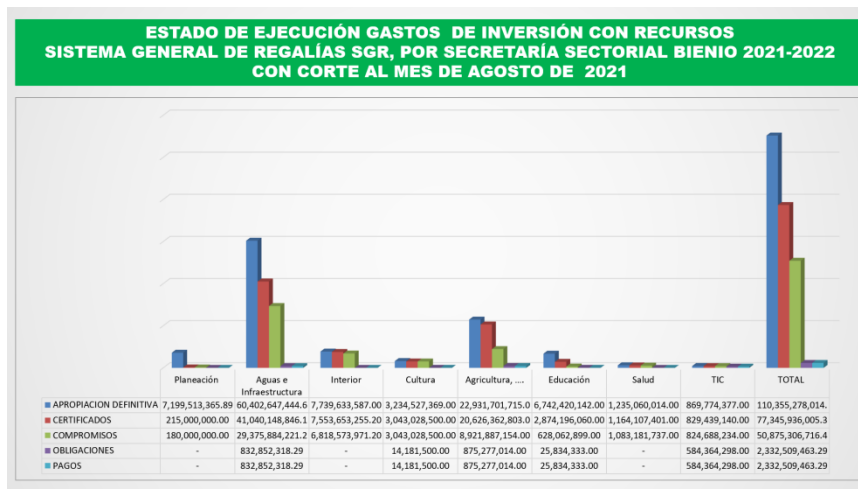

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 15

Además, presenta el comparativo del porcentaje de compromisos de recursos del Sistema General de Regalías- SGR por Secretaría Sectorial bienio 2021-2022, en el periodo comprendido de enero-agosto de 2021:

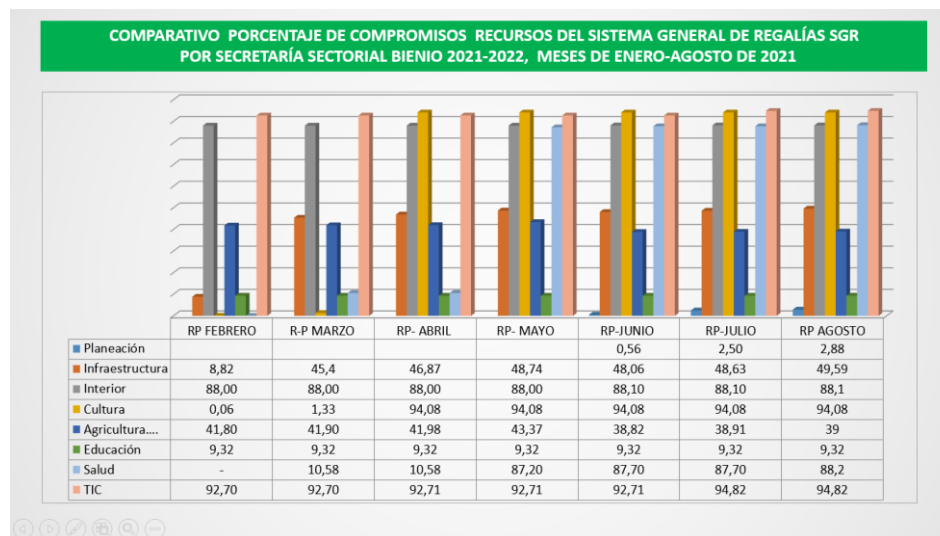


Observándose en la gráfica, situaciones estáticas en la protocolización de compromisos de las dependencias objeto de análisis, así:

En la Secretaría de Educación, se puede observar un porcentaje del 9,32% de compromisos, estático durante los meses de enero a agosto de la presente vigencia, con el agravante que en la actualidad no se ha dado solución a los procesos precontractuales en trámite.

En la Secretaría de Infraestructura se observa un 8,00% de compromiso en el mes de febrero, los cuales aumentaron a un 46,87% en el mes de abril y posteriormente se estabilizaron. Al respecto el Secretario Jurídico interviene, afirmando que el tema de retrasos de más de 5 meses se debe a la cantidad de ajustes que tuvieron que realizar en el proceso de contratación de los proyectos, además de los inconvenientes presentados en el ajuste de los códigos presupuestales.


En la Secretaría de Agricultura, se observa un 40% de recursos comprometidos en promedio durante el periodo comprendido enero- agosto de 202. Es de anotar, que la secretaria conto con adición de recursos en el proyecto de cambio climático, lo que hizo disminuir el porcentaje de compromisos.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 15

4. Seguimiento y evaluación proyectos de inversión:

4.1 Secretaría de Educación: Implementación del programa integral de bilingüismo "Quindío Bilingüe y Competitivo" en el departamento del Quindío.

La Directora Técnica de la Secretaria de Planeación informa que la S. Educación, cuenta con apropiación definitiva de \$6.742.420.142, Certificados de Disponibilidad Presupuestal por valor de \$2.874.196.060, los cuales han permanecido varios meses, sin que éstos se materialicen en la contratación, generando compromiso a través de Registro Presupuestal.

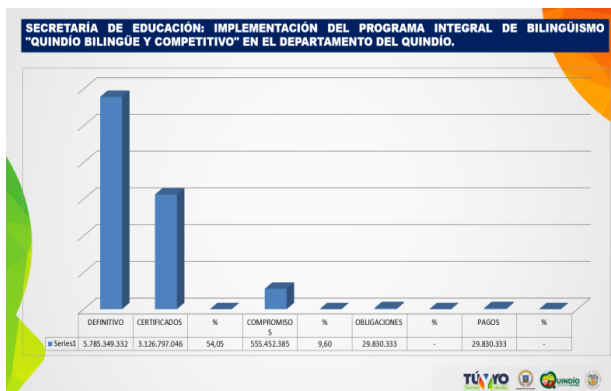


CÓDIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO	ACUERDO DE APROBACIÓN	ACTO ADMINISTRATIVO DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS	REQUISITOS PREVIOS	PERÍODO DE EJECUCIÓN (fecha de terminación)
2016000040028	Implementación del programa integral de bilingüismo "Quindío Bilingüe y Competitivo" en el departamento del Quindío	Acuerdo 38 del 28 de junio de 2017 en el acuerdo 39 del 14 de agosto de 2017	Decreto 388 del 12 de julio de 2017 Decreto 993 del 30 de octubre de 2017	14 de noviembre de 2017	28 de junio de 2017 a 31 de diciembre de 2022

Interviene la Doctora Liliana María Sánchez Villada, Secretaria de Educación, expresando que en lo que se refiere a los \$2.800 millones de pesos expedidos en Certificados Presupuestales, ha solicitado en reiteradas ocasiones a la Secretaría Jurídica y de Contratación que los procesos se puedan realizar de manera más ágil. Lo anterior, debido a que ya que van nueve (9) meses de este año y se han realizado varias propuestas para contratar la plataforma y aún no ha sido posible.

Interviene el Doctor Julián Mauricio Jara Morales, Secretario Jurídico y de Contratación, presentando el informe de los procesos pendientes del proyecto identificado con código BPIN 2016000040028 **Implementación del programa integral de bilingüismo "Quindío Bilingüe y Competitivo" en el departamento, así del Quindío:**


- En el proceso de cajoneros está pendiente que la Secretaría de Educación realice las correcciones.
- El proceso de servidores ya está publicado, pendiente de recibir propuestas.
- El proceso de plataformas, está pendiente definir si se realiza por licitación o con la Universidad del Valle directamente. **El día viernes 24 de septiembre de 2021 se toma la decisión del paso a seguir.**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 15

La doctora Liliana, expone que es muy complicado un proceso de licitación, debido a que, el proyecto tiene unas especificaciones técnicas muy difíciles de cumplir, lo que se ha manifestado siempre a la Secretaría Jurídica.

4.2 Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente: **Implementación de acciones de adaptación etapa I del Plan de Gestión Integral de Cambio Climático (PIGCC) en el Departamento del Quindío**

La Directora Técnica informa que la S. de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, cuenta con una apropiación definitiva \$22.931.701.715, Certificados de Disponibilidad Presupuestal por valor de \$20.626.362.803 durante varios meses que no se han materializado en Registro Presupuestal, contando con compromisos sólo por valor de \$ 8.921.887.154.

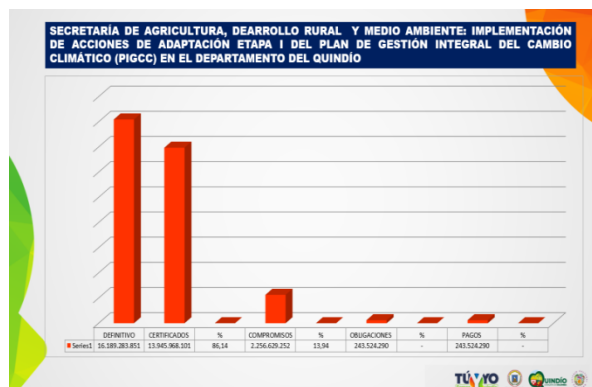


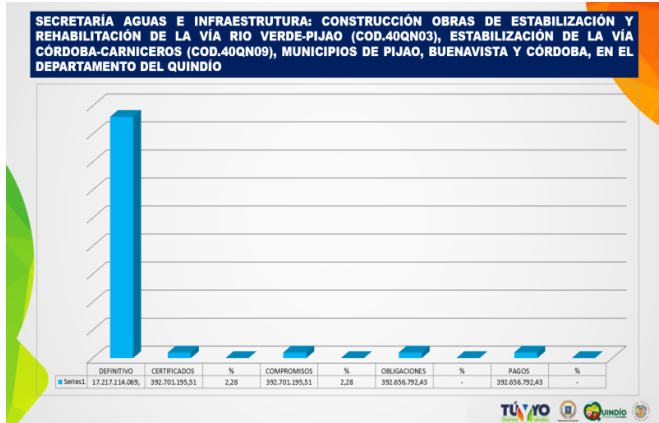
CÓDIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO	ACUERDO DE APROBACIÓN	ACTO ADMINISTRATIVO DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS	REQUISITOS PREVIOS	PERIODO DE EJECUCIÓN (fecha de terminación)
2018000040015	Implementación de acciones de adaptación etapa I del Plan de Gestión Integral de Cambio Climático (PIGCC) en el Departamento del Quindío	Acuerdo 52 del 03 de enero de 2019 Acuerdo 54 del 07 de febrero de 2019 Ajuste: Decreto 00278 del 24 de mayo de 2021	Decreto 130 del 26 de febrero de 2019 Decreto 306 del 04 de junio de 2021	07 de mayo de 2019	03 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2023

La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, se compromete a través del Director de Desarrollo Rural Sostenible, entregar el día viernes 24 de septiembre el documento final de ajustes a la secretaría Jurídica, Igualmente la Secretaría Jurídica, adquiere el compromiso de no realizar devolución del documento, enfatizando que si requiere ajustes se harían en conjunto para avanzar en el proceso.

4.3 Secretaría de Aguas e Infraestructura: **Construcción de obras de estabilización y rehabilitación de la vía río verde - Pijao (cód 40QN03), estabilización de la vía Córdoba - Carniceros (cód 40Q09), Municipios de Pijao, Buenavista y Córdoba en el Departamento del Quindío**

La Doctora Martha Elena Giraldo, informa que la S. de Aguas e Infraestructura, presenta una apropiación definitiva de \$60.402.647.444,6, Certificados de Disponibilidad Presupuestal por valor de \$41.040.148.846,1 y compromisos de \$29.375.884.221,2.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 15



SECRETARÍA AGUAS E INFRAESTRUTURA: CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RIO VERDE-PIJAO (COD.40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CÓRDOBA-CARNICEROS (COD.40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CÓRDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO


CÓDIGO BPN	NOMBRE PROYECTO	ACUERDO DE APROBACIÓN	ACTO ADMINISTRATIVO DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS	REQUISITOS PREVIOS	PERÍODO DE EJECUCIÓN (fecha de terminación)
2018130101142	Construcción de obras de estabilización y rehabilitación de la vía río verde - Pijao (cód 40QN03), estabilización de la vía Córdoba - Carniceros (cód 40QN09) Municipios de Pijao, Buenavista y Córdoba en el Departamento del Quindío	Acuerdo 59 del 30 de septiembre de 2019	Decreto 544 del 01 de octubre de 2019	25 de noviembre de 2019	20 de septiembre de 2019 a 31 de mayo de 2023

Seguidamente, interviene el Doctor Luis Alberto Rincón, solicitando considerar la crisis que se está presentando en materia de ejecución, a pesar de que se ha observado mejoría en el estado de cumplimiento de las metas estratégicas que están a cargo de la Secretaría de Aguas e Infraestructura cargadas en el tablero de control, se necesita agilizar los procesos que se encuentran pendientes, para no seguir pasando vigencias sin solucionar los inconvenientes presentados.

Por lo anterior, se solicita a la Secretaría de Aguas e Infraestructura, cumplir el compromiso de entregar los insumos pendientes, para realizar y solicitar a la Secretaría de Planeación el ajuste del proyecto Construcción de obras de estabilización y rehabilitación de la vía río verde - Pijao (cód 40QN03), estabilización de la vía Córdoba - Carniceros (cód 40QN09), Municipios de Pijao, Buenavista y Córdoba en el Departamento del Quindío, y de esta manera poder publicar en página el proceso lo más pronto posible por valor de \$ 17.500 millones de pesos.

El secretario informa, además, que el día 30 de agosto asistió al Concejo del Municipio de Pijao donde se manifestó la preocupación, de contar con más de \$ 50.000 millones de pesos aprobados con recursos del Sistema General de Regalías para obras en el municipio, y no contar a la fecha con el inicio de la inversión. Producto de lo anterior comunica que se asumió el compromiso de realizar mesas de trabajo, con el fin de comunicar el avance de los procesos. Igualmente informa, que asistió a una reunión virtual con la Contraloría y la Veeduría ciudadana de proyecto, Mejoramiento de la vía que intercomunica Pijao con la vía que conduce a los Municipios de Caicedonia en el Norte del Valle, Génova, Buenavista y Calarcá del Departamento del Quindío, en la cual se asumieron diferentes compromisos para agilizar la ejecución del proyecto.

Se establecen los compromisos que se relacionan a continuación:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 15

- En cuanto al proyecto de Cambio Climático, la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, se compromete a entregar el día viernes 24 de septiembre a radicar el documento final de ajustes a la secretaría Jurídica, el compromiso de la Secretaría Jurídica, es que el documento ya no se devuelve más, si hay necesidad de realizar algún cambio se efectúe inmediatamente para avanzar en el proceso.
- La Secretaría de Aguas e Infraestructura se compromete a radicar el ajuste del proyecto río verde en la primera semana del mes de octubre.
- La Doctora Liliana María Sánchez Villada con respecto al proyecto identificado e con el código BPIN 2016000040028 **Implementación del programa integral de bilingüismo "Quindío Bilingüe y Competitivo"** adquiere el compromiso de que el día 24 de septiembre se tiene que tener claras la decisiones de ejecución del proyecto en mención


5. Proposiciones y Varios

5.1 Proposiciones

No se presentaron

5.2 Varios

- El seguimiento a los compromisos será realizado a través de la Dirección de análisis Financiero y Administrativo de la Oficina Privada, por parte de la Doctora Lina Marcela Vélez y el Doctor Juan José Jaramillo, Asesor de la Federación Nacional de Departamentos. Este seguimiento será realizado en el próximo Comité Técnico de Regalías a realizarse en 15 días (05 de octubre de 2021).
- EL Doctor Juan José Jaramillo, solicita tener en cuenta que los hallazgos y la mala calificación de un proyecto del SGR, pueda afectar el giro de recursos para todos los proyectos del departamento, por lo que es importante cumplir los compromisos establecidos.
- El Doctor Luis Alberto Rincón informa la sobre la auditoria que el Departamento Nacional de Planeación va a realizar al proyecto de Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de salud pública durante la pandemia SARS COV-2 (COVID 19) en Armenia Quindío, aunque no han confirmado la fecha. Pero es importante realizar una mesa de trabajo para tratar los temas que se encuentran pendientes.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 15

- Se programa una reunión para el día 22 de septiembre para tratar los temas del proyecto de Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de salud pública durante la pandemia SARS COV-2 (COVID 19) en Armenia Quindío y los temas que se encuentran pendientes del proyecto Remodelación, modernización y equipamiento de áreas resultantes del reforzamiento estructural y del estudio de reordenamiento físico funcional de la E.S.E. Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios. Quindío

6. Cierre de la reunión

EL Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, Secretario de Planeación, da por terminada la sesión, siendo las 3:45 p.m., agradeciendo la participación.


CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Como conclusión es importante resaltar el trabajo en equipo que se debe dar entre la Secretaría Jurídica, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Planeación, las Unidades Ejecutoras y la Oficina Privada con el propósito de ejecutar de una manera eficiente y eficaz los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías SGR.


La Oficina Privada en un término no mayor de 15 días realizará el seguimiento a los compromisos adquiridos, por parte de las Secretarías de Educación y Agricultura, Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en la primera semana de octubre a la Secretaria de Aguas e Infraestructura.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Presentación power point
2	Listado de asistencia

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
El proceso de plataformas, está pendiente definir si se	24 de septiembre de 2021	Secretaría de Educación	



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 15

realiza por licitación o con la Universidad del Valle directamente.			
<p>Para el proyecto de cambio climático, la Secretaría de Agricultura, ya está realizando los ajustes para publicar. El día viernes 24 de septiembre se va a radicar el documento final en la secretaría Jurídica, y el compromiso es que el documento ya no se devuelve más, si hay necesidad de realizar algún cambio, se realizará inmediatamente para avanzar en el proceso.</p>	24 de septiembre de 2021	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	
<p>La Secretaría de Aguas e Infraestructura se compromete a radicar el ajuste del proyecto, Construcción de obras de estabilización y rehabilitación de la vía río verde - Pijao (cód 40QN03), estabilización de la vía Córdoba - Carniceros (cód 40Q09), Municipios de Pijao, Buenavista y Córdoba</p>	Primera semana de octubre	Secretaría de Aguas e Infraestructura	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 15

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

El próximo Comité Técnico de Regalías se realizará en 15 días (05 de octubre de 2021).

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación	
Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica Secretaría de Planeación	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG
