
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 18


GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN					
DIRECCIÓN TÉCNICA					
ACTA NÚMERO: 07					
FECHA:	24 de noviembre de 2021	HORA DE INICIO:	9:00 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:20 a.m.
LUGAR:	Secretaría de Planeación				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI X	NO		
<p>OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Dar a conocer a los integrantes del Comité de Regalías el Índice de Ejecución de los Proyectos del Sistema General de Regalías SGR, las alertas de los proyectos en el GESPROY, el informe de los compromisos adquiridos en el Comité Técnico realizado el día 12 de octubre de 2021 y el estado de avance de dos proyectos del SGR de competencia de las Secretarías de Interior y Cultura, con el propósito de establecer Planes de Mejora en caso de aplicar.</p>					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación	Secretaría de Planeación
2	Andrés Mauricio Olarte	Secretario de Hacienda (E)	Secretaría de Hacienda
3	Julián Mauricio Jara Morales	Secretario Jurídico y de Contratación	Secretaría de Jurídica y de Contratación
4	Gilberto Gutiérrez Cano	Secretario de Aguas e Infraestructura	Secretaría de Aguas e Infraestructura
5	Miguel Ángel Mejía Díaz	Director de Desarrollo Rural Sostenible	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
6	Luis Felipe Zuluaga Puerta	Director Vial y Social	Secretaría de Aguas e Infraestructura
7	Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica	Secretaría de Planeación


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 18

8	Lina Marcela Vélez	Dirección de análisis Financiero y Administrativo	Oficina Privada
9	Norma Consuelo Mantilla Quintero	Jefe de Proyectos (E)	Secretaría de Planeación
10	Nancy Castrillón Alzate	Contratista	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
11	Johanna Suárez Montejo	Contratista	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
12	Luisa Fernanda Guevara Osorio	Contratista	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
13	Hernán Gallego Cano	Contratista	Oficina de Control Interno
14	Carlos Enrique Penagos Mejía	Contratista	Secretaría de Aguas e Infraestructura
15	Juan Pablo Bernal	Contratista	Secretaría de Hacienda
16	Johan Mauricio Rendón	Contratista	Secretaría de Cultura
17	Ana Milena Carmona Manjarrés	Contratista	Secretaría de Planeación


AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación del quórum y poder votante	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación
2	Objeto de la reunión	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación
3	Importancia de la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías – Índice de ejecución	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 18

	de proyectos del Sistema General – Alertas GESPROY.	
4	Informe compromisos adquiridos comité técnico realizado el día 12 de octubre: Secretaría de Educación, Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Secretaría de Aguas e Infraestructura.	
4.1	<i>SECRETARIA DE EDUCACION PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE BILINGÜISMO “QUINDÍO BILINGÜE Y COMPETITIVO” EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.</i>	
4.1.1	<i>Informe por parte del secretario de despacho de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 12 de octubre de 2021.</i>	Claudia Marcela Oviedo Directora Calidad Secretaría de Educación
4.2	<i>SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN ETAPA I DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (PIGCC) EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.</i>	
4.2.1	<i>Informe por parte del secretario de despacho de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 12 de octubre de 2021.</i>	Miguel Ángel Mejía Díaz Director de Desarrollo Rural Sostenible
4.3	SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA, ajustes de los proyectos: <ul style="list-style-type: none"> ✓ CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RÍO VERDE - PIJAO (CÓD 40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CÓRDOBA - CARNICEROS (CÓD 40Q09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. ✓ REMODELACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS RESULTANTES DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEL ESTUDIO DE REORDENAMIENTO FÍSICO FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN 	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 18

	<p>DE DIOS. QUINDÍO.</p> <p>✓ CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA BANCA VÍA LA ESPAÑOLA, RIO VERDE, BARRAGÁN CÓDIGO 40QN04-1 QUINDÍO</p>	
4.3.1	<i>Informe por parte del secretario de despacho de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 12 de octubre de 2021.</i>	
5	Seguimiento y evaluación proyectos de inversión	
5.1	SECRETARÍA DE CULTURA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ARTISTAS COMO PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.	
5.1.1	Estado de Ejecución del Proyecto de a Cargo de la Secretaria De Planeación Vigencia 2020-2021.	<p>Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación</p> <p>Martha Elena Giraldo Ramírez Directora Técnica Secretaría de Planeación</p>
5.1.2	<p>Informe de la secretaria sectorial a cargo de la ejecución del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejecutorias en términos de contratación 2020-2021 • Avances proceso contratación y ejecución. • Cuellos de Botella • Compromisos 	<p>Juan Manuel Rodríguez Brito Secretario de Cultura</p> <p>Johan Mauricio Rendón López Gerente del proyecto de profesionalización de artistas</p>
6	Proposiciones y varios.	
7	Cierre de la reunión.	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 18


DESARROLLO TEMATICO

1. Verificación del quórum y poder votante:

Se inicia el Comité Técnico con la presentación del orden del día así:

<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">ORDEN DEL DÍA</div> <p>1. Verificación del quórum y poder votante</p> <p>2. Objeto de la reunión</p> <p>3. Importancia de la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías – Índice de ejecución de proyectos del Sistema General – Alertas GESPROY.</p> <p>4. Informe compromisos adquiridos Comité Técnico realizado el día 12 de octubre: Secretaría de Educación, Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Secretaría de Aguas e Infraestructura.</p> <p>4.1 Secretaría de Educación: Implementación del programa integral de bilingüismo "Quindío Bilingüe y Competitivo" en el departamento del Quindío.</p> <p>4.1.1 Informe por parte del secretario de despacho de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 12 de octubre de 2021.</p>	<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">ORDEN DEL DÍA</div> <p>4.2 Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente: Implementación de acciones de adaptación etapa I del plan de gestión integral de cambio climático (PIGCC) en el departamento del Quindío.</p> <p>4.2.1 Informe por parte del secretario de despacho de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 12 de octubre de 2021</p> <p>4.3 Secretaría de Aguas e Infraestructura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcción de obras de estabilización y rehabilitación de la vía río verde - pijao (cód 40qn03), estabilización de la vía córdoba - carniceros (cód 40q09), municipios de pijao, Buenavista y córdoba en el departamento del Quindío. - Remodelación, modernización y equipamiento de áreas resultantes del reforzamiento estructural y del estudio de reordenamiento físico funcional de la E.S.E. hospital departamental universitario del Quindío san Juan de dios. Quindío. - Construcción de obras de estabilización y conformación de la banca vía la española, río verde, barragán código 40qn04-1 Quindío.
<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">ORDEN DEL DÍA</div> <p>4.3.1 Informe por parte del secretario de despacho de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 12 de octubre de 2021</p> <p>5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN</p> <p>5.1 Secretaría de cultura: Implementación de un programa de educación superior para la profesionalización de los artistas como proceso de fortalecimiento del sector artístico en el departamento del Quindío.</p> <p>5.1.1 Estado de ejecución del proyecto a cargo de la Secretaria de Planeación Vigencia 2020-2021.</p> <p>5.1.2 Informe de la secretaria sectorial a cargo de la ejecución del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejecutorias en términos de contratación 2020-2021 - Avances proceso contratación y ejecución. - Cuellos de Botella - Compromisos 	<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">ORDEN DEL DÍA</div> <p>6. Proposiciones y varios</p> <p>7. Cierre de la reunión</p>

Posteriormente, se procede a realizar la verificación de la asistencia con la presencia de la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Jurídica y Contratación, existiendo quórum para realizar el Comité.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 18



2. Objeto de la reunión:


El Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, Secretario de Planeación, informa sobre el objeto de la reunión: Dar a conocer a los integrantes del Comité de Regalías el Índice de Ejecución de los Proyectos del Sistema General de Regalías SGR, las alertas de los proyectos en el GESPROY, el informe de los compromisos adquiridos en el Comité Técnico realizado el día 12 de octubre de 2021 y el estado de avance de dos proyectos del SGR de competencia de las Secretarías de Interior y Cultura, con el propósito de establecer Planes de Mejora en caso de aplicar.

3. Importancia de la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías – Índice de ejecución de proyectos del Sistema General – Alertas GESPROY:

El Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, expone la importancia de la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías:

1. Impactar la comunidad Quindiana a través de la ejecución de proyectos macro, que den solución a problemáticas evidenciadas en la formulación del Plan de Desarrollo 2020-2023 "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO."
2. Dar cumplimiento a las Metas Producto y de Bienestar del Plan de Desarrollo.
3. Ejecutar y cerrar los proyectos del SGR durante el período Administrativo 2020-2023.
4. Incrementar el Índice de Ejecución de Proyectos de Inversión del SGR.
5. Evitar sanciones de las Instancias Nacionales, por una mala gestión en la ejecución de proyectos

Seguidamente el secretario, socializa el histórico 2016-2021 del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías- IPGR y los resultados de la última calificación con corte al 30 de junio de 2021 (82,1 puntos), expone el detalle de alertas de los proyectos por cada Unidad Ejecutora, especificando el comparativo de las alertas generadas entre el 15 de octubre (3 alertas) y el 12 de noviembre de


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 18

2021 (7 alertas).

El Doctor Luis Alberto, afirma que el reto es mantener el rango del IPGR alto, por encima de 82 puntos, ya que en la vigencia 2023, quienes estén por debajo del promedio nacional (entre 60 y 65) no pueden ser designados entidades ejecutoras ni aprobadores de proyectos.

A la fecha se tiene un proyecto priorizado por valor de 25.688 y gracias a la calificación del IPGR el proyecto en la primera calificación arrojó un resultado de 72 y en la segunda evaluación un puntaje de 77.5, cumpliendo con los rangos de la norma. Se está a la espera de la citación a OCAD Regional presencial para la aprobación de este proyecto (placa huella).

También, informa que existen proyectos con una mala calificación, lo que hace que el índice se vea afectado.

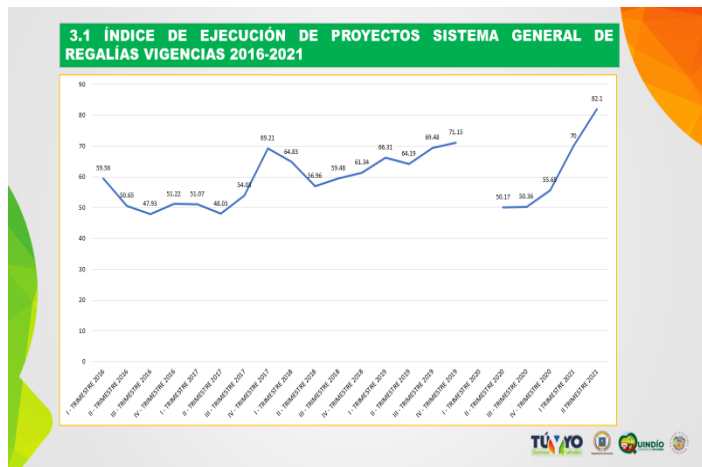


3.2.2 ALERTAS EN PROYECTOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR POR SECRETARÍAS SECTORIALES CON CORTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021

OCTUBRE 15 DE 2021		NOVIEMBRE 12 DE 2021	
SECRETARÍAS		PROYECTOS	
AGUAS INFRAESTRUCTURA		1	2017000040038 REMODELACIÓN, Y OPTIMIZACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, OBRAS DE URBANISMO COMPLEMENTARIAS Y MOVILIDAD DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
		1	2016000040029 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESARROLLO REGICRAL Y LA CONECTIVIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE MONTENEGRO, FILANDA Y QUIMBAYA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
		1	2019000040053 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA BANCA EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA QUE INTERCOMUNICA A GÉNOVA CON LA VÍA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CAicedonia EN EL NORTE DEL VALLE Y LOS MUNICIPIOS CONDILLERANOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
		1	20181101011064 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA FILANDA- LA INDIA CÓDIGO 290ND-5, MUNICIPIO DE FILANDA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	1	1	2013000100265 DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR CURTIEMBRE A TRAVÉS DE LA I+D+i, QUINDÍO, OCCIDENTE
TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO	2	1	2021003630014 FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE EMPENDIMIENTO MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EMPRENDEDORES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
EDUCACIÓN		1	2013000100199 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE INNOVACIÓN SOCIAL PARA EL FOMENTO DE UNA CULTURA CIUDADANA Y EMPRENDEDORA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL QUINDÍO, OCCIDENTE
TOTAL	3	7	

DETALLE ALERTAS GESTIÓN FINANCIERA (ENTIDAD) :

GESPROY 15 DE OCTUBRE DE 2021	GESPROY 12 DE NOVIEMBRE DE 2021
<ul style="list-style-type: none"> ✓ EJ-2-27 - Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado. Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado. Fuentes: Fte: FCTel Dif: -\$41,488,715.00; 2013000100199 Implementación de un programa de innovación social para el fomento de una cultura ciudadana y emprendedora en la comunidad educativa del Quindío, occidente. ✓ EJ-2-27 - Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado. Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado. Fuentes: Fte: FCTel Dif: -\$6,900,000.00; 2013000100263 Desarrollo sostenible del sector curtiembre a través de la I+D+i, Quindío, occidente. 	<p>EJ-2-27 - Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado. Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado. Fuentes: Fte: FCTel Dif: -\$41,488,715.00; 2013000100199 Implementación de un programa de innovación social para el fomento de una cultura ciudadana y emprendedora en la comunidad educativa del Quindío, occidente.</p> <p>EJ-2-27 - Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado. Fuentes: Fte: FCTel Dif: -\$199,418,116.00; 2013000100263 Desarrollo sostenible del sector curtiembre a través de la I+D+i, Quindío, occidente.</p> <p>EJ 2-26 - Entidades sin reporte recursos Saldos Régimen Anterior, No reporte de información recursos Saldos Régimen Anterior conforme a las circulares 007 de 2021 y 016-4 de 2021, periodo faltante: 202060712.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 18

Interviene Juan Pablo Bernal, Contratista de la Secretaría de Hacienda, informado sobre las alertas de Gestión Financiera, en lo que se refiere a la alerta del proyecto de curtiembres, el problema son los pagos que homologaron, hay un inconveniente con la plataforma todo se pago por el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías-SPGR, según asesoría del Sistema de Monitoreo se deben borrar los pagos, pero eso no es posible desde el SPGR.

Informa, además, que el Doctor Uver Alberto Chaux, Profesional Enlace de Entidad de la Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, estaba pendiente de revisar este proceso directamente con el Departamento Nacional de Planeación, la preocupación es que se han realizado diversas consultas y se ha realizado la homologación tres veces y aparecen nuevas alertas, por lo que aparecer es un problema de sistema.


Para el proyecto de innovación social se genera la misma alerta y son pagos que ya no se pueden modificar, ya que las cuentas maestras están balanceadas en cuanto a recursos con situación y sin situación de fondos, por lo tanto, no se puede realizar ningún tipo de modificación.

La alerta que se refiere a saldos del régimen anterior, pueden ser recursos de desahorro del FONPET, que se reportaban en los formatos F-19 Y F-18, y este tipo de recursos ya no se reportan en estos formatos, si no directamente en el módulo de Gestión Financiera. Se recomienda por parte de la Secretaría de Planeación realizar esta consulta con el profesional Norbey Valencia, quien era la persona encargada de reportar esta información anteriormente.

4. Informe compromisos adquiridos comité técnico realizado el día 12 de octubre: Secretaría de Educación, Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Secretaría de Aguas e Infraestructura:

4.1 SECRETARIA DE EDUCACION PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE BILINGÜISMO “QUINDÍO BILINGÜE Y COMPETITIVO” EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

4.1.1 Informe por parte del secretario de despacho de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 12 de octubre de 2021:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 18

4. INFORME COMPROMISOS

4.1 Secretaría de Educación: Implementación del programa integral de bilingüismo "Quindío Bilingüe y Competitivo" en el departamento del Quindío.

Compromiso: La Secretaría de Educación y la Secretaría Jurídica y de Contratación, el día 12 de octubre de 2021, definen si el proceso de plataformas del proyecto de bilingüismo se va a realizar con la Universidad del Valle, Por lo tanto, van a revisar las plataformas que ofrece la entidad.

Fecha de cumplimiento compromiso: 12 de octubre de 2021



La Secretaría de Educación no asistió al Comité Técnico, sin embargo, el Secretario Jurídico y de Contratación informa que los procesos de plataformas, servidores y cajoneros del proyecto de bilingüismo ya se encuentran adjudicados.

Se encuentra pendiente únicamente el proceso de nativos, y a la fecha no han radicado el proceso de estudios previos para la licitación, se establece el compromiso con la Oficina de Control Interno de remitir un oficio a la Secretaría de Educación a nombre del Comité Técnico de Regalías, informando que este proceso se debe radicar ante la oficina jurídica y de contratación.

4.2 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN ETAPA I DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (PIGCC) EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

4.2.1 Informe por parte del secretario de despacho de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 12 de octubre de 2021:


4. INFORME COMPROMISOS

4.2 Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente: Implementación de acciones de adaptación etapa I del plan de gestión integral de cambio climático (PIGCC) en el departamento del Quindío.

Compromiso: Radicación del documento final del proyecto de cambio climático, el día 13 de octubre de 2021 en la Secretaría Jurídica y de Contratación, para ser publicado aproximadamente el día 20 de octubre.

Fecha de cumplimiento del compromiso: 13 de octubre de 2021.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 18

El Doctor Miguel Ángel Mejía Díaz, Director de Desarrollo Rural Sostenible, informa que el proceso de licitación de reforestación ya se encuentra publicado en página desde el día 16 de noviembre y se encuentra en prepliegos en etapa de observaciones hasta el día 30 de noviembre de 2021 y según el cronograma establecido con la Secretaría Jurídica, al día 24 de enero de 2022 ya se daría Acta de Inicio.

4.3 SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA, ajustes de los proyectos:

- ✓ CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RÍO VERDE - PIJAO (CÓD 40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CÓRDOBA - CARNICEROS (CÓD 40Q09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.
- ✓ REMODELACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS RESULTANTES DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEL ESTUDIO DE REORDENAMIENTO FÍSICO FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS. QUINDÍO.
- ✓ CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA BANCA VÍA LA ESPAÑOLA, RIO VERDE, BARRAGÁN CÓDIGO 40QN04-1 QUINDÍO

4.3.1 Informe por parte del secretario de despacho de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 12 de octubre de 2021:


4. INFORME COMPROMISOS

4.3 Secretaria de Aguas e infraestructura: **Construcción de obras de estabilización y rehabilitación de la vía río verde - pijao (cód 40qn03), estabilización de la vía córdoba - carniceros (cód 40q09), municipios de pijao, Buenavista y córdoba en el departamento del Quindío.**

Compromiso: Radicar el ajuste del proyecto, Construcción de obras de estabilización y rehabilitación de la vía río verde - Pijao (cód. 40QN03), estabilización de la vía Córdoba - Carniceros (cód. 40Q09), Municipios de Pijao, Buenavista y Córdoba, en la Secretaría de Planeación entre los días 20 y 21 de octubre.

Fecha de cumplimiento del compromiso: 21 de octubre de 2021.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 18

El Doctor Gilberto Gutiérrez Cano, Secretario de Aguas e Infraestructura informa que para el proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA BANCA VÍA LA ESPAÑOLA, RIO VERDE, BARRAGÁN CÓDIGO 40QN04-1 QUINDÍO, se espera radicar el ajuste el día 25 de noviembre de 2021 con los ajustes definitivos. Se espera realizar una adición de recursos propios por valor de \$500.000 millones de pesos y el ajuste no supera el 50% del proyecto.

Lo anterior, debido a que la ola invernal está generando un riesgo a las obras ya construidas.

Para el proyecto, REMODELACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS RESULTANTES DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEL ESTUDIO DE REORDENAMIENTO FÍSICO FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS. QUINDÍO, la interventoría ya entrego los ajustes solicitados y se espera radicar el ajuste el día 30 de noviembre de 2021.


Para el proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RÍO VERDE - PIJAO (CÓD 40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CÓRDOBA - CARNICEROS (CÓD 40Q09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, aún se encuentra en el proceso de ajuste para solicitud de recursos.

5. Seguimiento y evaluación proyectos de inversión

5.1 SECRETARÍA DE CULTURA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ARTISTAS COMO PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.


5.1.1 Estado de Ejecución del Proyecto de a Cargo de la Secretaria De Planeación Vigencia 2020-2021.

La Directora Técnica informa sobre los datos generales del proyecto: nombre, BPIN, Acto Administrativo de aprobación, Acto Administrativo de incorporación de recursos, fecha de cumplimiento de requisitos previos al inicio de la ejecución y período de ejecución y que cuenta con una apropiación definitiva de \$3.234.527.369, certificados de disponibilidad por valor de \$3.043.028.500, compromisos por \$3.043.028.500:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 18

SECRETARÍA DE CULTURA: IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ARTISTAS COMO PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

CÓDIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO	ACUERDO DE APROBACIÓN	ACTO ADMINISTRATIVO DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS	REQUISITOS PREVIOS	PERÍODO DE EJECUCIÓN (fecha de terminación)
2019000040046	Implementación de un programa de educación superior para la profesionalización de los artistas como proceso de fortalecimiento del sector artístico en el Departamento del Quindío	Acuerdo 61 del 22 de noviembre de 2019	Decreto 660 del 17 de diciembre de 2019	14 de abril de 2020	22 de noviembre de 2019 a 31 de diciembre de 2023

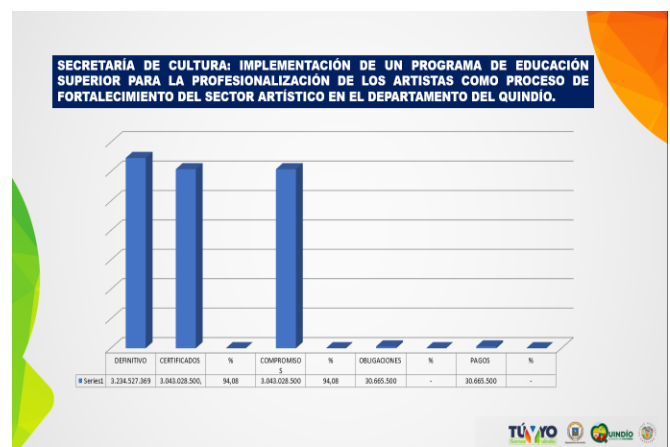

5.1.2 Informe de la secretaria sectorial a cargo de la ejecución del proyecto:


- Ejecutorias en términos de contratación 2020-2021
- Avances proceso contratación y ejecución.
- Cuellos de Botella
- Compromisos

Interviene Johan Mauricio Rendón, Gerente del proyecto informando que es un proyecto de 3.279 millones de pesos y que el objetivo principal del proyecto es realizar la contratación de la Universidad que se encargara de la operación de los programas académicos objeto del proyecto, lo cual se realizó en el mes de abril del presente año.

El proyecto consiste en traer unos programas académicos que en el Departamento del Quindío no existen, por lo que se deben tramitar una serie de solicitudes ante el Ministerio de Educación que se llaman ampliación de los registros calificados académicos para la ciudad de Armenia.

El proceso ya se inició y el día 27 de septiembre de 2021 el Ministerio de Educación solicitó a la Universidad un ajuste, el cual fue realizado en el mes de octubre. Por lo anterior se han tenido mesas de trabajo con la Universidad y se espera a la próxima semana (entre el 29 de noviembre y el 03 de diciembre) obtener una respuesta positiva a los trámites adelantados, lo que quiere decir que ya se podrían abrir las convocatorias e iniciar los programas académicos.

El proceso ha sido un poco demorado debido a que se dio un cambio de normatividad, lo que requirió iniciar desde cero para el Departamento del Quindío.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 18

Además, informa que el proyecto presenta una baja ejecución presupuestal debido a que el primer pago de la universidad se condicione a la iniciación del primer semestre académico, por lo que no se han realizado pagos a la fecha.

Debido a los retrasos se han realizado constantes socializaciones en todos los municipios del departamento, los artistas serán seleccionados por la Universidad de Antioquia, la Secretaría de Cultura se encarga de prepararlos para las convocatorias. En el Departamento del Quindío existen 1064 artistas, 303 que se encuentran sin profesionalización.


Finalmente, el Gerente del proyecto que en el despacho del Gobernador se encuentra un oficio solicitando al Ministerio de Educación, la agilidad en el proceso.

6. Propositiones y varios.

- a. El Doctor Luis Alberto Rincón, solicita apoyo a la oficina de Control Interno para oficiar al despacho con el fin de solicitar que a las reuniones del Comité Técnico de Regalías puedan asistir las secretarías Jurídica y de Hacienda, y así poder avanzar en los temas pendientes y propuestos en cada reunión, ya que estas dependencias conforman dicho comité en conjunto con la secretaria de Planeación.
- b. Interviene el Doctor Miguel Ángel Mejía Díaz, Director de Desarrollo Rural Sostenible, solicitando apoyo ante el Departamento Nacional de Planeación para poder realizar el cierre, lo más pronto posible del proyecto identificado con código BPIN 2013000100263 Desarrollo sostenible del Sector curtiembre a través de la I+D+I, Quindío, Occidente.

El Secretario de Planeación solicita apoyo a la Secretaría de Hacienda para oficiar (entre el 29 y el 03 de diciembre) al Doctor Uver Alberto Chau, Profesional Enlace de Entidad de la Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, citar a una mesa de trabajo para analizar nuevamente el caso presentado en este proyecto y buscar la solución mas inmediata.

- c. El secretario de Planeación informa sobre la visita del Departamento Nacional de Planeación al proyecto de red salud, Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de salud pública durante la pandemia SARS COV-2 (COVID 19) en Armenia Quindío, por lo que solicita una mesa de trabajo el día 25 de noviembre, en conjunto con la Secretaría de Aguas e Infraestructura, Secretaría de Salud y Oficina Jurídica y de Contratación, para revisar los expedientes y unificar la información a presentar ante el Sistema de Monitoreo.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 18

7. Cierre de la reunión.

EL Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, Secretario de Planeación, da por terminada la sesión, siendo las 10:20 a.m., agradeciendo la participación.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

La Oficina Privada en un término no mayor de 15 días realizará el seguimiento a los compromisos adquiridos, por parte de las Secretarías de Educación, Agricultura, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Aguas e Infraestructura, así como los adquiridos por la Secretaría Jurídica y de Contratación.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Listado de asistencia
2	Presentación en power point

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
se establece el compromiso con la Oficina de Control Interno, de remitir un oficio a la Secretaría de Educación a nombre del Comité Técnico de Regalías, informando que, para el proyecto de bilingüismo, se encuentra pendiente radicar ante la oficina Jurídica y de Contratación, los estudios previos para la licitación del proceso de nativos.	Entre el 29 de noviembre y el 03 de diciembre de 2021	Oficina de Control Interno	



FORMATO

Código: F-CIG-03


Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 18

Radicar el ajuste del proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA BANCA VÍA LA ESPAÑOLA, RIO VERDE, BARRAGÁN CÓDIGO 40QN04-1 QUINDÍO, el día 25 de noviembre de 2021 con los ajustes definitivos.	25 de noviembre de 2021	Secretaría de Aguas e Infraestructura	
Radicar el ajuste del proyecto REMODELACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS RESULTANTES DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEL ESTUDIO DE REORDENAMIENTO FÍSICO FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS. QUINDÍO, el día 30 de noviembre de 2021.	30 de noviembre de 2021	Secretaría de Aguas e Infraestructura	
Radicar el ajuste del proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RÍO VERDE - PIJAO (CÓD 40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA	30 de noviembre de 2021	Secretaría de Aguas e Infraestructura	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 18

VÍA CÓRDOBA - CARNICEROS (CÓD 40Q09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, aún se encuentra en el proceso de ajuste para solicitud de recursos.			
Respuesta del Ministerio de Educación, ante la solicitud de ampliación de los registros calificados académicos para la ciudad de Armenia, para el proyecto Implementación de un programa de educación superior para la profesionalización de los artistas como proceso de fortalecimiento del sector artístico en el departamento del Quindío.	Entre el 29 de noviembre y el 03 de diciembre	Secretaría de Cultura	
se establece el compromiso con la Oficina de Control Interno de remitir un oficio al despacho en conjunto con la Secretaría de Planeación, con el fin de solicitar que a las reuniones del Comité Técnico de Regalías puedan asistir las secretarías Jurídica y de	Entre el 29 de noviembre y el 03 de diciembre	Oficina de Control Interno	



FORMATO

Código: F-CIG-03


Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 17 de 18

Hacienda, y así poder avanzar en los temas pendientes y propuestos en cada reunión, ya que estas dependencias conforman dicho comité en conjunto con la secretaria de Planeación.			
Se establece el compromiso con la Secretaría de Hacienda de remitir un oficio en conjunto con la Secretaría de Planeación, al Doctor Uver Alberto Chau, Profesional Enlace de Entidad de la Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, para realizar una mesa de trabajo y así, poder analizar nuevamente el caso presentado en el proyecto de curtiembres y buscar la solución más inmediata.	Entre el 29 de noviembre y el 03 de diciembre	Secretaría de Hacienda	
Mesa de trabajo en conjunto con la Secretaría de Aguas e Infraestructura, Secretaría de Salud y Oficina Jurídica y de Contratación, para revisar los expedientes y unificar la información a presentar ante el Sistema de Monitoreo, del	25 de noviembre de 2021	Secretaría de Aguas e Infraestructura	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 18

proyecto Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de salud pública durante la pandemia SARS COV-2 (COVID 19) en Armenia Quindío.			
---	--	--	--

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN
El próximo Comité Técnico de Regalías se realizará en 15 días (09 de diciembre de 2021).

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación	
Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica Secretaría de Planeación	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG
