
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 13


<b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b>					
<b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</b>					
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>					
<b>ACTA NÚMERO: 08</b>					
<b>FECHA:</b>	28 de diciembre de 2021	<b>HORA DE INICIO:</b>	2:00 p.m.	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	3:00 p.m.
<b>LUGAR:</b>	Plataforma zoom:  ID de reunión: 750 8863 9029 Código de acceso: vZaJx3				
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>		<b>SI</b>		<b>NO</b>	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Dar a conocer a los integrantes del Comité de Regalías el Índice de Ejecución de los Proyectos del Sistema General de Regalías SGR, las alertas de los proyectos en el GESPROY y el informe de los compromisos adquiridos en el Comité Técnico realizado el día 24 de noviembre de 2021.					

<b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b>			
<b>N°</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA QUE REPRESENTA</b>
1	Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación	Secretaría de Planeación
2	Aleyda Marín Betancourt	Secretaria de Hacienda	Secretaría de Hacienda
3	Julián Mauricio Jara Morales	Secretario Jurídico y de Contratación	Secretaría de Jurídica y de Contratación
4	Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica	Secretaría de Planeación
5	Juan Pablo Téllez Giraldo	Director de Contratación	Secretaría de Jurídica y de Contratación
6	Carlos Enrique Penagos Mejía	Contratista	Secretaría de Aguas e Infraestructura


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 13

7	Juan Pablo Bernal	Contratista	Secretaría de Hacienda
8	Johan Mauricio Rendón	Contratista	Secretaría de Cultura
9	Ana Milena Carmona Manjarrés	Contratista	Secretaría de Planeación

<b>AGENDA DEL DÍA</b>		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación del quórum y poder votante	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación
2	Objeto de la reunión	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación
3	Importancia de la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías – Índice de ejecución de proyectos del Sistema General – Alertas GESPROY.	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación
4	Informe compromisos adquiridos comité técnico realizado el día 24 de noviembre: Secretaría de Educación, Secretaría de Aguas e Infraestructura, Secretaría de Cultura.	
4.1	<i>SECRETARIA DE EDUCACION PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE BILINGÜISMO “QUINDÍO BILINGÜE Y COMPETITIVO” EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.</i>	
4.1.1	<i>Informe por parte del secretario de despacho de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 24 de noviembre de 2021.</i>	Claudia Marcela Oviedo Directora Calidad Secretaría de Educación
	SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA, ajustes de los proyectos:  ✓ CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RÍO VERDE - PIJAO (CÓD 40QN03),	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 13


4.2	<p>ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CÓRDOBA - CARNICEROS (CÓD 40Q09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ REMODELACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS RESULTANTES DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEL ESTUDIO DE REORDENAMIENTO FÍSICO FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS. QUINDÍO.</li> <li>✓ CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA BANCA VÍA LA ESPAÑOLA, RIO VERDE, BARRAGÁN CÓDIGO 40QN04-1 QUINDÍO</li> </ul>	
4.2.1	<i>Informe por parte del secretario de despacho de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 24 de noviembre de 2021.</i>	
4.3	SECRETARÍA DE CULTURA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ARTISTAS COMO PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.	
4.3.1	Informe por parte del secretario de despacho de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 24 de noviembre de 2021.	<p>Juan Manuel Rodríguez Brito Secretario de Cultura</p> <p>Johan Mauricio Rendón López Gerente del proyecto de profesionalización de artistas</p>
5	Proposiciones y varios.	
6	Cierre de la reunión.	


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 13


## DESARROLLO TEMATICO

### 1. Verificación del quórum y poder votante:


Se inicia el Comité Técnico con la presentación del orden del día así:

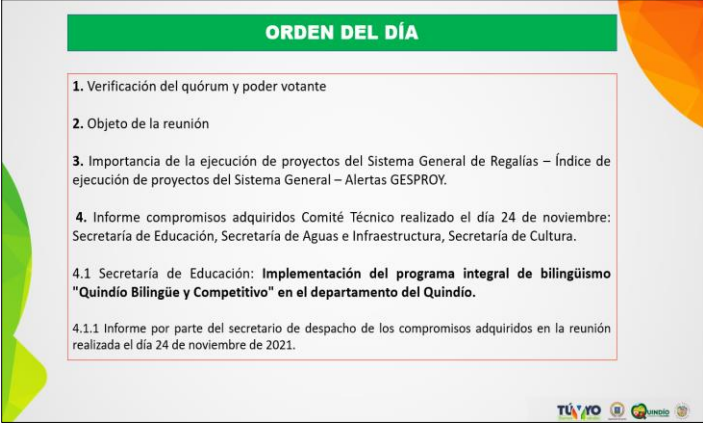


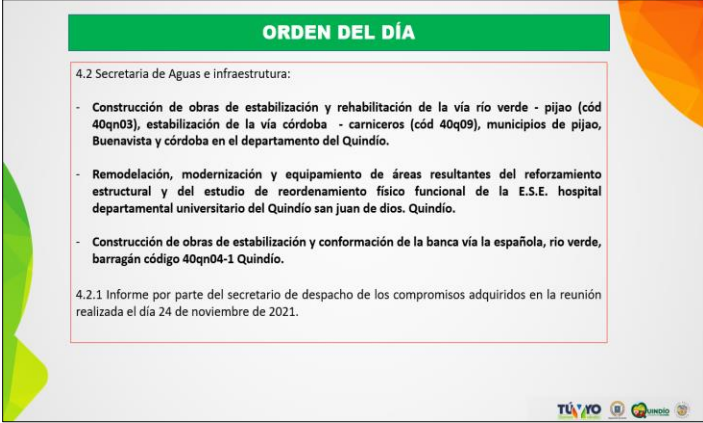

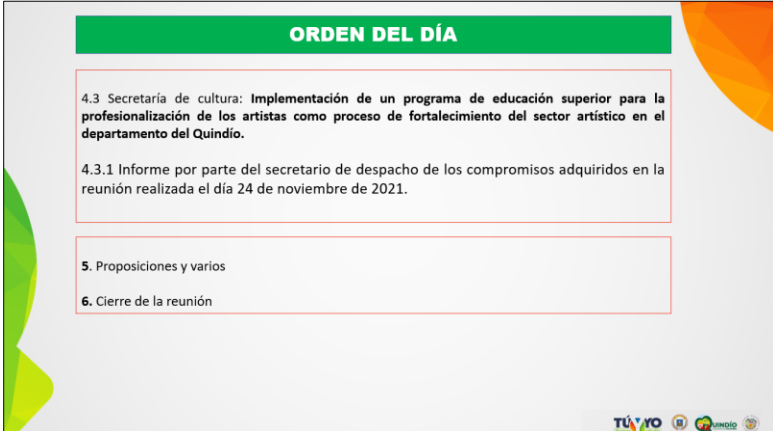

Posteriormente, se procede a realizar la verificación de la asistencia con la presencia de la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Jurídica y Contratación, existiendo quórum para realizar el Comité.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 13



## 2. Objeto de la reunión:

El Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, Secretario de Planeación, informa sobre el objeto de la reunión: Dar a conocer a los integrantes del Comité de Regalías el Índice de Ejecución de los Proyectos del Sistema General de Regalías SGR, las alertas de los proyectos en el GESPROY y el informe de los compromisos adquiridos en el Comité Técnico realizado el día 24 de noviembre de 2021.


## 3. Importancia de la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías – Índice de ejecución de proyectos del Sistema General – Alertas GESPROY:

El Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, expone la importancia de la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías:

Impactar la comunidad Quindiana a través de la ejecución de proyectos macro, que den solución a problemáticas evidenciadas en la formulación del Plan de Desarrollo 2020-2023 “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO.”

- ✓ Dar cumplimiento a las Metas Producto y de Bienestar del Plan de Desarrollo.
- ✓ Ejecutar y cerrar los proyectos del SGR durante el período Administrativo 2020-2023.
- ✓ Incrementar el Índice de Ejecución de Proyectos de Inversión del SGR.
- ✓ Evitar sanciones de las Instancias Nacionales, por una mala gestión en la ejecución de proyectos


Seguidamente el secretario, socializa el histórico 2016-2021 del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías- IPGR y los resultados de la última calificación con corte al 30 de septiembre de 2021, informando la disminución del índice de 82.1 a 73.4 puntos, ubicando al Departamento en el puesto 7 de 8 entidades similares, en el nivel medio, con una cobertura del 100%. Por lo

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 13

anterior, es importante mantener el índice por encima de 80 puntos con un rango alto, con el fin de que el Departamento pueda continuar aprobando proyectos y sea designado ejecutor.

Expone, además, el detalle de alertas de los proyectos por cada Unidad Ejecutora, especificando el comparativo de las alertas generadas entre el 15 de noviembre (7 alertas) y el 15 de diciembre de 2021 (6 alertas).

### 3.1 ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE REGALÍAS VIGENCIAS 2016-2021




Fecha	Índice
15/11/2016	50.56
15/11/2016	50.65
15/11/2016	47.91
15/11/2016	51.22
15/11/2016	51.07
15/11/2016	49.03
15/11/2016	54.08
15/11/2016	69.21
15/11/2016	64.83
15/11/2016	56.06

### 3.2 DETALLE ALERTAS GESTIÓN FINANCIERA (ENTIDAD) :

GESPROY 15 DE NOVIEMBRE DE 2021	GESPROY 15 DE DICIEMBRE DE 2021
<p><b>EJ-2-27</b> - Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado. Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado. Fuentes: Fte: FCTel Dif: -\$41,488,715.00; 2013000100199 Implementación de un programa de innovación social para el fomento de una cultura ciudadana y emprendedora en la comunidad educativa del Quindío, occidente.</p> <p><b>EJ-2-27</b> - Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado. Fuentes: Fte: FCTel Dif: -\$199,418,116.00; 2013000100263 Desarrollo sostenible del sector curtiembre a través de la I+D+i, Quindío, occidente.</p> <p><b>EJ 2-26</b> - Entidades sin reporte recursos Saldos Régimen Anterior, No reporte de información recursos Saldos Régimen Anterior conforme a las circulares 007 de 2021 y 016-4 de 2021, periodo faltante: 202060712.</p>	<p><b>EJ-2-27</b> - Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado. Fuentes: Fte: FCTel Dif: -\$199,418,116.00; 2013000100263 Desarrollo sostenible del sector curtiembre a través de la I+D+i, Quindío, occidente.</p> <p><b>EJ 2-26</b> - Entidades sin reporte recursos Saldos Régimen Anterior, No reporte de información recursos Saldos Régimen Anterior conforme a las circulares 007 de 2021 y 016-4 de 2021, periodo faltante: 202060712.</p>

El secretario de Planeación solicita subsanar las alertas de Gestión Financiera, antes de terminar la vigencia 2021.

La alerta del proyecto de curtiembres ya se encuentra resuelta, está en revisión el Acto Administrativo de cierre del proyecto.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 13

#### 4. Informe compromisos adquiridos comité técnico realizado el día 24 de noviembre: Secretaría de Educación, Secretaría de Aguas e Infraestructura, Secretaría de Cultura:

##### 4.1 SECRETARIA DE EDUCACION PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE BILINGÜISMO “QUINDÍO BILINGÜE Y COMPETITIVO” EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.


4.1.1 Informe por parte del secretario de despacho de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 24 de noviembre de 2021:

4. INFORME COMPROMISOS

4.1 Secretaría de Educación: **Implementación del programa integral de bilingüismo "Quindío Bilingüe y Competitivo" en el departamento del Quindío.**

**Compromiso:** Se estableció el compromiso con la Oficina de Control Interno, de remitir un oficio a la Secretaría de Educación a nombre del Comité Técnico de Regalías, informando que, para el proyecto de bilingüismo, se encuentra pendiente radicar ante la oficina Jurídica y de Contratación, los estudios previos para la licitación del proceso de nativos.

**Fecha de cumplimiento compromiso:** Entre el 29 de noviembre y el 03 de diciembre de 2021.




La Secretaría de Educación no asistió al Comité Técnico, sin embargo, el Doctor Julián Mauricio Jara Morales, Secretario Jurídico, informa que se encuentra pendiente únicamente el proceso de nativos, y a la fecha no han radicado el proceso de estudios previos para la licitación, se establece el compromiso de remitir un oficio a la Secretaría de Educación a nombre del Comité Técnico de Regalías, informando que este proceso se debe radicar ante la oficina jurídica y de contratación lo más pronto posible.

##### 4.2 SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA, ajustes de los proyectos:

- ✓ CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RÍO VERDE - PIJAO (CÓD 40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CÓRDOBA - CARNICEROS (CÓD 40Q09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 13

- ✓ REMODELACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS RESULTANTES DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEL ESTUDIO DE REORDENAMIENTO FÍSICO FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS. QUINDÍO.
- ✓ CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA BANCA VÍA LA ESPAÑOLA, RIO VERDE, BARRAGÁN CÓDIGO 40QN04-1 QUINDÍO.

4.2.1 Informe por parte del secretario de despacho de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 24 de noviembre de 2021:

4. INFORME COMPROMISOS


4.2 Secretaría de Aguas e infraestructura:

**1. Compromiso:** Radicar el ajuste del proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA BANCA VÍA LA ESPAÑOLA, RIO VERDE, BARRAGÁN CÓDIGO 40QN04-1 QUINDÍO.

**Fecha de cumplimiento del compromiso:** 25 de noviembre de 2021.

**2. Compromiso:** Radicar el ajuste del proyecto REMODELACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS RESULTANTES DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEL ESTUDIO DE REORDENAMIENTO FÍSICO FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS. QUINDÍO.

**Fecha de cumplimiento del compromiso:** 30 de noviembre de 2021.



4. INFORME COMPROMISOS


4.2 Secretaría de Aguas e infraestructura:

**3. Compromiso:** Radicar el ajuste del proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RIO VERDE - PIJAO (CÓD 40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CÓRDOBA - CARNICEROS (CÓD 40Q09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

**Fecha de cumplimiento del compromiso:** 30 de noviembre de 2021.

**4. Compromiso:** Mesa de trabajo en conjunto con la Secretaría de Aguas e Infraestructura, Secretaría de Salud y Oficina Jurídica y de Contratación, para revisar los expedientes y unificar la información a presentar ante el Sistema de Monitoreo, del proyecto Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de salud pública durante la pandemia SARS COV-2 (COVID 19) en Armenia Quindío.


**Fecha de cumplimiento del compromiso:** 25 de noviembre de 2021.



Los ajustes de los proyectos: Construcción de obras de estabilización y rehabilitación de la vía río verde - pijao (cód 40qn03), estabilización de la vía córdoba - carniceros (cód 40q09), municipios de pijao, Buenavista y córdoba en el departamento del Quindío, remodelación, modernización y equipamiento de áreas resultantes del reforzamiento estructural y del estudio de reordenamiento físico funcional de la E.S.E. hospital departamental universitario del Quindío san juan de dios. Quindío, construcción de obras de estabilización y conformación de la banca vía la española, rio verde, barragán código 40qn04-1 Quindío, ya se encuentran radicados en la Secretaría de Planeación y en revisión por parte del equipo de regalías de la secretaría.

En lo referente al proyecto Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de salud pública durante la pandemia SARS COV-2 (COVID 19) en Armenia Quindío, se declaro desierto el proceso de adecuaciones físicas, a lo que informa el Doctor Juan Pablo Téllez, que se está a la espera de cumplir el término de 10 días para publicar nuevamente.




	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 13

El secretario de Planeación recuerda, además, el compromiso con el proyecto de redsalud de presentar la primera semana de enero de 2022 el informe integral del proyecto, según el compromiso adquirido con el equipo de seguimiento del Departamento Nacional de Planeación.

#### 4.3 SECRETARÍA DE CULTURA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ARTISTAS COMO PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

4.3.1 Informe por parte del secretario de despacho de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 24 de noviembre de 2021:

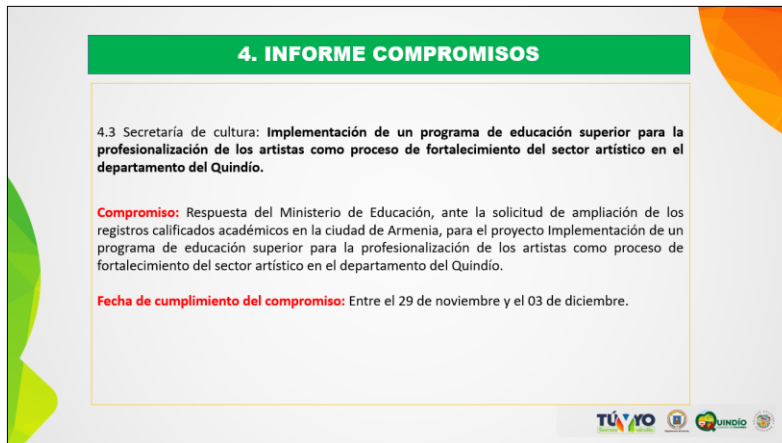

**4. INFORME COMPROMISOS**

4.3 Secretaría de cultura: **Implementación de un programa de educación superior para la profesionalización de los artistas como proceso de fortalecimiento del sector artístico en el departamento del Quindío.**


**Compromiso:** Respuesta del Ministerio de Educación, ante la solicitud de ampliación de los registros calificados académicos en la ciudad de Armenia, para el proyecto Implementación de un programa de educación superior para la profesionalización de los artistas como proceso de fortalecimiento del sector artístico en el departamento del Quindío.

**Fecha de cumplimiento del compromiso:** Entre el 29 de noviembre y el 03 de diciembre.

Interviene Johan Mauricio Rendón, Gerente del proyecto exponiendo que se tuvo una reunión el día de hoy 28 de diciembre de 2021 con el Ministerio de Educación, en la cual se informó que se encuentra pendiente programar una visita técnica al Municipio de Armenia, con el fin de dar el aval para la ampliación de los registros académicos calificados que no existen.

Los procesos han sido demorados y se han retrasado debido a la transición por el cambio de normatividad, por lo tanto, siguen a la espera de la respuesta por parte del Ministerio.

El Doctor Luis Alberto, sugiere tener en cuenta la reprogramación del proyecto, ya que este proceso se puede realizar hasta el día 30 de diciembre de la presente vigencia, en caso de requerirlo solicitar apoyo a la Secretaría de Planeación.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 13

#### 4. INFORME COMPROMISOS

**Oficina de Control Interno :**


**Compromiso:** Se estableció el compromiso con la Oficina de Control Interno de remitir un oficio al despacho en conjunto con la Secretaría de Planeación, con el fin de solicitar que a las reuniones del Comité Técnico de Regalías puedan asistir las secretarías Jurídica y de Hacienda, y así poder avanzar en los temas pendientes y propuestos en cada reunión, ya que estas dependencias conforman dicho comité en conjunto con la secretaría de Planeación.

**Fecha de cumplimiento del compromiso:** Entre el 29 de noviembre y el 03 de diciembre.

**Secretaría de Hacienda:**

**Compromiso:** Se estableció el compromiso con la Secretaría de Hacienda de remitir un oficio en conjunto con la Secretaría de Planeación, al Doctor Uver Alberto Chau, Profesional Enlace de Entidad de la Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, para realizar una mesa de trabajo y así, poder analizar nuevamente el caso presentado en el proyecto de curtiembres y buscar la solución más inmediata.

**Fecha de cumplimiento del compromiso:** Entre el 29 de noviembre y el 03 de diciembre.




En cuanto, al compromiso de la Oficina de Control Interno, no se obtuvo información, por lo que se toma la decisión de oficiar a las diferentes Unidades Ejecutoras, a nombre de los integrantes del Comité Técnico de Regalías.

En lo que se refiere al compromiso de la Secretaría de Hacienda, se informa que los temas pendientes con el proyecto de curtiembres, han sido subsanados.

## 5. Proposiciones y varios.

- a. Los integrantes del Comité Técnico de regalías solicitan oficiar a la Secretaría de Educación, con el fin de que radiquen ante la oficina Jurídica y de Contratación, los estudios previos para la licitación del proceso de nativos del proyecto identificado con código BPIN 2016000040028 Implementación del programa integral de bilingüismo "Quindío Bilingüe y Competitivo" en el departamento del Quindío.
- b. La doctora Aleyda Aleyda Marín Betancourt, Secretaría de Hacienda, solicita que se debe tener en cuenta, que al momento de radicar las cuentas de los contratistas que reciben pagos con recursos del Sistema General de Regalías, debe ser con la debida antelación, ya que las plataformas tienen unas fechas límites de cierre, y al radicarse las cuentas extemporáneas o con errores se presentan inconvenientes que generan mayores traumatismos y retrasos.
- c. El doctor Juan Pablo Téllez, afirma que es importante agilizar y resolver los procesos pendientes de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, debido a la política de prevención del daño antijurídico, ya que por medio de esta se sustentan y defienden los procesos ante los diferentes Entes de Control.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 13

- d. Los integrantes del Comité Técnico de regalías llegan al acuerdo de oficiar a las diferentes Unidades Ejecutoras de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, informando sobre la Circular conjunta 0033-4 emanada por la Contraloría General de la Republica, la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Nacional de Planeación, sobre la aprobación y gestión de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías y resaltar la importancia dar prioridad a la asistencia por parte de los secretarios de despacho y sus enlaces, a los Comités Técnicos de Regalías programados por la Secretaría de Planeación, debido a que en éstos se tratan temas importantes referentes a los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, que requieren resolverse con el apoyo de los integrantes del Comité.

#### 6. Cierre de la reunión.


EL Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, Secretario de Planeación, da por terminada la sesión, siendo las 3:00 p.m., agradeciendo la participación.

### CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

- Es muy importante dar prioridad a la asistencia por parte de los secretarios de despacho y sus enlaces, a los Comités Técnicos de Regalías programados por la Secretaría de Planeación.
- Se deben cumplir a cabalidad los compromisos adquiridos en cada reunión de los Comités Técnicos realizados, con el fin de dar solución a los inconvenientes presentados y avanzar en cada uno de los procesos pendientes.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Listado de asistencia
2	Presentación en power point


TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Se establece el compromiso de oficiar a la Secretaría de Educación, con el fin de que radiquen ante la oficina Jurídica y			

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 13

<p>de Contratación, los estudios previos para la licitación del proceso de nativos del proyecto identificado con código BPIN 2016000040028 Implementación del programa integral de bilingüismo "Quindío Bilingüe y Competitivo" en el departamento del Quindío.</p>	30 de diciembre de 2021	Secretaría de Planeación	
<p>Se establece el compromiso de oficiar a las diferentes Unidades Ejecutoras de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, informando sobre la Circular conjunta 0033-4 emanada por la Contraloría General de la Republica, la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Nacional de Planeación, sobre la aprobación y gestión de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías.</p>	30 de diciembre de 2021	Secretaría de Planeación	

**FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN**

El próximo Comité Técnico de Regalías se realizará en 15 días (12 de enero de 2022).

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 13

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación	
Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica Secretaría de Planeación	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG
